


作業船によるアオコ攪拌作業①




作業船によるアオコ攪拌作業②



8月20日アオコ対策状況

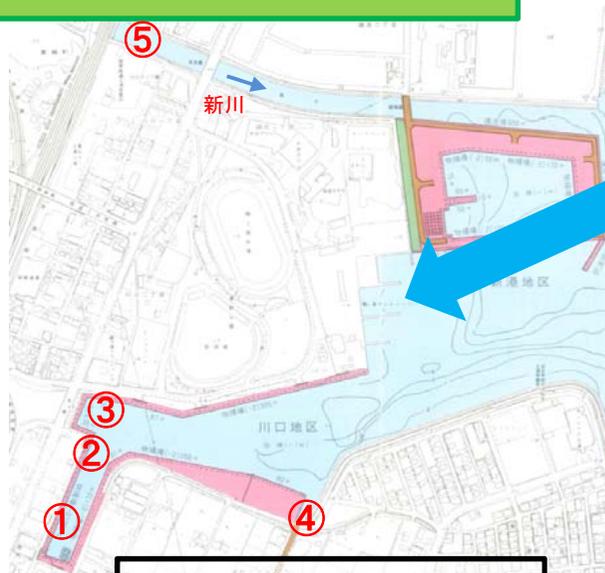

作業船によるアオコ攪拌作業③

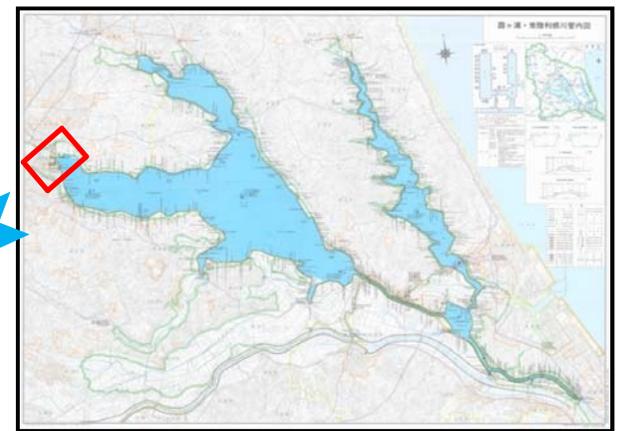

作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4~5強のアオコ発生。新川上流レベル5強
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 各所の角はレベル5強とアオコの厚さもあり、攪拌してもすぐにレベルが上がり、場所によっては、腐敗も始まるぐらいであった。しかし特に第三者等のクレームは無かった。

みずすましアオコ回収状況①



みずすましアオコ回収状況②



8月20日アオコ対策状況



みずすましアオコ脱水状況



水馬脱水アオコ2本



みずすましアオコ脱水状況



みずすまし脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5強のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶2本。水馬、みずすまし回収箇所のレベルは5強と高く、回収作業はしているが、レベルは下がらず、回収箇所も攪拌を行わないと腐敗が始まる。本日も日差しが刺すように強く、アオコの臭いもかなりあり、作業は大変であった。
