


水馬アオコ回収状況①



8月21日アオコ対策状況

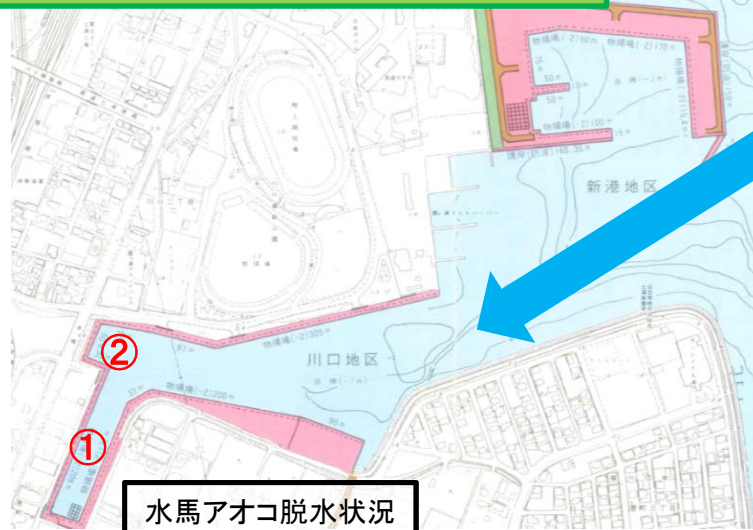

水馬アオコ脱水状況



みずすましアオコ脱水状況

みずすましアオコ回収状況②



水馬脱水アオコ3本

みずすまし脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5強のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶3本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶2本。
夕方まで風が無く、コンビニ前や観光ホテル前の隅にはレベル5強の厚いアオコが堆積しており、回収作業中もレベル5より下ならず悪臭発生。夕方幾分の風が出てきて、港内が波立ちレベル4程度まで下がった。

攪拌前①



8月21日アオコ対策状況

攪拌後①




作業船によるアオコ攪拌作業③

作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②

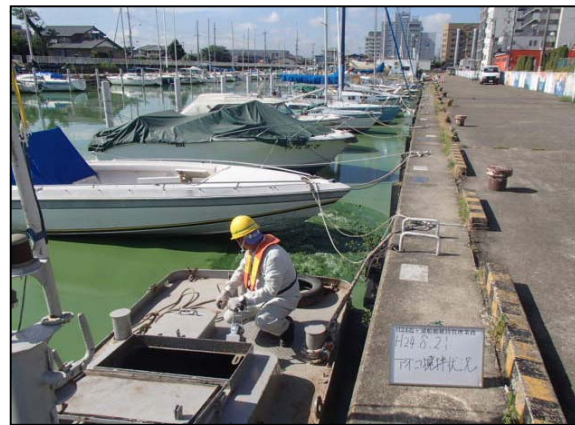

作業船によるアオコ攪拌作業④



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4~5強のアオコ発生。新川上流レベル5強
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 港内各所隅の所はレベル5強で、攪拌後もすぐにレベル5強になるくらい、アオコの堆積厚があり、各所の移動をこまめに行わなければならなかった。新川においては、午前中オイルフェンスを開き、アオコとゴミを下流に流したため、午後から全部オイルフェンスに寄って来て、攪拌作業が困難となった。(スクリュウに巻きつく)
