

川の安全利用点検結果のお知らせ

安全利用点検とは

- ・京浜河川事務所では、日々河川の巡視を行って状態把握に努めているところですが、例年、河川利用が増えるゴールデンウィーク前の時期に安全利用促進という観点で、管内の多摩川・鶴見川・相模川の一斉点検を行っています。今年度も、沿川の市民団体、NPOと合同で行いました。
- ・点検では、より安全に安心して河川を利用することができるように、堤防、河川敷、階段等を中心に危険箇所がないか、注意喚起が必要な箇所がないかの確認を実施しました。
- ・点検の結果、97箇所の要対策箇所を確認し、このうち、緊急的に改善が必要な箇所については応急措置を実施しました。また、許可施設（京浜河川事務所以外の者が管理する施設）で対策箇所を確認した場合は、管理者への連絡を行いました。
- ・河川は自然公物としての危険性を内包しておりますので、河川をご利用されるみなさまにおかれましては、自らの安全確保に十分留意していただきますようお願い致します。

点検実施概要

点検対象河川		点検区間	点検した河川延長 (堤防の左右岸延長)	要対策箇所報告数 <許可施設数>	点検実施日	点検要員数 (延べ)
多摩川	多摩川	河口～小作取水堰下流	約113km	64箇所 <11箇所>	4/12, 15, 16～22	69名
	浅川	多摩川合流点～南浅川合流点	約26km		4/16, 22	
	大栗川	多摩川合流点～新大栗橋	約2km		4/15	
鶴見川	鶴見川	河口～第三京浜鶴見川橋	約30km	27箇所 <1箇所>	4/11, 16～19	33名
	矢上川	鶴見川合流点～渋川合流点	約3km		4/17	
	早淵川	鶴見川合流点～高田橋	約3km		4/19	
	鳥山川	鶴見川合流点～岸根小橋	約3km		4/19	
相模川	相模川	河口～神川橋	約13km	6箇所 <0箇所>	4/15	6名
3水系8河川			約193km	97箇所 <12箇所>	点検日数 延べ15日	108名

川の安全利用点検状況



階段の点検状況(多摩川)



NPO等の参加者と合同での点検(鶴見川)



水際の手すりに異常がないか点検(鶴見川)



堤防に危険な箇所がないか徒歩で点検(多摩川)

点検対象区間（多摩川）

多摩川管内図

1:50,000


多摩川水系河川整備計画の概要

1. 対象河川	2. 対象区間	3. 対象河川	4. 対象区間
多摩川	河口～小作取水堰まで	多摩川	河口～小作取水堰まで
浅川	多摩川合流点～南浅川合流点まで	浅川	多摩川合流点～南浅川合流点まで
大栗川	多摩川合流点～新大栗橋まで	大栗川	多摩川合流点～新大栗橋まで

多摩川 左右岸
点検区間：
河口～小作取水堰まで
点検河川延長： 約113km

浅川 左右岸
点検区間：
多摩川合流点～南浅川合流点まで
点検河川延長： 約26km

大栗川 左右岸
点検区間：
多摩川合流点～新大栗橋まで
点検河川延長： 約2km

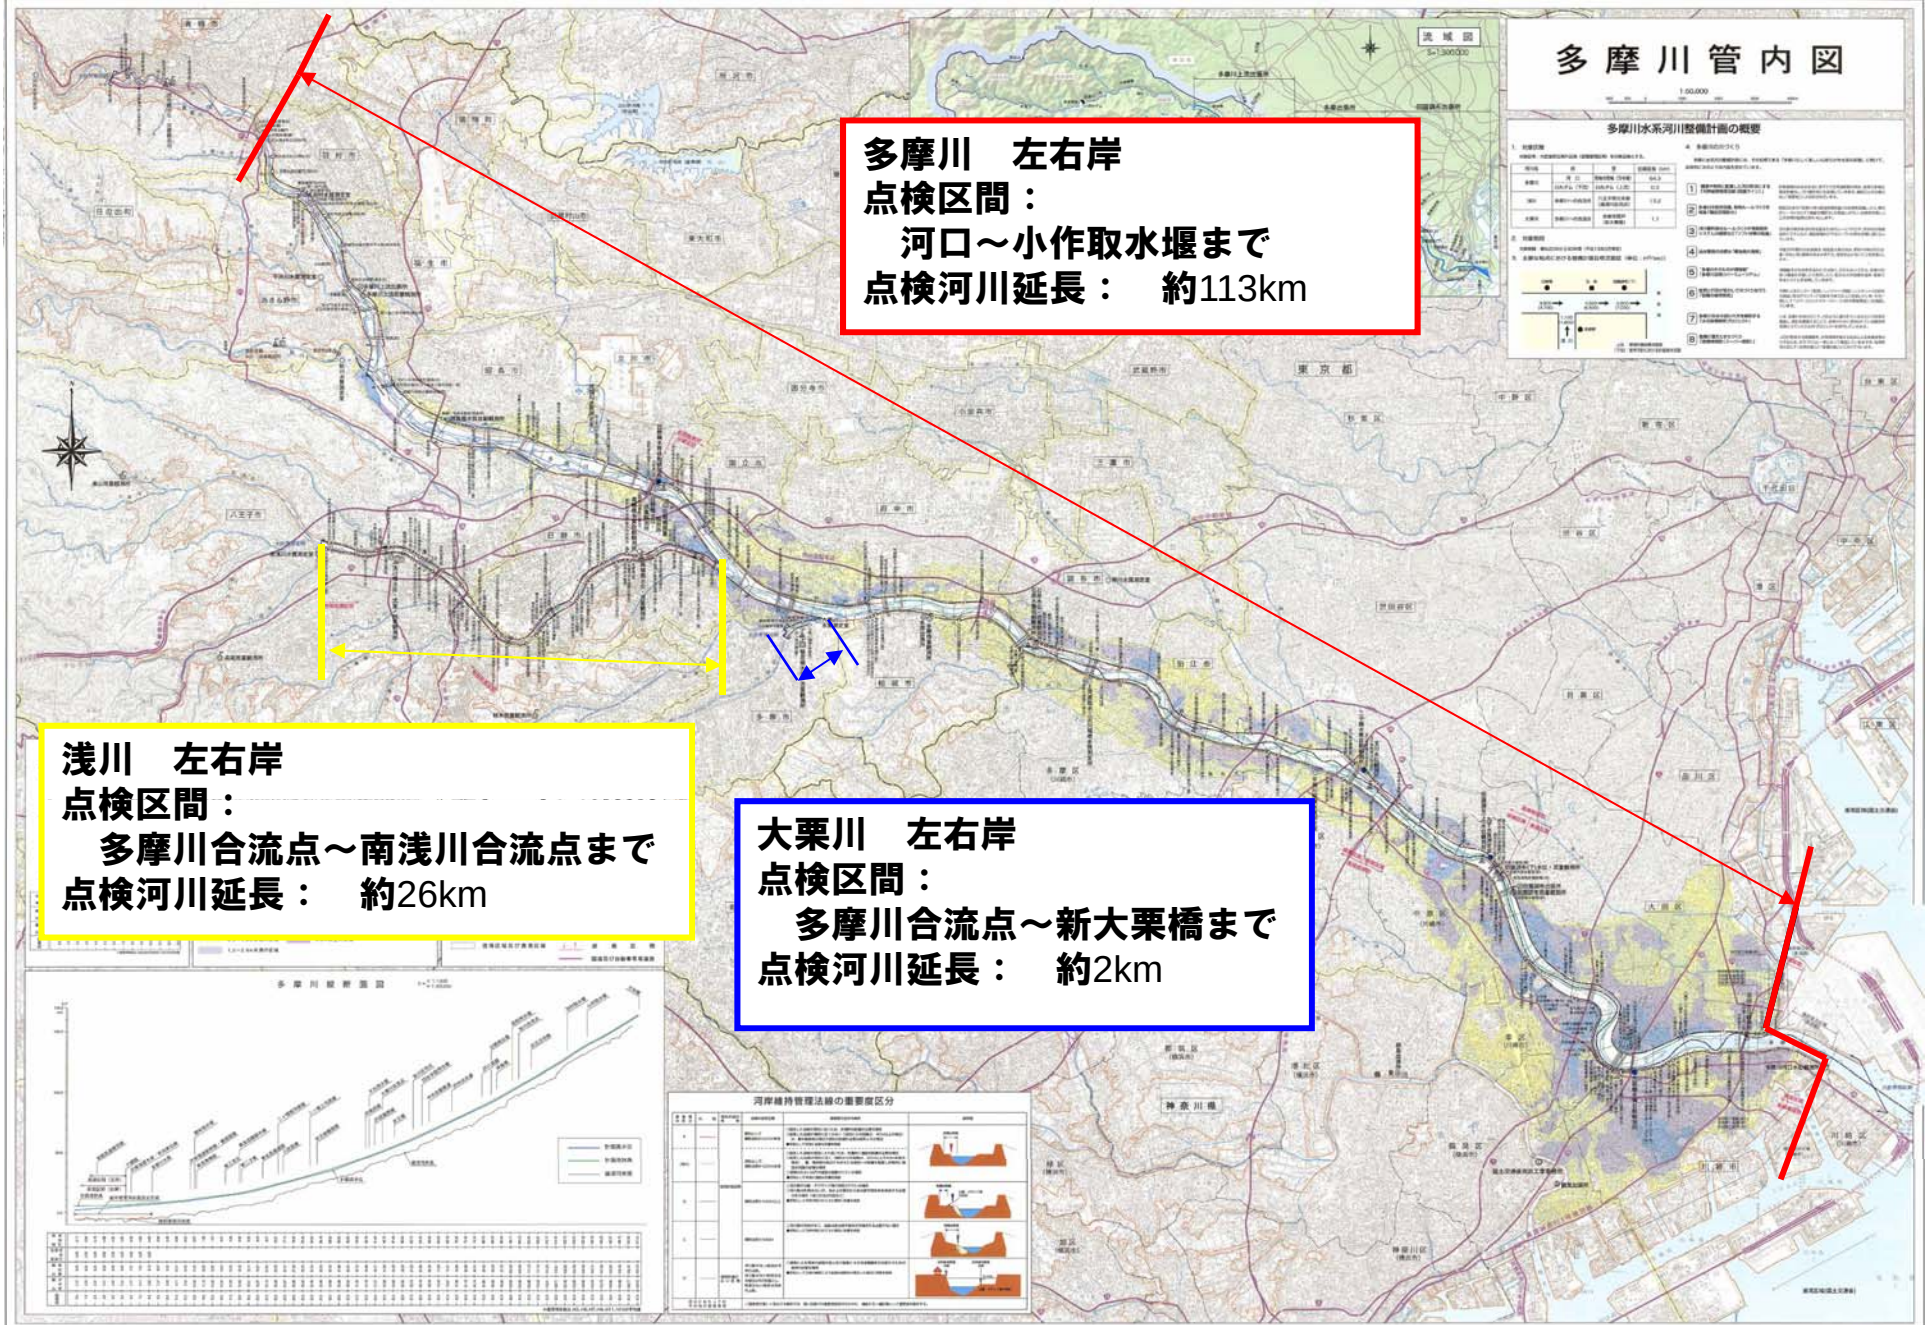

点検結果と補修等の実施例（多摩川）

破損した手摺りの応急対策（多摩川左岸・大田区）



階段の手摺りがゆるんで危険な箇所を発見しました。

対策



応急対策としてテープを巻き、固定しました。

河岸の洗掘による危険箇所の応急対策（浅川左岸・日野市）



河岸が崩れ、危険な箇所を発見しました。

対策



近づく危険なため、周辺にロープを張り立入り防止措置を実施しました。

点検対象区間（鶴見川）

早淵川 左右岸

点検区間：

鶴見川合流点～高田橋まで

点検河川延長： 約3km

矢上川 左右岸

点検区間：

鶴見川合流点～渋川合流点まで

点検河川延長： 約3km

鶴見川 左右岸

点検区間：

河口～第三京浜鶴見川橋まで


点検河川延長： 約31km

鳥山川 左右岸

点検区間：

鶴見川合流点～岸根小橋まで

点検河川延長： 約3km

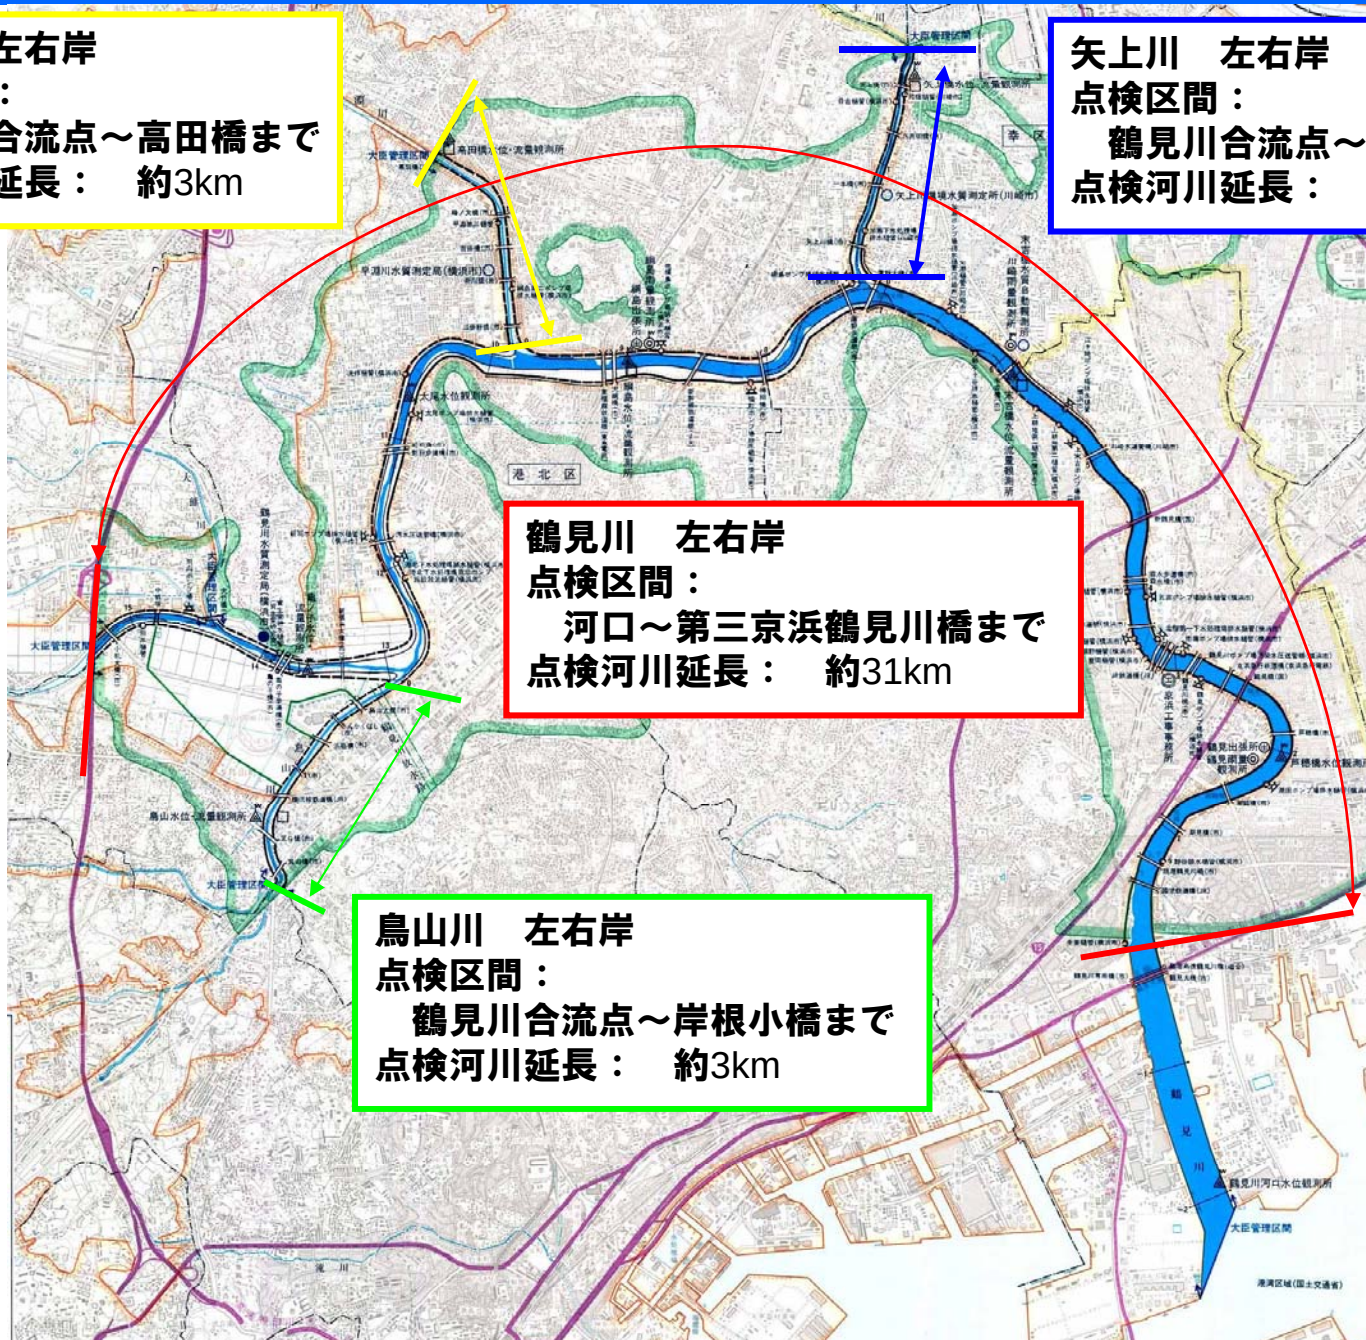

点検結果と補修等の実施例（鶴見川）

側溝の蓋の再設置（鶴見川右岸・横浜市鶴見区）



歩行者や自転車が利用している天旗のアスファルトが欠損している箇所を発見しました。

対策



アスファルトで補修しました。

腐食した転落防止柵の支柱の補修（鶴見川左岸・川崎市幸区）



転落防止柵のロープと支柱固定ねじがゆるんでいるのを発見しました。


対策



支柱を固定し、ゆるみを補修しました。

点検対象区間（相模川）

相模川 左右岸
点検区間：
河口～神川橋まで
点検河川延長：
約13km（左右岸）

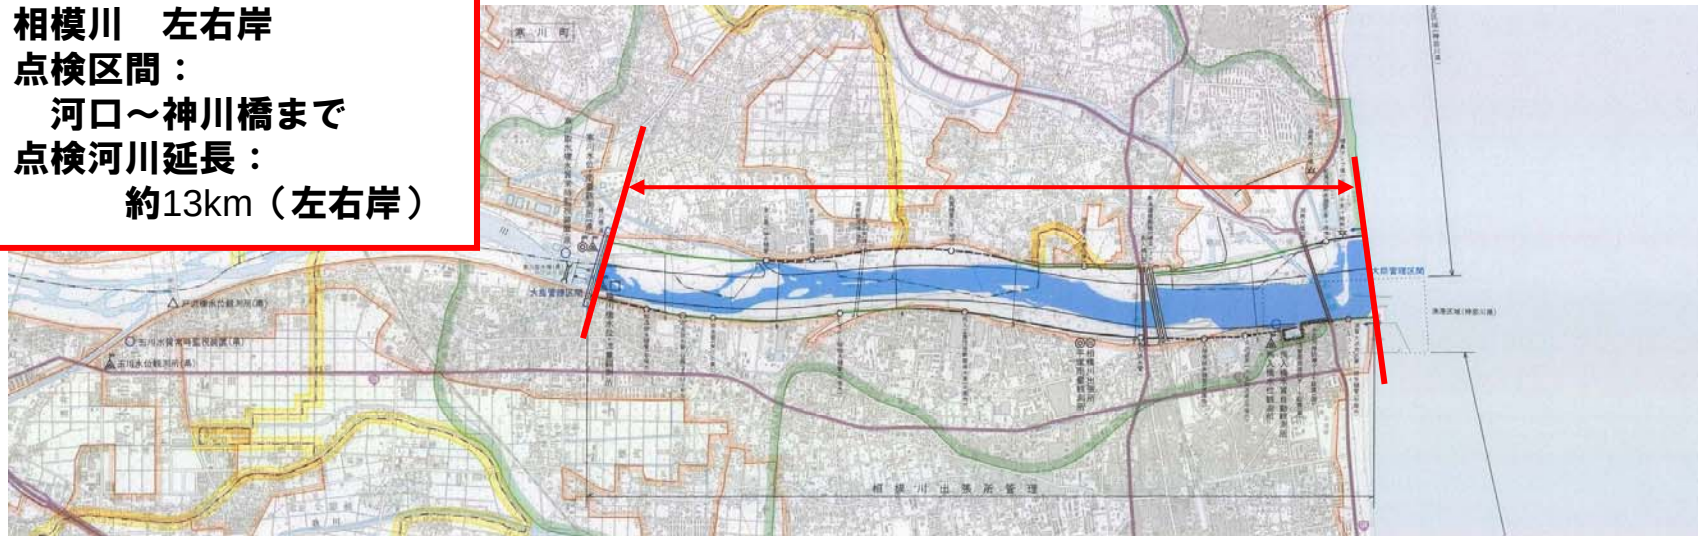

点検結果と補修等の実施例（相模川）

ロープ柵の反射テープの貼り替え（右岸・平塚市）



木製階段が2本無くなって危険な
箇所を発見しました。

対策



無くなっている箇所に木製
階段を設置しました。
