
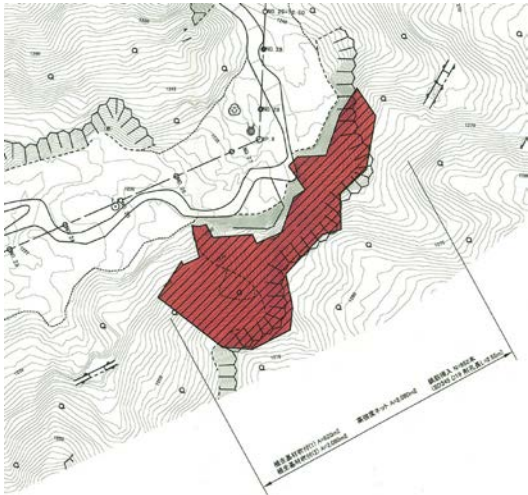
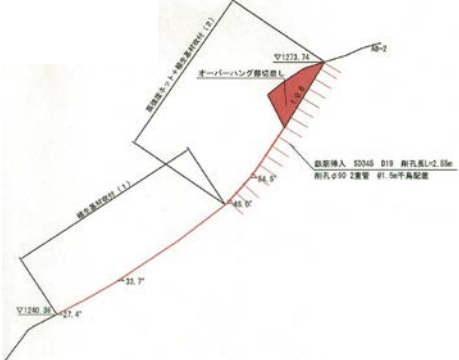


工 事 名	空沢山腹工工事												
工 事 期 間	平成25年5月28日～平成26年1月25日												
請 負 業 者	株式会社吉新組												
工 事 場 所	栃木県日光市日光地先 												
工 事 目 的	本工事は、大谷川左支川稲荷川において土砂の崩壊防止を目的として、発生源対策としての山腹工を施工し、緑化環境を整備するものである。												
工 事 内 容	<table border="0" data-bbox="354 1081 901 1283"> <tr> <td>空沢山腹工工事</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>落石防止網工</td> <td>約2,000m²</td> </tr> <tr> <td>植生工</td> <td>約3,000m²</td> </tr> <tr> <td>アンカー工</td> <td>約1,000本</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>1式</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="371 1310 901 1854" style="text-align: center;"> <p>平面図</p>  </div> <div data-bbox="914 1406 1374 1816" style="text-align: center;"> <p>法面工断面図</p>  </div> </div>	空沢山腹工工事		掘削工	1式	落石防止網工	約2,000m ²	植生工	約3,000m ²	アンカー工	約1,000本	仮設工	1式
空沢山腹工工事													
掘削工	1式												
落石防止網工	約2,000m ²												
植生工	約3,000m ²												
アンカー工	約1,000本												
仮設工	1式												
担 当 出 張 所	日光出張所												



山腹工施工範囲全景（平成25年6月末）

作業状況写真
