


作業前アオコ発生状況①



# 8月14日アオコ対策状況

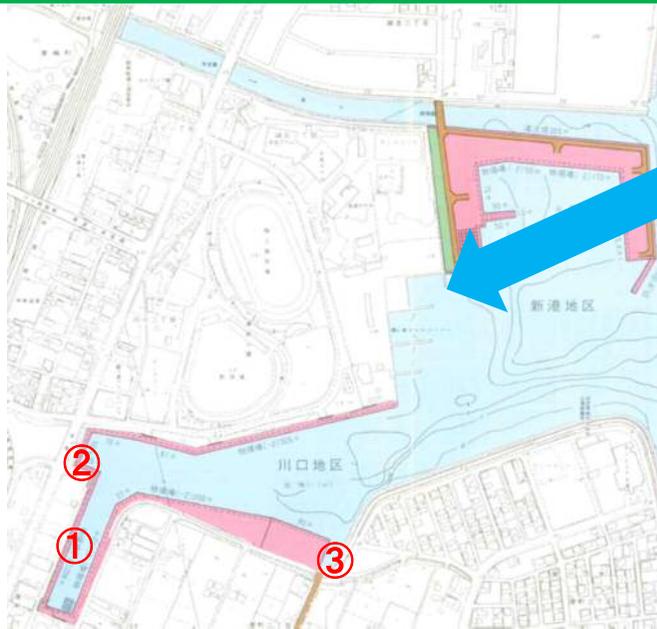

作業前アオコ発生状況③

作業船によるアオコ攪拌作業①



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内はレベル3~5のアオコ発生。③箇所はレベル6一部あり
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: ①箇所は南東の風でアオコが吹き寄せられ、午後からはレベル5強まで上がってきたが、攪拌作業によりレベル3に低下。その他の箇所もレベル5の箇所は攪拌作業により、腐敗を阻止してレベル3に低下した。
