

作業前アオコ発生状況①




8月15日アオコ対策状況



作業前アオコ発生状況③

作業船によるアオコ攪拌作業①

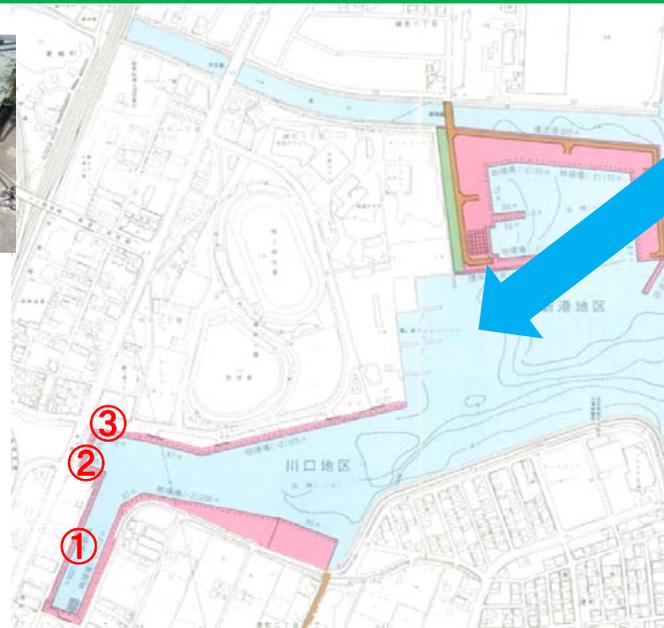

アオコ攪拌作業後①

作業前アオコ発生状況②

作業船によるアオコ攪拌作業②

アオコ攪拌作業後②



作業船によるアオコ攪拌作業③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内はレベル3~6のアオコ発生。①②③の隅はレベル6
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: この数日の猛暑でもアオコの腐敗は前日まで少なかったが、今日は、各箇所範囲は狭いがレベル6の腐敗があり悪臭もあった。攪拌作業により、レベル3~4に低下した。

アオコ攪拌作業後③

