


作業前アオコ発生状況①



8月21日アオコ対策状況

作業船によるアオコ攪拌作業①

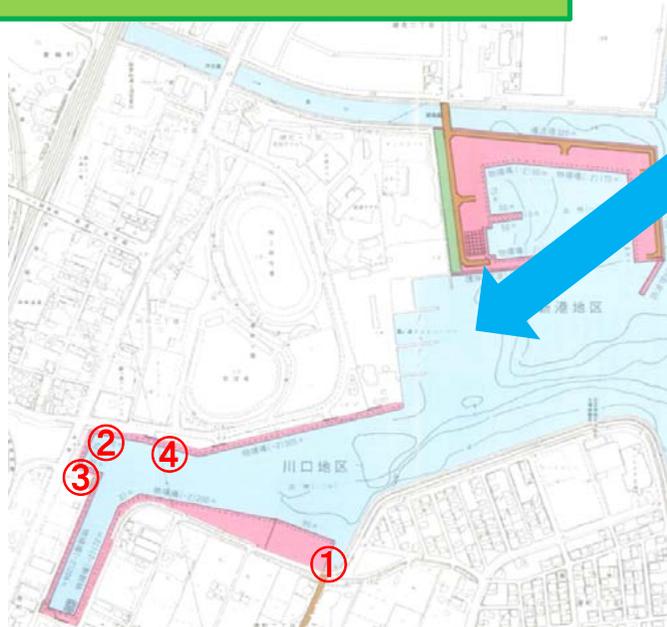

作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



作業船によるアオコ攪拌作業④



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内はレベル2~5のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 今日は全体的に土浦港内のアオコのレベルは低下しているが、場所によってレベル5があり、攪拌作業を行った。東の風で午前中からアオコが吹き寄せられて来ているが、攪拌作業と午後から風が強くなり波立ってきたためレベル2~3で維持していた。
