



水馬アオコ発生状況①



水馬回収機設置状況



8月29日アオコ対策状況

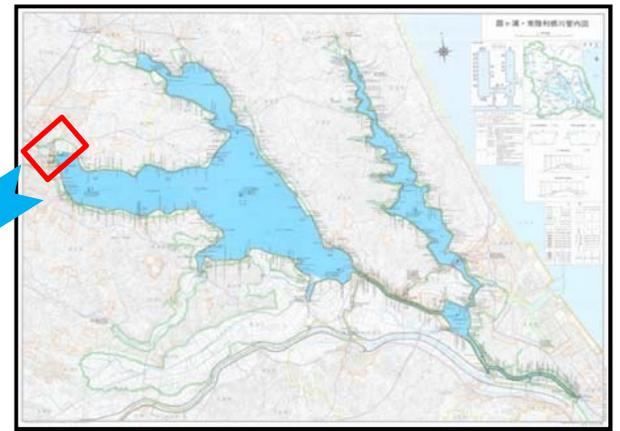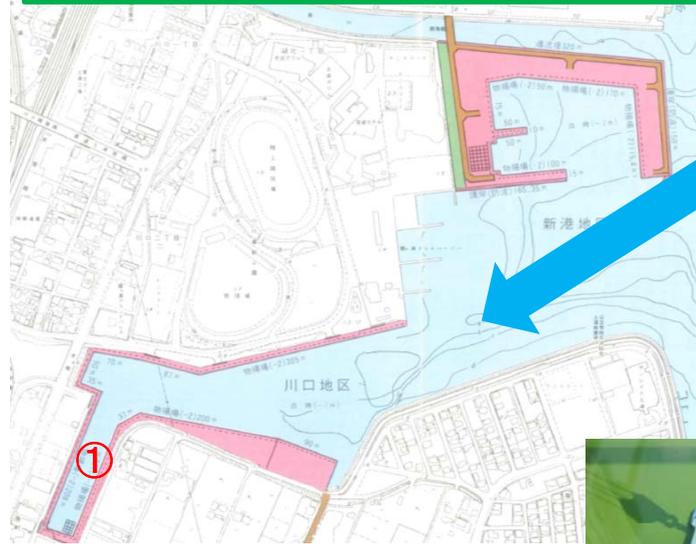

水馬アオコ回収状況①



水馬運転状況①



水馬給油状況①



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~6のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転準備からアオコ回収
4. 対策効果: 水馬周辺はレベル5のアオコが発生していた。気温の上昇とともに、アオコの腐敗が始まり、一部レベル6になるところもあったが、回収作業により、腐敗までには、至らなかった。

8月29日アオコ対策状況

作業前アオコ発生状況①



作業船によるアオコ攪拌作業①



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況③



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業前アオコ発生状況④



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



作業船によるアオコ攪拌作業④



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内、レベル3~6のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: レベル5のアオコがかなり広範囲にわたり発生し、午後から気温の上昇とともにレベル6になり悪臭を発生するところがある。攪拌作業中は、レベル4程度でおさまっているが、風の影響ですぐに、レベル5に上昇
