

○国道 357 号新木場立体工事状況（平成 24 年 7 月 30 日現在）

国道 357 号新木場立体の架橋工事は順調に進んでいます。  
上り方向（山側）、下り方向（海側）の双方において架橋工事が本格化しています。

□ 上り方向（山側）の工事状況

①曙運河～夢の島交差点間

- ・上り方向については、全区間で架橋工事を実施中です。また、首都高速道路湾岸線新木場出入口上部についても 7 月 9 日に架設を終了しました。  
なお、8 月 31 日に、夢の島交差点上部で、通過交通への影響を最低限に抑えるドーリーによる架設を行います。



横送りによる新木場料金所入口の架橋工事



縦送りによる新木場料金所出口の架橋工事




架橋が終了し、足場を仮設中の桁

### 【ドーリーによる架橋】

- ・ 夢の島交差点は多数の通過交通が通行するため、交差点内にベントを設置して架橋を行う事が出来ません。そこで、ベントをドーリー（移動台車）に乗せて、一気に引き出すことにより架橋を行います。架橋作業は8月31日に実施の予定です。



ドーリー（イメージ）

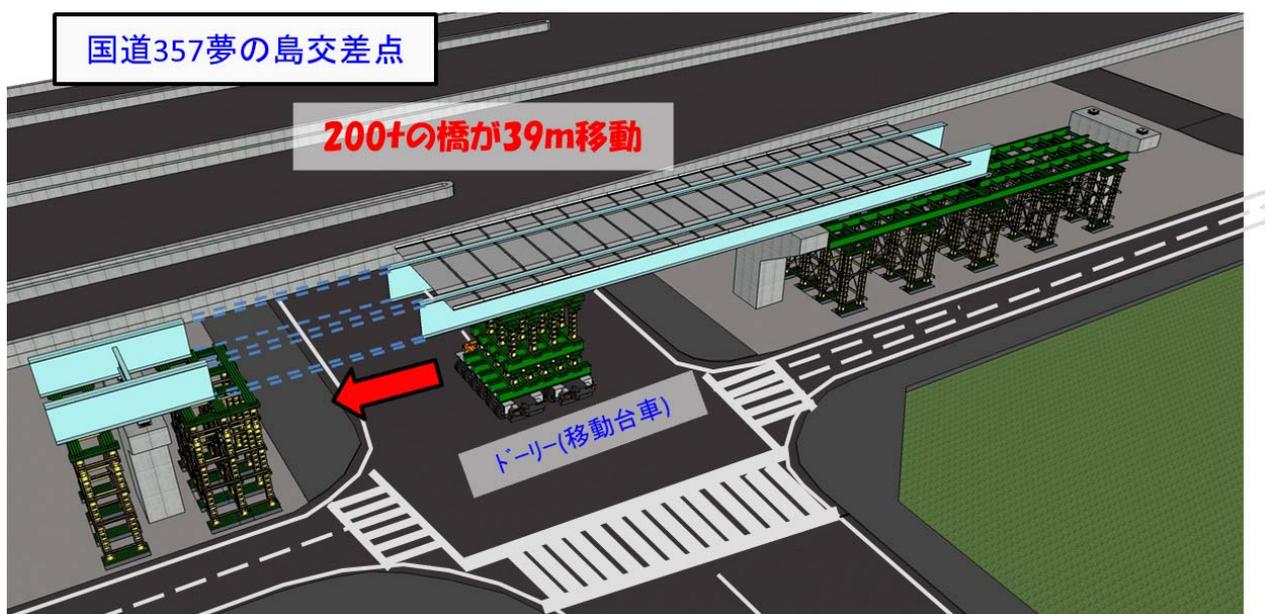

ドーリーによる架橋（イメージ）

## □ 下り方向（海側）の工事状況

### ① 曙運河～夢の島交差点～新木場交差点間

- ・ 上部工をクレーンにより架設中です。7月23日（月）、24（火）、26日（木）に夢の島交差点南北方向を通行止めにして交差点上部の架橋を行いました。



夢の島交差点の通行止め状況



夢の島交差点上の桁架設作業



架設の終了した桁

## □ 架橋工事に伴う交通規制と影響

- ・ 上り側（山側）では 5 月 21 日より、下り側（海側）では、6 月 8 日より日曜を除くほぼ、毎日、国道 357 号夜間一車線規制（21 時～翌朝 6 時、追い越し車線規制）を実施中です。現在までに発生した渋滞は以下のとおりです。
- （1）上り側（山側）
- ・ 6 月 5 日、7 月 9 日、17 日、いずれも新木場交差点～夢の島交差点間約 1 km 程度。発生は 21 時～0 時頃まで。
- （2）下り側（海側）
- ・ 7 月 9 日、13 日、25 日、いずれも夢の島交差点～新木場交差点間約 1 km 程度。発生は 21 時～0 時頃まで。

## □ ドライバーの皆様へのお願い

- ・ 新木場立体工事ではほぼ毎日夜間、車線規制を行っています。国道 357 号夢の島交差点～新木場交差点を走行される際は、道路の規制状況に十分注意し、速度を落として安全に通行下さる様、お願いいたします。
- ・ 車線規制中は渋滞が発生する可能性があります。渋滞内の追突にご注意下さい。
- ・ 今後、架橋工事が本格化していきます。それに伴い、国道 357 号本線の規制の他、夢の島交差点通行止め、首都高速湾岸線新木場出入口の閉鎖などが行われます。規制に関する情報は、このホームページに記載しておりますのでよろしくお願いいたします。
