



発生日時	平成 26 年 5 月 22 日 (木) 5 時 0 分			
工事情報	道路系事務所 一般土木工事			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	—	—	—	大気観測局用の採気管損傷
事故概要	工事の支障となる大気観測局の採気管の付け替え作業を実施しており、塩ビ管を切断したところ、塩ビ管の中に入っていたSPMとNO2の採気管ごと切断してしまったもの。 公衆損害—その他公衆損害			

事故発生状況

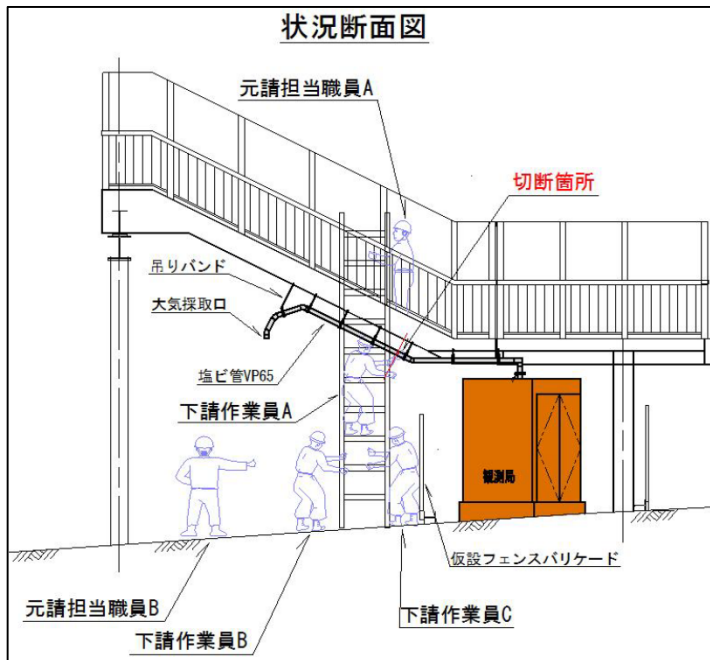

・大気観測局の採気管が、次工程の土留杭を施工するにあたり支障となるため、塩ビ管を切断したところ、管内に設置されていた観測用配管を切断した。

・大気観測局の採気管の移設について、当該施設の役割は認識していたものの、簡易な構造(塩ビ管のみ)と思い込み、短時間作業であれば観測データへの影響がないと考え、監督職員への報告等や関係部署及び大気観測業者との調整を怠ってしまった。

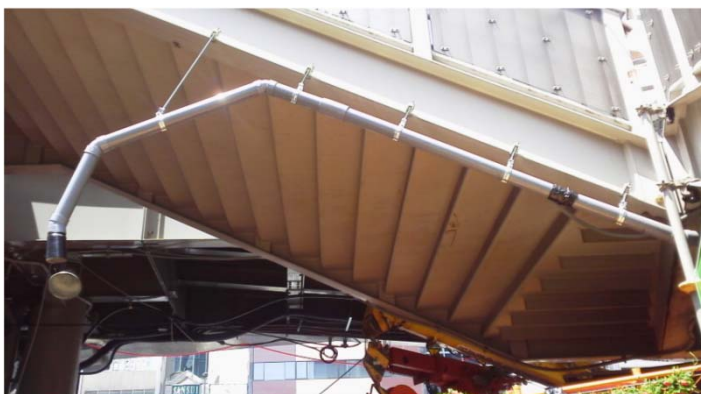

【事故発生原因】

・採気管の事前確認不足
など

【事故防止のポイント】

・作業前に支障物に関する確認をしっかりと行い、疑義がある場合は監督職員や管理者に確認を行う。
など

発生日時	平成 26 年 8 月 18 日 (月) 14 時 0 分			
工事情報	技術事務所 維持修繕工事			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	—	—	—	車両窓ガラス損傷
事故概要	肩掛け式草刈り機で除草作業を行っていた際、飛び石が発生し、付近を走行していた車両のリアガラスを損傷させたもの。			
	公衆損害－その他公衆損害			

事故発生状況



・除草及び清掃確認時、L型街渠及び舗装の中に刈り残しがあったため、空いていたナイロンカッター草刈り機で手直しをしようと作業を行ったところ、飛び石が発生し、付近を走行していた車両の右リアクォータガラスを破損、塗装が1箇所(1~2mm)欠損した。

・作業者の後方より車両がゆっくりと近づいて来たことに気付かず作業を停止できず、また、数分の作業だという認識で、飛び石防護措置を実施していなかった。

【事故発生原因】


・飛び石防護措置を実施せずに作業を行った。
など

【事故防止のポイント】


・除草作業を行う際は、飛び石防護措置(ネットなど)を必ず実施する。
など

発生日時	平成 26 年 9 月 5 日 (金) 14 時 10 分			
工事情報	河川系事務所 維持修繕工事			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	—	—	—	キロ杭損傷
事故概要	堤防上において、雑草の繁茂が激しかったため、抜根する前にハンドガイドで高刈りを行ったところ、既存のキロ杭に気づかず、損傷させたもの。			
	公衆損害－その他公衆損害			

事故発生状況

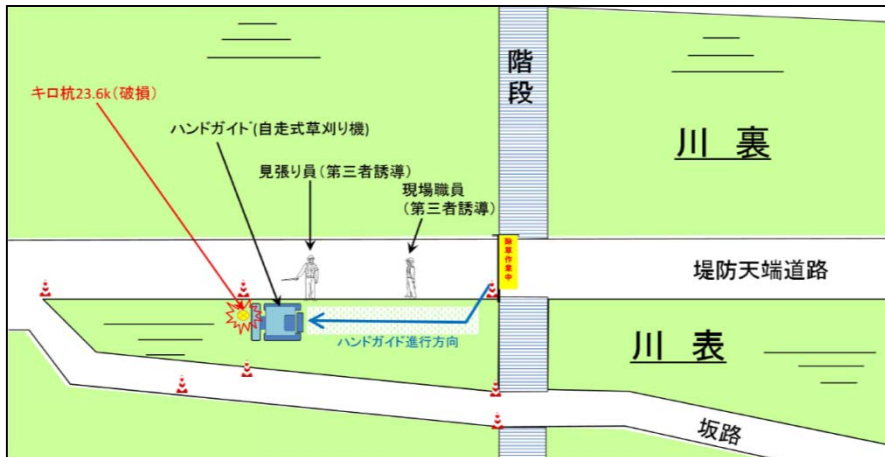

・堤防上において、雑草の繁茂が激しかったため、抜根する前にハンドガイドで高刈りを行ったところ、既存のキロ杭に気づかず、損傷させた。

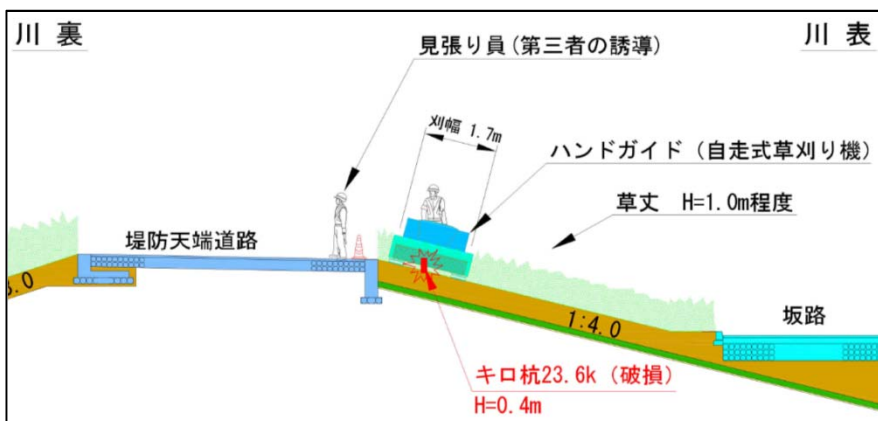

【事故発生原因】


- ・既存物に対する注意不足など

【事故防止のポイント】

- ・作業前に現地を確認し、必要に応じて、既存物周りの先行刈り、目印表示などを行うなど

発生日時	平成 26 年 11 月 15 日 (土) 13 時 30 分			
工事情報	河川系事務所 建築工事			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	—	—	—	排水機場構内の枯草(約80m2)焼却
事故概要	排水機場の空調室外機の移設復旧作業中、配線用の電線管を高速カッターを使用して切断したところ、高速カッターから出たと思われる火花が枯草に燃え移ったもの。			
	公衆損害－その他公衆損害			

事故発生状況

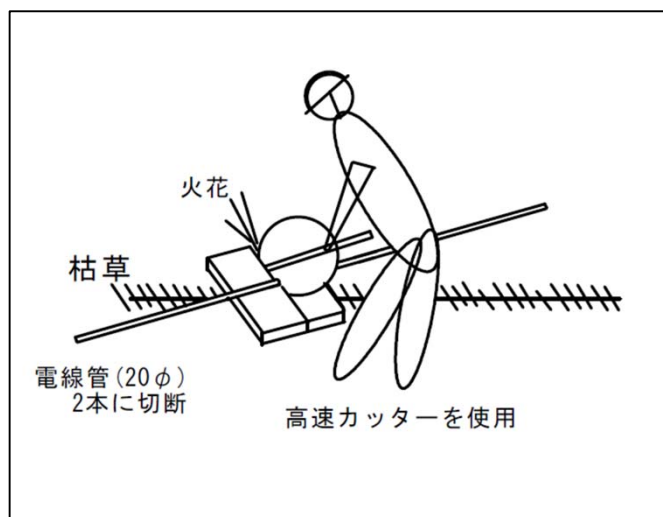

・空調室外機の移設復旧作業をしていた電工が、配線用の電線管を切断するために、高速カッターを使用して配管の切断を行った。

・電工は、そのまま切断した配管を持って移動したが、他の職員が枯草に火が付いているのを発見し、消火を行った。

・高速カッターの火花が、枯草に燃え移ったものとみられる。



【事故発生原因】


・燃えやすい箇所において、火花の散る作業を行った
など

【事故防止のポイント】

・現地状況をよく確認し、現地にあった作業手順等を周知徹底する
など

発生日時	平成 27 年 2 月 8 日 (日)			
工事情報	技術事務所 建築工事			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	—	—	—	
事故概要	宿舎屋上の既設防水層の剥離作業を実施したが、降雨により宿舎内に漏水が発生したもの。			
	公衆損害—その他公衆損害			

事故発生状況

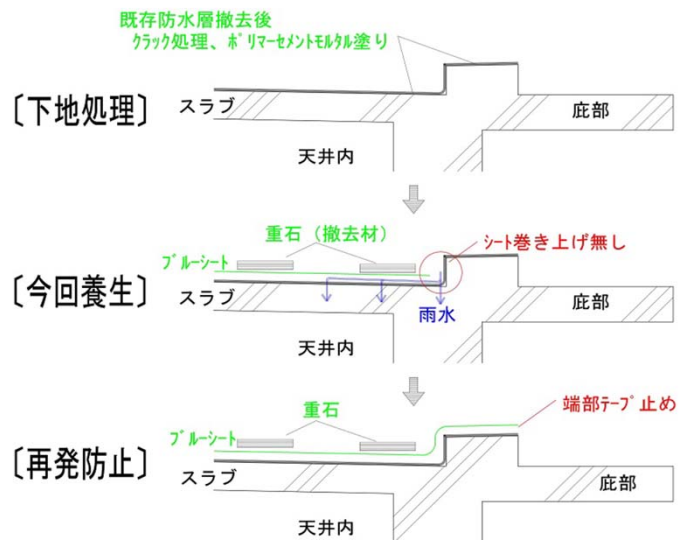

・既存防水撤去及び下地処理完了後、ブルーシート養生を行い作業終了したが、その後の降雨により、住居部分に漏水が発生した。

・ブルーシート養生が不十分であったと考えられる。

【事故発生原因】

・降雨に配慮した詳細な作業手順の周知徹底不足
など

【事故防止のポイント】

・降雨による漏水を生じないように作業手順等をよく検討し、周知徹底する
など
