

平成27年9月16日(水)
国土交通省 関東地方整備局
河 川 部
下 館 河 川 事 務 所

関東地方整備局 風水害対策本部は非常体制中です。

記者発表資料

鬼怒川左岸 21k 付近の堤防決壊箇所が 元の高さでつながりました【第2報】

平成27年9月16日 5時 完了

利根川水系 鬼怒川 左岸 21k 付近で実施していた応急復旧工事については、11日より着手していた荒締切工のうち、盛土部分が完了し、決壊箇所が9月16日5時につながりました。

引き続き護岸工を行うとともに、前面に鋼矢板による締切工で補強をします。

現地の状況について提供します。

- ・ 応急復旧工事の進捗状況について (9月16日7時現在)
- ・ 応急復旧工事実施状況 (9月16日5時頃) の写真

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、筑西市記者クラブ、宇都宮市政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局

河川部 河川調査官 高橋 伸輔

TEL 048-600-1419(災害対策室直通)

応急復旧工事の進捗状況について

平成27年9月16日 7時現在

● 9月16日5時荒締切工のうち盛土部分が完了。引き続き、24時間体制で護岸工及び締切工を施工予定。


● 進捗率（9月16日 4時現在）

退避場・作業ヤード造成 完了（9月10日着手～9月11日完了）

荒締切工 66.7%（9月11日着手）
※着手より荒締切工までを1週間程度で完了予定

鋼矢板による締切工 0.0%（未着手）
※荒締切工完了より1週間程度で完了予定

概略図

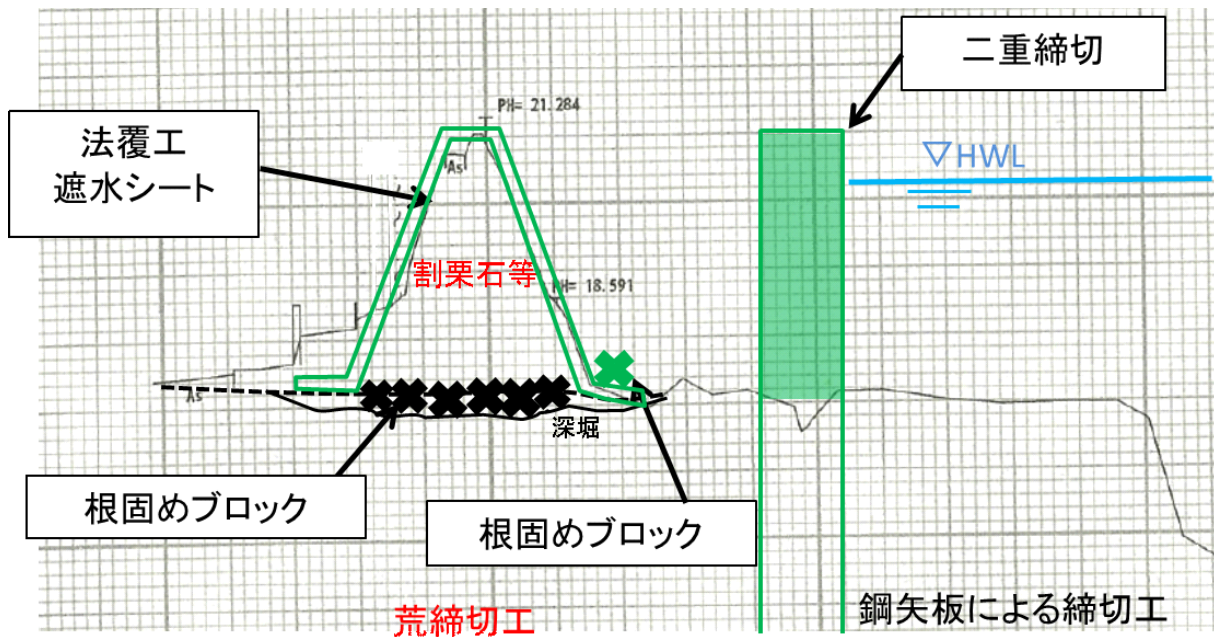

応急復旧工事実施状況（9月16日 5時頃）

鬼怒川



荒締切の盛土部完了（川裏側より下流から上流をのぞむ）
