


カスリーン台風を契機に沼尾川・天竜川に整備した砂防施設

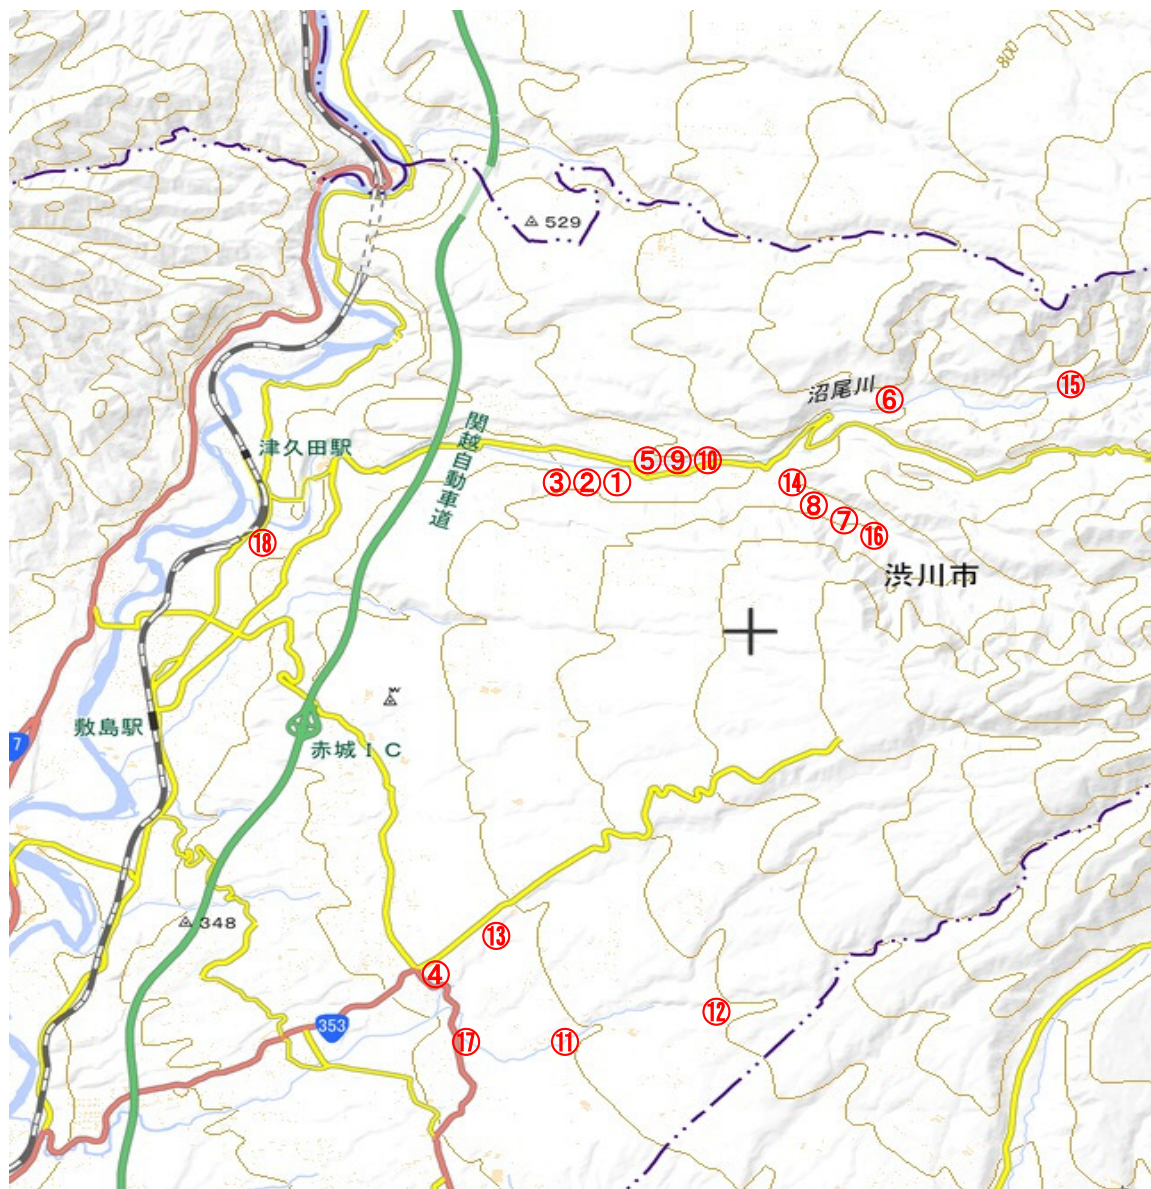

No.	砂 防 施 設 名
1	深山第一砂防堰堤
2	深山第二砂防堰堤
3	深山床固群（流路工）
4	溝呂木砂防堰堤
5	深山下流砂防堰堤
6	深山中流砂防堰堤
7	前入沢第二砂防堰堤
8	前入沢第一砂防堰堤
9	深山砂防堰堤
10	前入沢床固群（流路工）
11	沖門砂防堰堤
12	田之郷砂防堰堤
13	天竜川砂防堰堤
14	前入沢第三砂防堰堤
15	潜下砂防堰堤
16	前沢第四砂防堰堤
17	溝呂木床固群
18	沼尾川下流床固群

1 深山第一砂防堰堤（引継済）

諸元					
施工個所	群馬県勢多郡赤城村大字深山地先	流域面積	29.5 km ²		
流域名	利根川左支沼尾川筋	計画高水流量	295.0 m ³ /sec		
工事期間	不明～S24. 7. 31	堰堤規模	高さ (m)	6.0	
工事費	6,942,000円		長さ (m)	66.0	
施工者	直営施工		立積 (m ³)	2,180	
			計画貯砂量 (m ³)	6,000	
			天端標高 (m)	10,000.0	



2 深山第二砂防堰堤（引継済）

諸元					
施工個所	群馬県勢多郡赤城村大字深山地先	流域面積	29.5 km ²		
流域名	利根川左支沼尾川筋	計画高水流量	295.0 m ³ /sec		
工事期間	不明～S25. 6. 30	堰堤規模	高さ (m)	4.0	
	S34. 12. 16～S35. 2. 15 (補修)		長さ (m)	65.0	
工事費	4,675,203.23円		立積 (m ³)	1,113	
施工者	直営施工		計画貯砂量 (m ³)	3,000	
			天端標高 (m)	4,000.0	




3 深山流路工（引継済）

諸元				
施工個所	群馬県勢多郡赤城村大字深山地先	流域面積	32.0 km ²	
流域名	利根川左支沼尾川筋	計画高水流量	450.0 m ³ /sec	
工事期間	S23～S34. 3. 31	堰堤規模	計画貯砂量 (m ³)	75,000.0
工事費	54,615,586.802円		流路延長 (m)	1,042
施工者	直営施工			



4 溝呂木砂防堰堤（引継済）

諸元					
施工個所	群馬県勢多郡赤城村大字溝呂木地先	流域面積	5.3 km ²		
流域名	利根川左支天竜川筋	計画高水流量	69.0 m ³ /sec		
工事期間	S23. 11. 16～S24. 4. 10	堰堤規模	高さ(m)	7.0	
工事費	1,104,984.63円		長さ(m)	48.5	
施工者	県営施工、岡本土木(株)		立積(m ³)	750	
			計画貯砂量(m ³)	2,150	
			天端標高(m)	547.5	

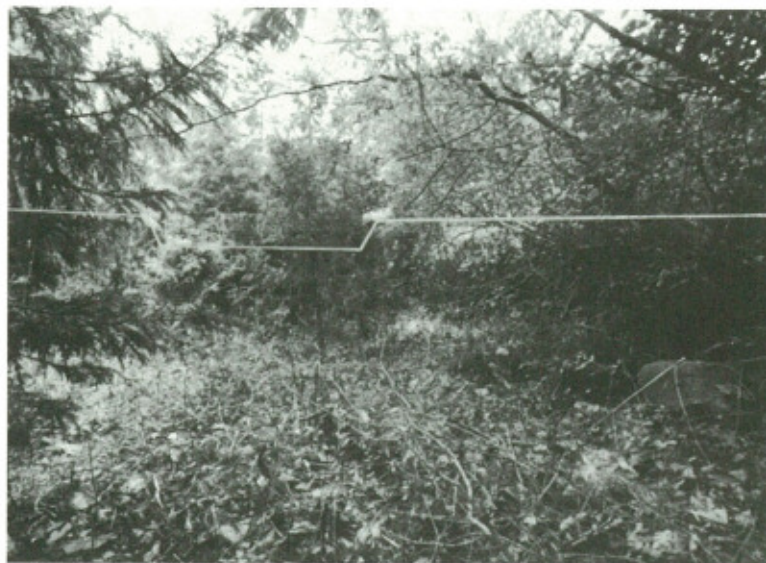


5 深山下流砂防堰堤（引継済）

諸元			
施工個所	群馬県勢多郡赤城村大字深山地先	流域面積	29.5 km ²
流域名	利根川左支沼尾川筋	計画高水流量	295.0 m ³ /sec
工事期間	S24. 6～S25. 4. 15	堰堤規模	高さ(m) 6.0
工事費	11,425,417.496円		長さ(m) 130.0
施工者	直営施工		立積(m ³) 3,072
			計画貯砂量(m ³) 6,000
			天端標高(m) 8,000.0





6 深山中流砂防堰堤（引継済）

諸元			
施工個所	群馬県勢多郡赤城村大字深山地先	流域面積	16.1 km ²
流域名	利根川左支沼尾川筋	計画高水流量	155.0 m ³ /sec
工事期間	S25. 8. 16～S26. 6. 15	堰堤規模	高さ(m) 19.0
工事費	54,513,225.136円		長さ(m) 131.0
施工者	直営施工、北部土建工業(株)		立積(m ³) 15,265
			計画貯砂量(m ³) 562,500
			天端標高(m) 433.0

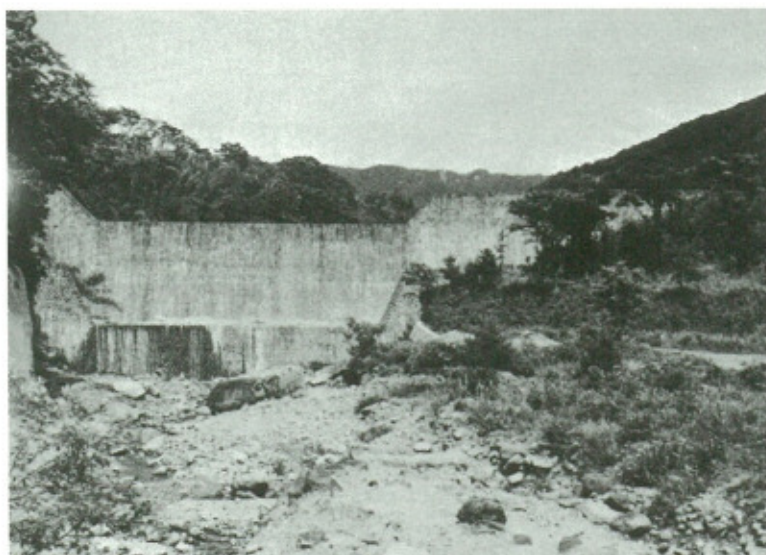


7 前入沢第二砂防堰堤（引継済）

諸元				
施工個所	群馬県勢多郡赤城村大字深山地先	流域面積	7.2 km ²	
流域名	沼尾川左支前入沢筋	計画高水流量	180.0 m ³ /sec	
工事期間	S26.10.16～S28.3.20	堰堤規模	高さ(m)	13.0
工事費	32,984,516.79円		長さ(m)	89.0
施工者	北部土建工業(株)		立積(m ³)	7,444
			計画貯砂量(m ³)	10,000
			天端標高(m)	4,000.0

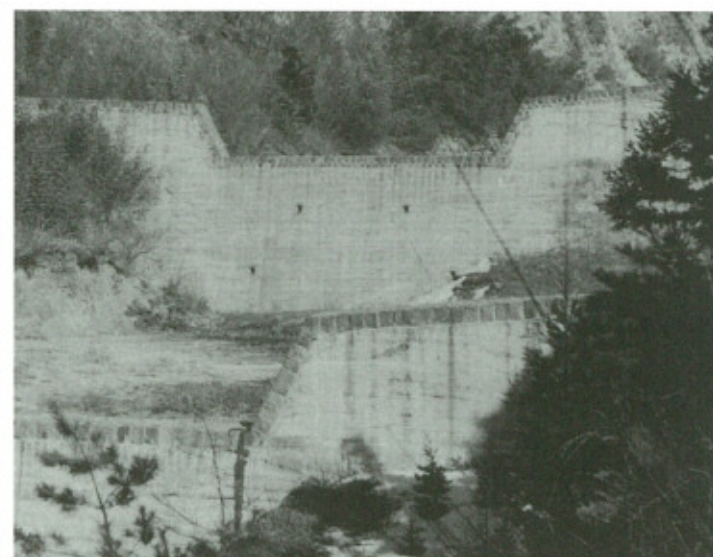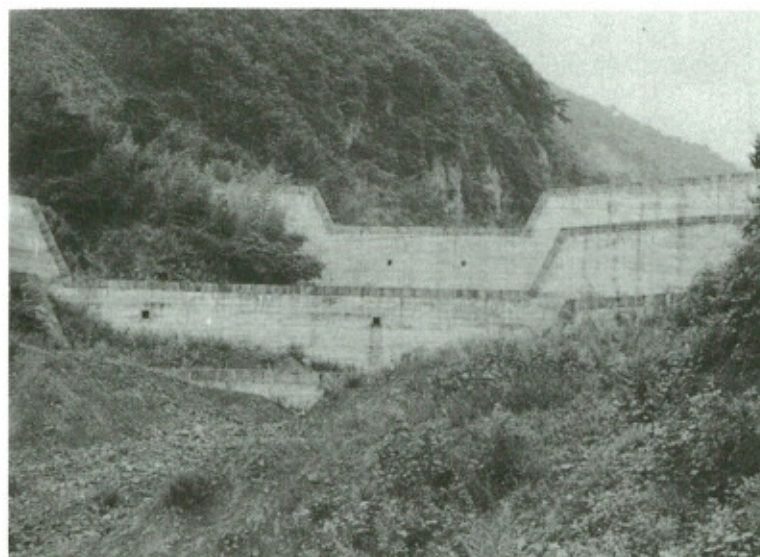

8 前入沢第一砂防堰堤（引継済）

諸元				
施工個所	群馬県勢多郡赤城村大字深山地先	流域面積	7.2 km ²	
流域名	沼尾川左支前入沢筋	計画高水流量	180.0 m ³ /sec	
工事期間	S26.7.1～S27.5.28	堰堤規模	高さ(m)	12.0
工事費	14,765,686.276円		長さ(m)	62.0
施工者	直営施工、北部土建工業(株)		立積(m ³)	3,519
			計画貯砂量(m ³)	80,000
			天端標高(m)	35,000.0

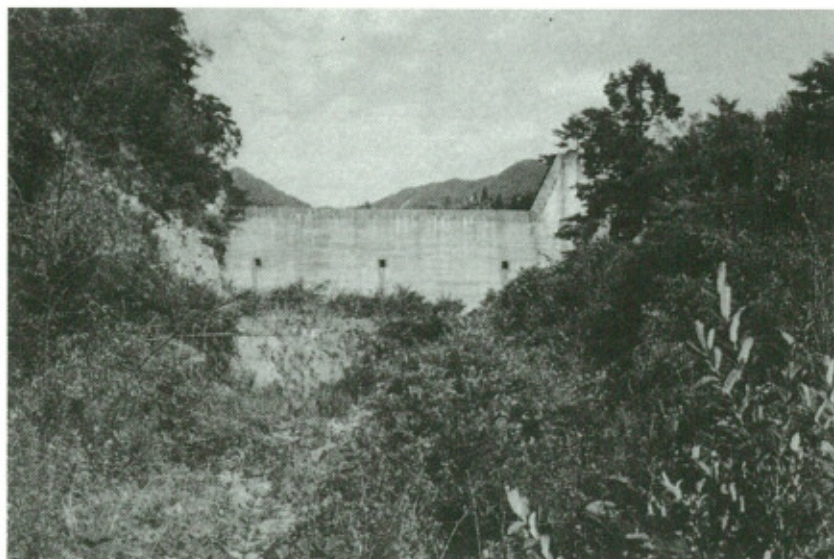

9 深山砂防堰堤（引継済）

諸元				
施工個所	群馬県勢多郡赤城村大字深山地先	流域面積	29.5 km ²	
流域名	利根川左支沼尾川筋	計画高水流量	295.0 m ³ /sec	
工事期間	S25. 1. 4～S28. 2. 15	堰堤規模	高さ(m)	11.0
工事費	35,523,484.43円		長さ(m)	146.0
施工者	直営施工、北部土建(株)		立積(m ³)	6,288
			計画貯砂量(m ³)	100,000
			天端標高(m)	48,000.0




10 前入沢流路工（引継済）

諸元				
施工箇所	群馬県勢多郡赤城村大字深山地先	流域面積	7.2 km ²	
流域名	沼尾川左支前入沢筋	計画高水流量	180.0 m ³ /sec	
工事期間	S27. 6. 1～S30. 8. 31	堰堤規模	立積 (m ³)	6,637
工事費	33,105,108.175円		計画貯砂量 (m ³)	37,000.0
施工者	北部土建工業(株)		流路延長 (m)	368.0



11 沖門砂防堰堤（引継済）

諸元				
施工個所	群馬県勢多郡赤城村大字持柏木地先	流域面積	4.2 km ²	
流域名	天竜川左支田之郷川筋	計画高水流量	123.0 m ³ /sec	
工事期間	S27. 6. 1～S29. 3. 31	堰堤規模	高さ(m)	10.0
工事費	6,602,082.40円		長さ(m)	38.0
施工者	岡本土木(株)		立積(m ³)	1,330
			計画貯砂量(m ³)	25,000
			天端標高(m)	15,000.0

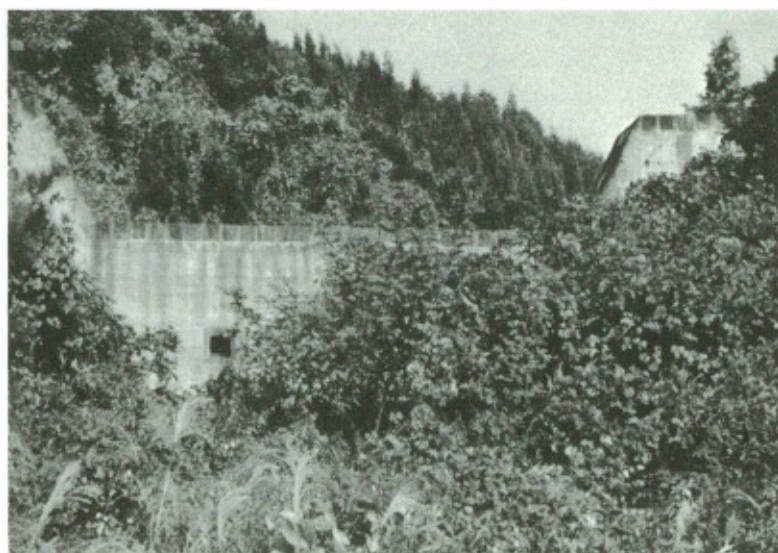


12 田之郷砂防堰堤（引継済）

諸元			
施工箇所	群馬県勢多郡赤城村大字赤城山地先	流域面積	3.6 km ²
流域名	天竜川左支田之郷川筋	計画高水流量	108.0 m ³ /sec
工事期間	S29. 8. 16～S30. 3. 31	堰堤規模	高さ(m) 6.0
工事費	6,471,128円		長さ(m) 48.0
施工者	岡本土木(株)		立積(m ³) 1,140
			計画貯砂量(m ³) 5,000
			天端標高(m) 8,000.0




13 天竜川砂防堰堤（引継済）

諸元			
施工個所	群馬県勢多郡赤城村大字溝呂木地先	流域面積	5.0 km ²
流域名	利根川左支天竜川筋	計画高水流量	125.0 m ³ /sec
工事期間	S30. 8. 16～S31. 3. 31	堰堤規模	高さ(m) 10.0
工事費	7,123,879.15円		長さ(m) 87.0
施工者	岡本土木(株)		立積(m ³) 1,379
			計画貯砂量(m ³) 15,000
			天端標高(m) 9,000.0

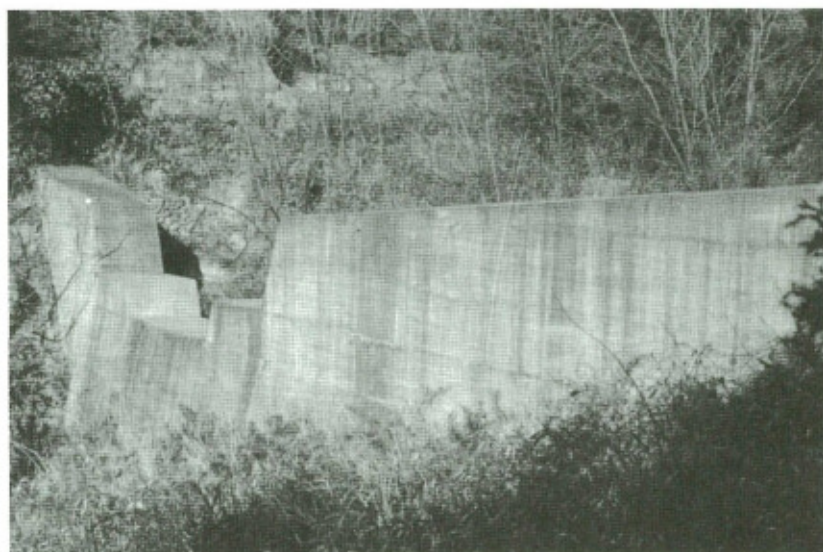

14 前入沢第三砂防堰堤（引継済）

諸元			
施工個所	群馬県勢多郡赤城村大字深山地先	流域面積	6.4 km ²
流域名	沼尾川左支前入沢筋	計画高水流量	195.0 m ³ /sec
工事期間	S30.9.1～S31.3.31	堰堤規模	高さ(m) 12.0
工事費	12,880,242.64円		長さ(m) 70.0
施工者	北部土建工業(株)		立積(m ³) 2,244
			計画貯砂量(m ³) 50,000
			天端標高(m) 19,000.0

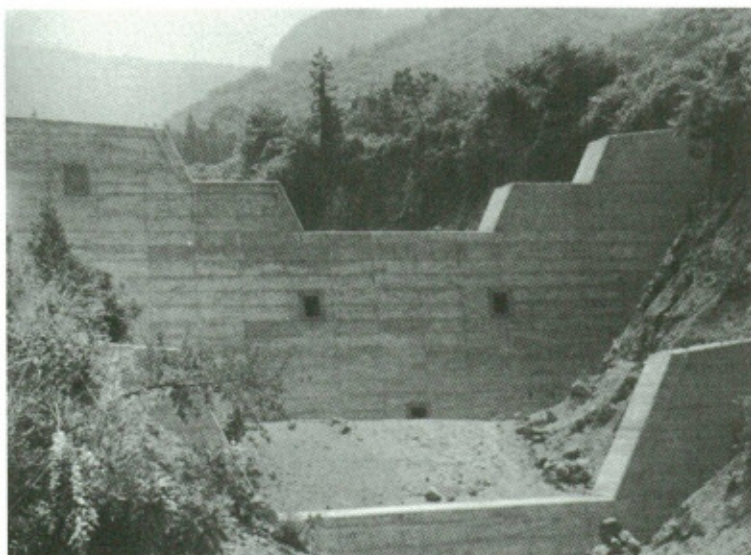

15 潜下砂防堰堤（引継済）

諸元				
施工箇所	群馬県勢多郡赤城村大字赤城山地先	流域面積	13.0 km ²	
流域名	利根川左支沼尾川筋	計画高水流量	130.0 m ³ /sec	
工事期間	S30. 4. 1～S33. 3. 31	堰堤規模	高さ (m)	21.0
工事費	37,395,527.613円		長さ (m)	89.0
施工者	直営施工		立積 (m ³)	6,430
			計画貯砂量 (m ³)	800,000
			天端標高 (m)	689.0

