


工事期間中の工事車両運行経路

【全体図】

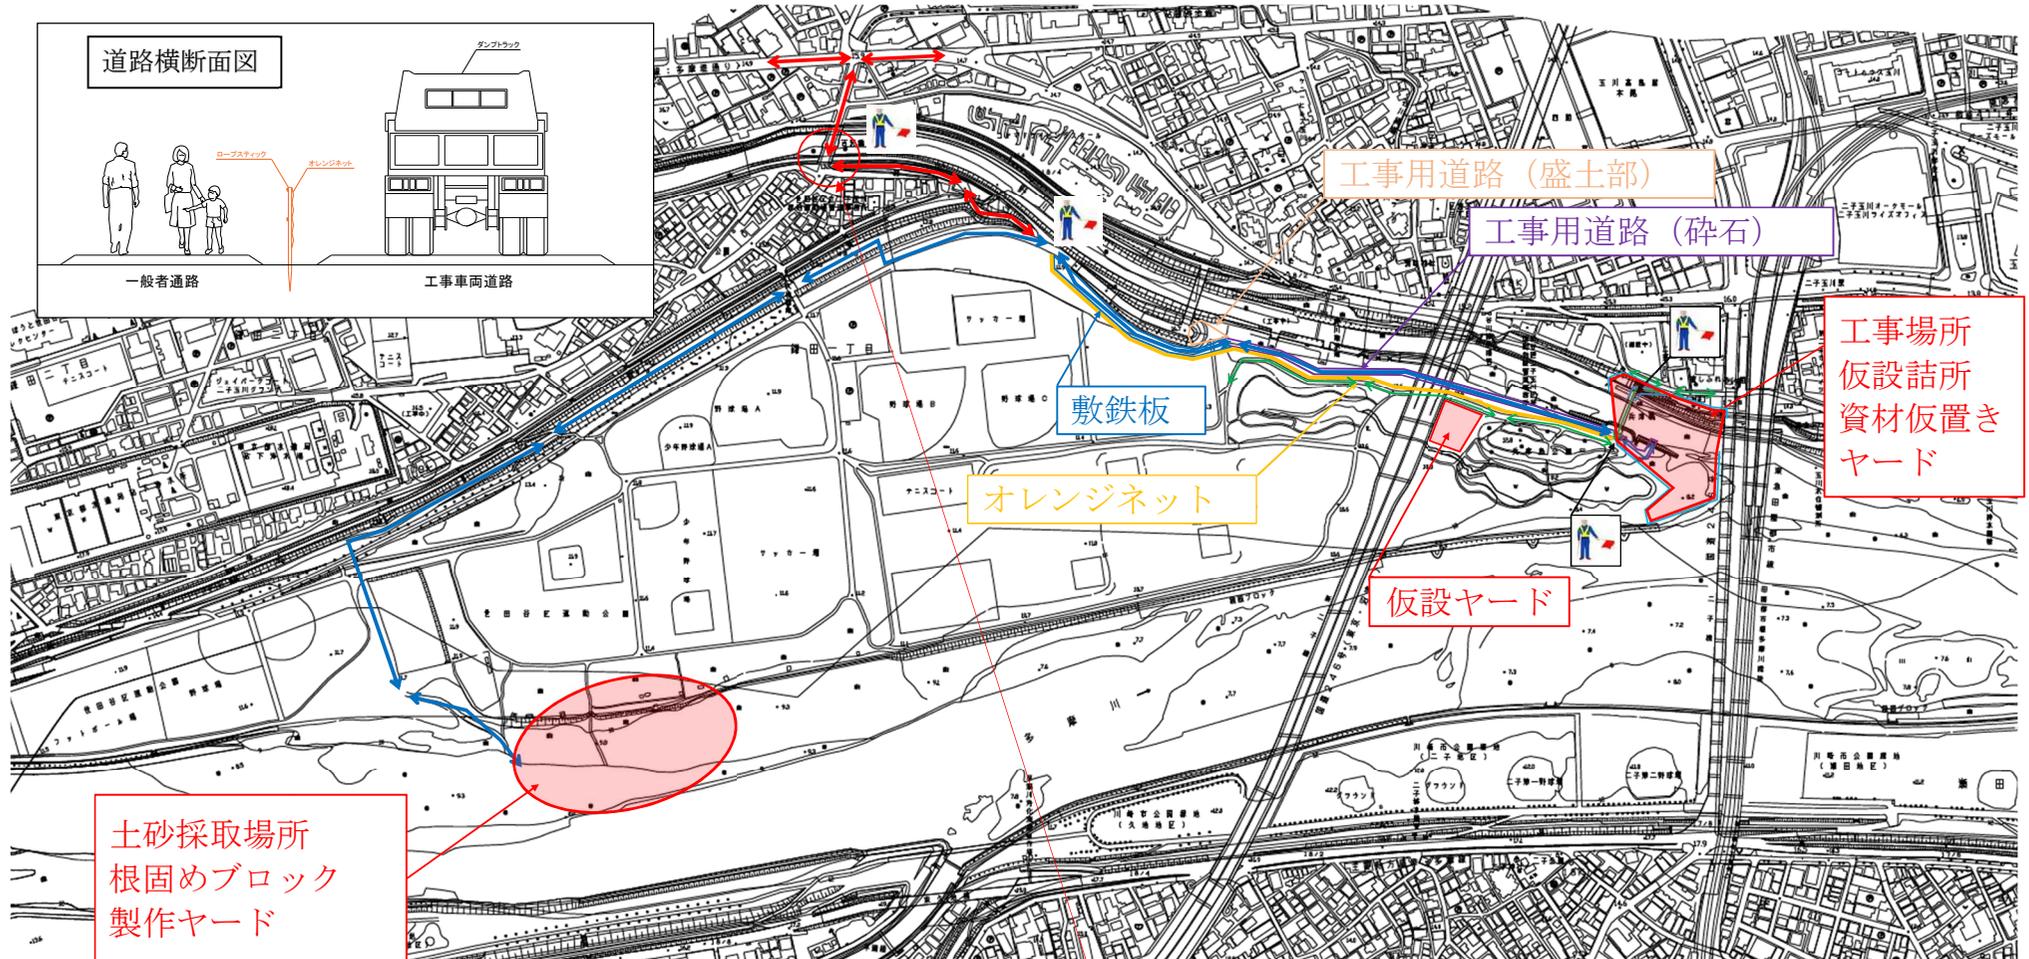

凡例

- ↔ 工事車両進入経路
- ↔ 土砂運搬経路 (ダンプトラック通行)
- ↔ 一般者通路
- オレンジネット (H=1.0m)
- ガードフェンス (H=1.8m)
- 🚧 交通誘導員

安全・環境対策

- ・一般者が工事中の危険な箇所に接近しないように、工事範囲にガードフェンス及びオレンジネットによる仮囲いを設置します。
- ・工事車両出入口には交通誘導員を配置し、一般者の安全を優先した誘導を行います。
- ・工事車両が河川敷内工事用道路を通行する際は、最徐行（時速20km以下）で走行します。
- ・川裏側のガードフェンスには防音シートを設置するとともに、建設機械は低騒音対策型建設機械を使用し、騒音・振動の発生を防止します。
- ・工事車両運行の際は、河川敷内工事用道路の散水を適宜行い、粉塵等の抑制に努めます。また、車両出入口や工事箇所付近の清掃を行い、きれいな状態を維持するよう努めます。
- ・工事車両の通行は、8:00～18:00とします。
