


入間川流域緊急治水対策プロジェクト ハード対策について

R2年10月末時点


河道掘削・樹木伐採

河道掘削や樹木伐採により流れやすくすることで、洪水時の川の水位を低くします。

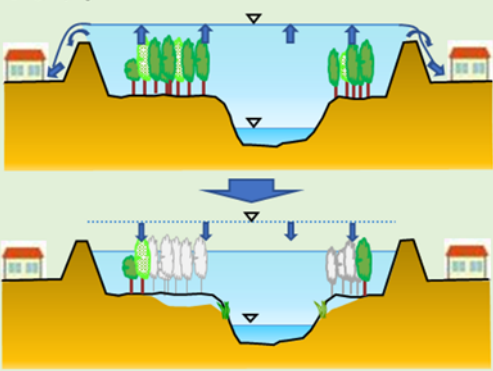


堤防整備

洪水で溢れたり、堤防が壊れたりしないよう、必要な高さや幅を確保します。

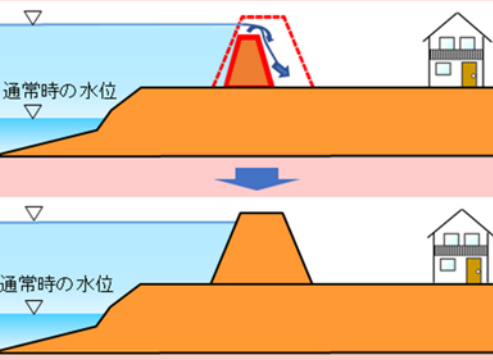

※河道内の掘削した土砂も活用して整備します

【整備手順の考え方】
河道掘削は上下流バランスを踏まえ、下流入間川区間から実施し、全体的な水位低下を図る。
並行して都幾川区間では堤防整備を先行的に進め、安全に流せる洪水の量を増加させる。

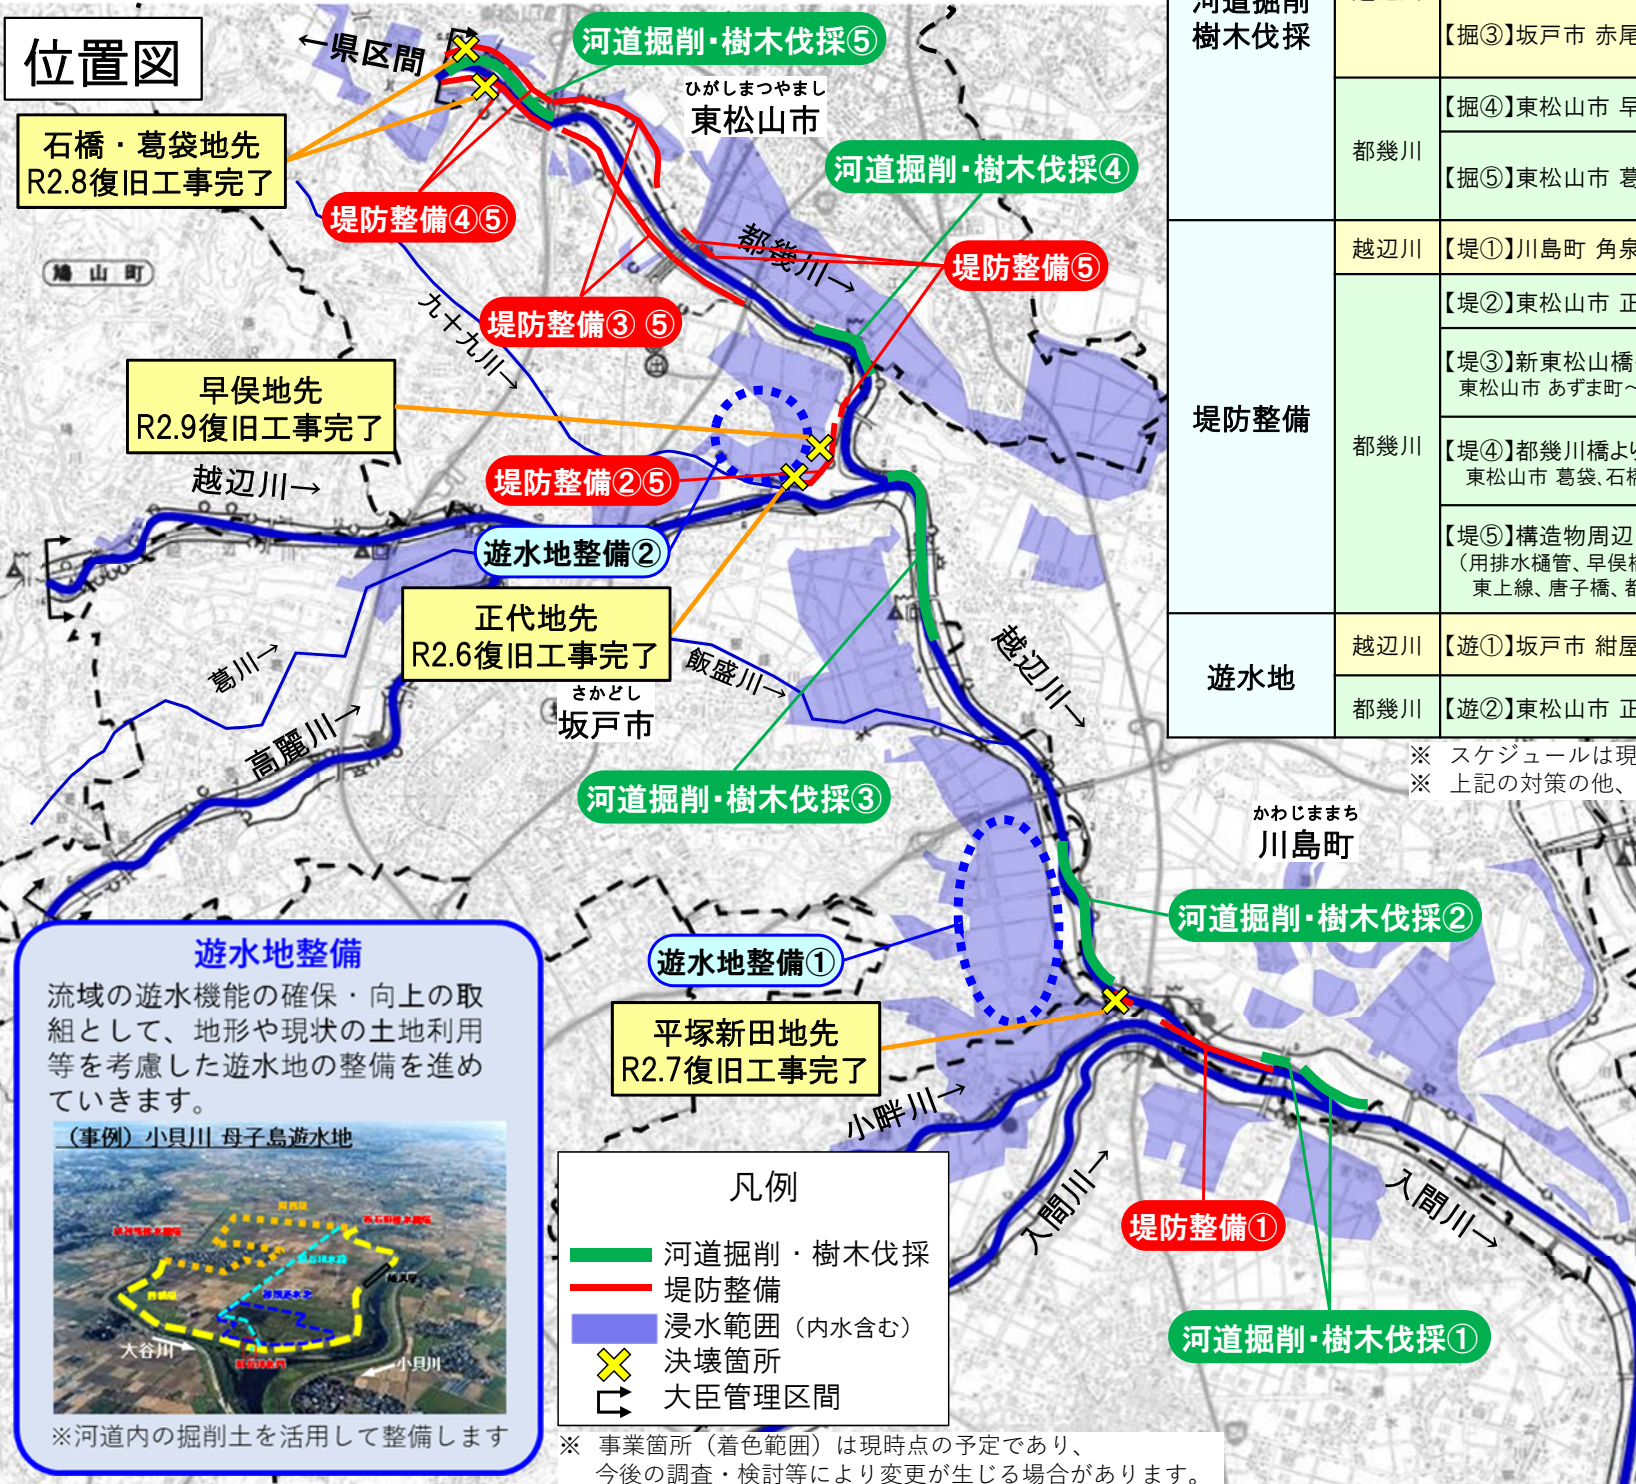

■被災した堤防の整備予定		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度以降
決壊・被災箇所の堤防整備			施工				
■多重防御治水の推進(事業別)		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度以降
河道掘削 樹木伐採	入間川 【掘①】川島町 釘無地先		測量・用地取得 施工				
	越辺川 【掘②】川島町 伊草地先 坂戸市 紺屋地先		測量・用地取得	施工			
	【掘③】坂戸市 赤尾地先			測量・用地取得 施工			
	都幾川 【掘④】東松山市 早俣地先 【掘⑤】東松山市 葛袋地先			測量・用地取得	施工		
	越辺川 【掘①】川島町 角泉地先		施工				
堤防整備	都幾川 【堤②】東松山市 正代地先	施工		測量・用地取得 施工			
	【堤③】新東松山橋～都幾川橋 東松山市 あずま町～悪戸、上郷地先			測量・用地取得 施工			
	【堤④】都幾川橋より上流 東松山市 葛袋、石橋、下唐子地先			測量・用地取得 施工			
	【堤⑤】構造物周辺 （用排水樋管、早俣橋、東松山橋、 東上線、唐子橋、都幾川橋）			測量・用地取得（堤防整備④と重複） 施工			※樋管や橋梁等の構造物周辺部については 関係機関協議などが必要
	越辺川 【遊①】坂戸市 紺屋～横沼地先		検討		測量・用地取得		
遊水地	都幾川 【遊②】東松山市 正代～早俣地先				施工（掘削土を活用した堤防整備）		

※ スケジュールは現時点での予定であり、今後の調査・検討等により変更が生じる場合があります。また、地先名は主な地先を記載しています。
※ 上記の対策の他、河川管理上必要な対策を行う場合もあります。

