

令和4年度 完成施設

施設名：木更津税務署

工事名：木更津税務署（22）電気設備改修その他工事

施設概要

所在地	千葉県木更津市富士見2-7-18
敷地	1,161m ²
建物	建物 庁舎 構造 RC造 階数 地上4階 延べ面積 1,703m ²
設計	国土交通省 関東地方整備局 営繕部 株式会社キュービックエスコンサルティング
監理	国土交通省 関東地方整備局 東京第二営繕事務所
施工	株式会社ケンモチ電機

完成写真



東京第二営繕事務所

〒135-0062

東京都江東区東雲1-9-5 東雲合同庁舎

TEL:03-3531-6550 FAX:03-3531-6695

令和4年度 完成施設

施設名：木更津税務署

工事名：木更津税務署（22）電気設備改修その他工事

工事概要


事業の目的	木更津税務署において、経年により劣化した受変電設備を更新することにより、設備の長寿命化改修を行うものである。
工事内容	<ul style="list-style-type: none">・ 受変電設備：キュービクル、PASの更新を行う。・ 電灯設備：電灯幹線の更新、幹線切替盤の新設を行う。・ 動力設備：動力幹線の更新を行う・ 構内配電線路：高圧幹線の更新を行う。
特質する工事条件	改修工事期間中も施設を使用しながらの改修工事である。 休日(閉庁日)は施工しないが、音の出る作業及び停電作業は施設管理者と監督職員で調整し、年末年始を含めた土日休日(閉庁日)で工事を行う。
工 期	令和4年7月22日～令和5年1月13日



令和4年度 完成施設

工事名：木更津税務署（22）電気設備改修その他工事

WEBを活用した遠隔臨場写真（工場検査、定例打合等）

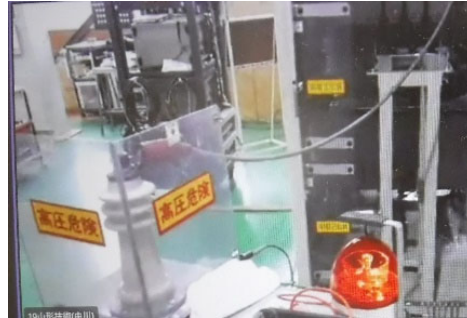

工事を終えて一言

工事施工担当者



株式会社ケンモチ電機
監理技術者 鈿持 陽子さん
(写真右・下中央)

昨今の資材の不足の中、今回の工事にあたりキュービクルメーカーや社員の努力により遅滞なく工期内に受変電設備を無事納品できましたことが感慨深かったです。

また、WEBを活用することにより工場検査や定例打合により多くの関係者の参加が可能となり、工事の協力を頂くことができました。

個人の技術力が上がることで発注者より評価していただける事が個々のやりがいにつながり、今回の工事でもより良い仕事をする事が出来ました。



東京第二管轄事務所

〒135-0062

東京都江東区東雲1-9-5 東雲合同庁舎

TEL:03-3531-6550 FAX:03-3531-6695
