

優良工事及び優秀工事技術者 事務所長表彰の概要及び表彰理由

ふりがな 会社名	ときわこうぎょうかぶしきがいしゃ すわしてん 常盤工業株式会社 諏訪支店		
ふりがな 技術者名	くわばら だいすけ 栗原 大介	職種	現場代理人
ふりがな 工事名	R5・R6おかやいじしゅうぜんしゅつちようじょかないいじこうじ R5・R6岡谷維持修繕出張所管内維持工事		
工 期	(自) 令和5年4月1日 (至) 令和7年3月31日		
事務所名	長野国道事務所		
工事概要	本工事は、一般国道20号の長野県富士見町下蔦木から岡谷市今井、坂室バイパス(茅野市)、諏訪バイパス(諏訪市)、下諏訪・岡谷バイパス(岡谷市)の道路維持工事で、主な工事としては、応急処理工、舗装補修工、道路巡回工、除雪工等である。		
表彰理由 【工事】	国道20号岡谷維持修繕出張所管内では、日常的な維持管理のほかゲリラ豪雨が起因する道路冠水への対応、また、冬期積雪時には除雪作業のほか、予防的通行止2区間の通行止や冬用タイヤ規制時の現場対応など、不測の事態への迅速、適切な対応と体制(要員)確保が必須の現場状況である。 本工事は、常時かつ突発的に発生した様々な事象に対し、工期全体を通し現場体制を確保のうえ迅速かつ適切に対応した結果、工事事故や工程に支障を来すトラブルを生ずることなく工事を完了させた。		
表彰理由 【技術者】	安心、安全に通行可能な道路環境の維持を念頭に、工事内容、現場状況を把握、これに対応可能な体制を期間を通じ確保した。監督職員とのコミュニケーションを密に行い、日常管理への対応を漏れなく実施したほか、突発事象への対応も迅速かつ適切に実施した。また、適切な工程管理により現場閉所による週休2日を確保した。		

完成又は施工状況写真




作業前打合せ



通常巡回(徒歩/パトロール)




緊急対応(交通事故処理)状況



降雪対応(排雪)状況



除草作業(生産性チャレンジ)



応急処理(橋梁補修工)




緊急(道路冠水)対応状況



降雪対応(冬タイヤチェック)状況

優良工事及び優秀工事技術者 事務所長表彰の概要及び表彰理由

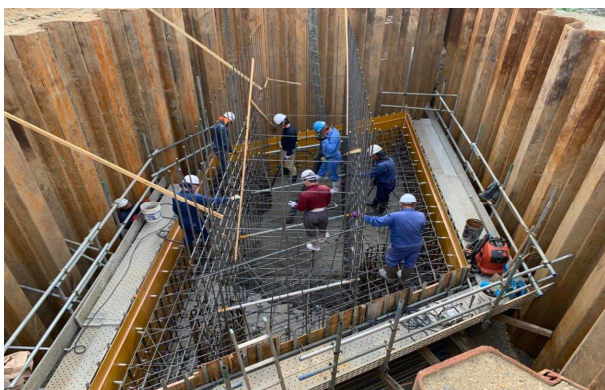ふりがな 会社名	はたやかいはつかぶしきかいしゃ 畑八開発株式会社		
ふりがな 技術者名	もり じょうじ 森 丈士	職種	現場代理人
ふりがな 工事名	R4 こくどう19ごう まつもとかくふくおちあいばしほかかぶこうじ R4国道19号松本拡幅落合橋他下部工事		
工 期	(自) 令和4年7月1日 (至) 令和6年7月31日		
事務所名	長野国道事務所		
工事概要	本工事は、一般国道19号の長野県松本市白板地先において、一級河川「田川」を渡河する落合橋新設本線の橋台2基、落合橋側道歩道橋の橋台2基、取付部のL型擁壁及び、落合橋旧橋の一部を撤去する橋梁下部工事である。		
表彰理由 【工事】	本工事は、河川区域内の狭隘な施工ヤードにおいて、新設橋梁の下部工及び、供用中の旧橋の一部を撤去する施工であるため、工程管理・安全管理が重要である。 特に堤外地に設置した施工ヤードや仮設物は、河川の増水の影響を受けやすく、気象予報に注意しながら、仮設物の点検や強固な据え付けに対応するなど、自然条件への柔軟かつ迅速な対応等の工程調整が求められた。また、旧橋梁の一部撤去においては、限られた既存資料を元に詳細な事前調査・検討を行い、建設機械の転倒防止や橋桁落下防止対策等の安全対策に取り組んだ。このような状況下において、工程管理・安全管理を適切に行い、工期内に無事故・無災害で完了させた。		
表彰理由 【技術者】	当該現場代理人は、専門的な知識と技術力をもって、適切に工程管理を行い、安全にかつ円滑に工事を完成させたことは高く評価できる。 特に、令和6年3月～4月に発生した一級河川「田川」の増水に伴い、河川内に構築した施工ヤードの流出する被災を受けた際には、昼夜を通して被災現場の復旧作業及び監視管理体制の構築し、短期間での対応に尽力した。 また、橋台前面の護岸の復旧にあたっては、狭隘な施工ヤード内において、異常出水に備えた大型土嚢設置や施工期間の短縮に努め、綿密な工程管理に取り組み、本工事を無事故で、出来ばえよく完成させたことは、他の技術者の模範となるものである。		
完成又は施工状況写真			
			
橋台の施工状況		完成	

優良工事及び優秀工事技術者 事務所長表彰の概要及び表彰理由

ふりがな 会社名	かぶしがいいしゃ こいけぐみ 株式会社 小池組		
ふりがな 技術者名	きうち あつし 木内 厚志	職種	監理技術者
ふりがな 工事名	R5こくどう19ごうながのしんしゅうしんまちひはらにしほどうこうじ R5国道19号長野市信州新町日原西歩道工事		
工 期	(自) 令和6年5月8日 (至) 令和7年3月31日		
事務所名	長野国道事務所		
工事概要	本工事は、一般国道19号長野市信州新町日原西地先において、延長約170mの区間の歩道拡幅新設、歩道側道橋の架設及び延長814mの車道舗装を行った工事である。		
表彰理由 【工事】	本工事は、供用中の国道での延長約170mの歩道拡幅新設、河川横断部の歩道側道橋新設(L=16m)の工事である。営業店舗、沿道住宅出入り口が連単する出入り車両の輻輳がある狭隘な施工環境において、道路利用者、地域住民と安全に配慮したコミュニケーションを良好に保ち、工期内に無事故で完成させたものである。 工事完成の地域を分断していた歩道未接続箇所が工事完成により地域内の歩行空間を確保することができ、地域住民から喜ばれるなど地域に感謝される工事として完了したことは表彰に値する。		
表彰理由 【技術者】	狭隘な施工現場において、擁壁工、排水構造物、歩道橋設置等の各種工事内容に応じた下請業者の指導を的確に行い、品質及び出来形の管理も優良である。着手時の工事説明会で完成予想図を3Dを用いてわかりやすい説明したことにより、地元の理解が深まり、地域とのコミュニケーションを良好に保ち、施工にあたっての下請業者への監督指導も優れており適切な工程管理により現場閉所による週休2日を確保した。 完成時において地元からの感謝が多数寄せられたこともあり、元請の監理技術者として優れた技術の結果によるものとして表彰に値する。		

完成又は施工状況写真



歩道橋施工状況



完成

優良下請企業及び優秀下請技術者 事務所長表彰の概要及び表彰理由

事務所名： 長野国道事務所

元 請 ①	工事名	R5・R6岡谷維持修繕出張所管内維持工事		
	元請業者名	常盤工業(株) 諏訪支店		
	ふりがな	ゆうげんかいしゃ つちやけんせつ		
	下請業者名	(有)土屋建設		
	下請技術者名	氏名	役職	
		河西 和磨	主任技術者	
	下請工事概要	R5・R6岡谷維持修繕出張所管内維持工事(長野県富士見町下蔦木～岡谷市今井、坂室バイパス(茅野市)、諏訪バイパス(諏訪市)、下諏訪・岡谷バイパス(岡谷市))で実施する応急処理工、舗装補修工、道路巡回工、除雪工等のうち労務を実施するもの。		
	優良下請表彰理由【工事】	本工事で実施する作業は元請との連携の元、日常的な維持管理、ゲリラ豪雨が起因する道路冠水処理対応や冬期積雪時の除雪作業、予防的通行止2区間の通行止や冬用タイヤ規制時の現場対応など不測の事態への迅速かつ適切な対応を要する現場である。 当該業者及び担当技術者は、元請者との意思疎通を密に行いつつ、これまでの従事経験を活かし、様々な現場状況に応じた対応を迅速かつ適切に実施した結果、道路利用者の安全、安心が確保された道路空間の維持に大きく寄与したもの。		

建設産業担い手確保・育成貢献工事 事務所長表彰

ふりがな 会社名	かぶしかいしゃ こいけぐみ 株式会社 小池組
ふりがな 工事名	R6こくどうじゅうきゅうごうしんしゅうしんまちみのちちくきんきゅうたいさくこうじ R6国道19号信州新町水内地区緊急対策工事
工 期	(自) 令和6年4月15日 (至) 令和6年11月30日
事務所名	長野国道事務所
工事概要	この工事は、令和6年4月15日に発生した法面崩落災害箇所、緊急対策を行った工事である。主な工種は根固めブロック製作及び設置、袋詰め玉石製作及び設置、工事用道路設置である。
表彰理由	本工事において、担い手確保・育成に関して次の取り組みを行った。 ① 地元の長野工業高校土木科の生徒を対象にインターンシップを実施（車内見学、測量実地演習、ICT建設機械の体験、工事現場見学） ② 地元の信州大学工学部水環境・土木工学科の学生を対象にPR（ICT建設機械の体験、地場ゼネコンの良さをアピール） ③ SNSを開設し、会社の出来事を発表し、求人情報とあわせてPR（令和6年度に応募面接のうちHPからの応募が3割） ④ 工事現場をフィールドにした若手技術者育成、女性技術者育成（入社後、先輩社員が丁寧に説明した。）



① 車内見学



② ICT建設機械の体験



③ SNS開設



④ 女性技術者の育成

建設産業担い手確保・育成貢献工事 事務所長表彰

ふりがな 会社名	ぶんごばやしぞうえんかぶしきかいしゃ 文吾林造園株式会社
ふりがな 工事名	R5・R6うえだしゅっちょうじょかんないりよくちかんりこうじ R5・R6上田出張所管内緑地管理工事
工 期	(自) 令和5年4月1日 (至) 令和7年3月31日
事務所名	長野国道事務所
工事概要	本工事は、上田出張所管内の国道18号において、高木や中低木、寄植の剪定工、高・中・低木防除工や抜根除草工及び応急処理工などを主に施工する緑地管理工事である。
表彰理由	インターンシップの実施を行い、国道の緑地帯における樹木の管理(剪定・除草・防除・灌水等)について説明をおこない、国道の緑地管理について理解してもらった。また、作業上の事故について起こりうる事故と対策について説明をおこない、作業というものが如何に危険であるか知ってもらうとともに、1人1人が安全の意識を持ち、作業前の打ち合わせと危険に対する対策を練るという大切さを理解いただいた。さらには、近年、落ち葉や見通しが悪いなど街路樹が厄介だと思われているが、樹木の役割(二酸化炭素の吸収と酸素の放出・温暖化の防止・災害の防止等)について説明し、人間には欠かせない存在ということを理解していただくなど、本業務が必要不可欠であることをアピールし担い手確保に積極的に取り組んでいる。

工事写真



建設産業担い手確保・育成貢献工事 事務所長表彰

ふりがな 会社名	かぶしきがいしゃかくまぐみ 株式会社鹿熊組
ふりがな 工事名	R5こくどう18ごううえだBPこくぶちかいりょう3こうじ R5国道18号上田BP国分地区改良3工事
工 期	(自) 令和6年8月19日 (至) 令和7年3月31日
事務所名	長野国道事務所
工事概要	本工事は、国道18号上田BP(延伸)延長4.1km区間の長野県上田市国分地先外において、水管橋の橋台2基や道路土工、法面工、排水構造物工及び大型ブロック積み擁壁や舗装工を主に施工する道路改良工事である。
表彰理由	若手技術者の育成指導の一環として、研修題目を会社の課長職以上または安全管理室が主体となって作成し、月1回程度、若手技術者や女性技術者に育成指導を実施している。

工事写真



新技術・生産性向上工事表彰の概要及び表彰理由

ふりがな 会社名	かぶしがいいしやみやしたぐみ 株式会社宮下組
ふりがな 工事名	R5こどう18ごうえだBPあおくぼちくかいりょう3こうじ R5国道18号上田BP蒼久保地区改良3工事
工 期	(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
事務所名	長野国道事務所
工事概要	本工事は、国道18号上田バイパス(延伸)延長4.1km区間の長野県東御市和地先から長野県上田市国分地先において、道路土工や法面工、擁壁工及び除草工や応急処理工などを主に施工する道路改良工事である。
表彰理由	本工事の施工にあたっては、現場打ち集水桝のプレキャスト化を行うことにより、通常1箇所当たり2週間の施工期間が必要であったが、プレキャスト製品を採用し施工期間が1日となり省人化と工程短縮が行えた。 また、擁壁工において、補強土壁笠コンクリートに残存型枠を使用し、足場上での危険を伴う作業を大幅に削減することにより安全性の確保と省人化を行うなど生産性向上に積極的に努めている。

工事写真



新技術・生産性向上工事表彰の概要及び表彰理由

ふりがな 会社名	かぶしがいしやさんたきざわ 株式会社サンタキザワ
ふりがな 工事名	R5こくどう18ごうながのひがしBPやなぎはらちくかいりょうほうそう9こうじ R5国道18号長野東BP柳原地区改良舗装9工事
工 期	(自) 令和6年7月29日 (至) 令和7年3月31日
事務所名	長野国道事務所
工事概要	本工事は一般国道18号長野東バイパスの長野県長野市柳原地区において、側道の整備工事(擁壁工、排水構造物工、舗装工、踏掛版工)を行うものである。
表彰理由	本工事では、型枠組立の際に新技術「OKヒートパッキン」NETIS登録番号【KT-160046-VE】を活用しパッキンとキャップが一体となった製品をセパレータの端部に打ち込むことで、Pコーン穴からの漏水やセパレータ端部の腐食に対するの対策を行った。さらに、この製品自体がモルタルでのPコーン穴埋めも兼ねているので、従来手法に比べ省力化に繋がった。 また、生産性向上の取組として現場打集水枡N=2基(深さ約2m)をプレキャスト化し、作業の省力化、さらに2分割にすることで施工機械の小型化をはかり、14人工のコスト縮減及び9日間の工程短縮を行った。

工事写真



型枠組立状況



現場打集水枡のプレキャスト化



OKヒートパッキン



集水枡設置状況

新技術・生産性向上工事表彰の概要及び表彰理由

ふりがな 会社名	かぶしがいいしやにいつぐみ 株式会社新津組
ふりがな 工事名	R5こくどう18ごうさかきこうしょくBPあみかけちくかいりょう8こうじ R5国道18号坂城更埴BP網掛地区改良8工事
工 期	(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
事務所名	長野国道事務所
工事概要	本工事は、国道18号坂城更埴バイパス(坂城町区間)の長野県埴科郡坂城町網掛地先において、横断ボックス1箇所や地盤改良工、路体盛土工、排水構造物工などを主に施工する道路改良工事である。
表彰理由	本工事において、従来2人で行う現場測量を自動追尾式トータルステーションを用いることにより、作業をワンマン化し測量時の人員削減を行った。また、現場測量アプリ「FIELD-TERRACE」を併用し測量時間の短縮も行った。 工事写真の撮影において、デジタル小黒板を使用することにより前もって電子黒板に内容を記入・保存できるので、現場での作業を中断する事なく進められるため、撮影に必要な時間を短縮できた。また写真整理についても従来であれば撮影した写真の振り分け整理に時間を費やしたが、事前に項目を作成してある事で取り込む際に自動的に振り分けられ整理することなくまとまり写真整理の時間を短縮することができた。さらに大きな黒板の持ち運びが不要となり、狭隘な箇所や危険箇所での写真撮影が容易になり、安全性の向上にもつながるなど、積極的に生産性向上に努めている。

工事写真



新技術・生産性向上工事表彰の概要及び表彰理由

ふりがな 会社名	まつもとどけん かぶしかいしゃ 松本土建株式会社
ふりがな 工事名	R5 こくどう18ごう さかきこうしょくばいばす しおぎさちく かいりょう16こうじ R5国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良16工事
工 期	(自) 令和6年8月1日 (至) 令和7年3月31日
事務所名	長野国道事務所
工事概要	本工事は、一般国道18号坂城更埴バイパスにおいて、地盤改良工等を行うものである。
表彰理由	本工事の地盤改良工の施工においては、新技術である地盤改良工の施工状況を可視化できる施工管理システムを用いることにより、複数の現場スタッフが施工状況の確認や視覚的な施工情報の把握が可能となり、地盤改良工事の信頼性の向上が図れた。 また、GNSS(全球測位衛星システム)の併用により、打設位置まで施工機械の誘導ができ、施工の精度が向上した。

工事写真

【地盤中の施工状況をリアルタイムにアニメーション表示】



ふりがな


まつもとどけん かぶしかいしゃ

会社名

松本土建株式会社

工事写真

【打設位置まで施工機械を誘導】

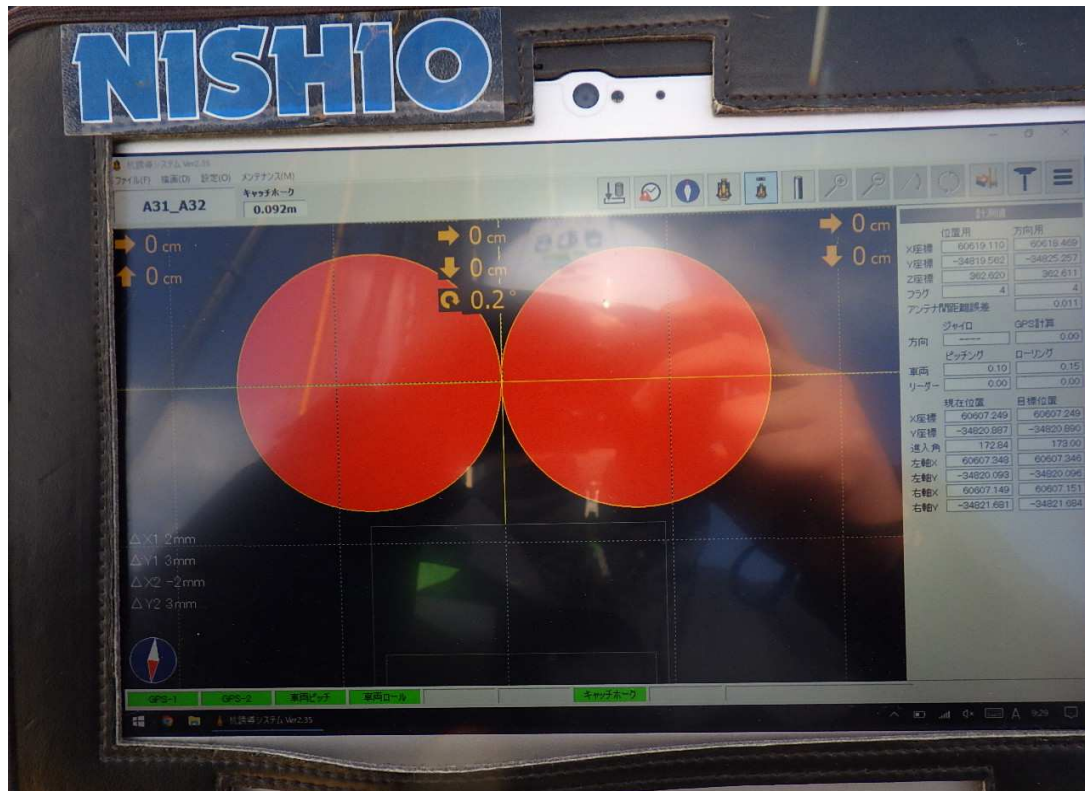

【地盤改良機械】



若手・女性技術者奨励賞 表彰理由

ふりがな 会社名	かぶしがいしやみやしたぐみ 株式会社宮下組		
ふりがな 技術者名	くぼた まさなり 窪田 正成	職種	現場代理人
ふりがな 工事名	R5こくどう18ごうえだBPあおくぼちくかいりょう3こうじ R5国道18号上田BP蒼久保地区改良3工事		
工 期	(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日		
事務所名	長野国道事務所		
工事概要	本工事は、国道18号上田バイパス(延伸)延長4.1km区間の長野県東御市和地先から長野県上田市国分地先において、道路土工や法面工、擁壁工及び除草工や応急処理工などを主に施工する道路改良工事である。		
表彰理由 【技術者】	本工事の現場代理人として、若いながらもこれまでの経験と知識を生かし、監理技術者と協力しながら、責任を持って監督職員と綿密な協議を行い、工事全般について適切な対応に努めて工事を進め、施工内容の変更などにも迅速且つ柔軟に対応し、無事故で工事を完成させた。 また、周辺地域住民を対象とした現場見学会や地域の高校を招いての現場見学会では、ICT施工に関する説明や建設機械の説明及びドローンの操縦体験などについて自ら説明、実践してみせたり、後輩の若手技術者の良き相談役として指導を行うなど、担い手確保の取組みに積極的に携わり、工事や建設産業のイメージアップにも貢献している。		

完成又は施工状況及び取組状況



若手・女性技術者奨励賞の概要及び表彰理由

ふりがな 会社名	こくさいこうぎょう かぶしきがいしゃ ながのえいぎょうしょ 国際航業 株式会社 長野営業所		
ふりがな 技術者名	だて じゅんこ 伊達 純子	職種	管理技術者
ふりがな 業務名	R5あづみのこうえんしせつだいちょうかんりしずむこうちくぎょうむ R5あづみの公園施設台帳管理システム構築業務		
履行期限	(自) 令和5年9月26日 (至) 令和6年12月26日		
事務所名	長野国道事務所		
業務概要	本業務は国営アルプスあづみの公園における効率的な公園管理・運営やコスト縮減に向け、関係者間で情報共有可能なクラウド型式の公園施設台帳管理システムの構築を行う業務である。		
表彰理由	公園施設台帳管理システムに搭載するデータは、公園基礎情報のデジタル化ガイドラインに準じて作成するとともに、データをクラウド格納することにより、複数端末から同時編集を可能とするなど、優れた成果を上げ、貢献した。		

優良業務及び優秀技術者 事務所長表彰の概要及び表彰理由

ふりがな 会社名	ちゅうおうふっけんこんさるたんつ かぶしがいいしゃ とうきようほんしゃ 中央復建コンサルタンツ 株式会社 東京本社		
ふりがな 技術者名	たけばやし まさはる 竹林 正晴	職種	管理技術者
ふりがな 業務名	R5こくどう20ごうすわばいばすとんねるよびせつけいぎょうむ R5国道20号諏訪バイパストンネル予備設計業務		
履行期限	(自) 令和5年10月24日 (至) 令和7年3月21日		
事務所名	長野国道事務所		
業務概要	本業務は国道20号諏訪バイパスの2箇所トンネルについて、地形地質的な課題や周辺環境への配慮に着目したトンネル予備設計を行う業務である。		
表彰理由	大断面かつ上下線近接となるトンネル坑口において、FEM解析による地山安定及び支保工応力照査を実施した上で、骨組構造解析により暫定供用を想定したトンネル覆工構造を採用するなど、優れた成果を上げ、貢献した。 また湧水・地下水に対する設計検討において、類似トンネル事例を参考に予測湧水量等に応じた対策と地下水保全対策を選定するなど、優れた成果を上げ、貢献した。		

優良業務及び優秀技術者 事務所長表彰の概要及び表彰理由

ふりがな 会社名	かぶしきがいしゃ えいとにほんぎじゅつかいはつ 株式会社 エイト日本技術開発		
ふりがな 技術者名	あらかわ えいじ 荒川 英史	職種	管理技術者
ふりがな 業務名	R5こくどう18ごうえだばいばすほかどうろしょうさいせつけいぎょうむ R5国道18号上田バイパス外道路詳細設計業務		
履行期限	(自) 令和6年3月27日 (至) 令和7年3月31日		
事務所名	長野国道事務所		
業務概要	本業務は国道18号上田バイパスにおいて、過年度設計に基づき交差点計画や沿道への接続計画等の見直しを行うとともに、関係機関協議結果や地元要望対応に基づき道路詳細設計を行う業務である。		
表彰理由	CIM活用により、道路整備後状況を3次元表現した設計説明資料を作成し、地元との円滑な合意形成に寄与するなど、優れた成果を上げ、貢献した。 また暫定供用時の交差点渋滞予測と交差点解析を行い、渋滞対策案の検討を実施するなど、優れた成果を上げ、貢献した。		

優良業務及び優秀技術者 事務所長表彰の概要及び表彰理由

ふりがな 会社名	にほんこうえい かぶしがいいしゃ 日本工営 株式会社		
ふりがな 技術者名	たなか やすまさ 田中 靖政	職種	主任技術者
ふりがな 業務名	R6ながのこくどうじむしょかんないぼうさいかんしぎょうむ R6長野国道事務所管内防災監視業務		
履行期限	(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日		
事務所名	長野国道事務所		
業務概要	本業務は長野国道事務所管内の防災監視箇所の状況を把握するための現地点検及び設置済計測機器で計測したデータ整理を行うほか、計測データあるいは計測機器の異常を確認した場合に当該監視箇所の現地調査及び点検を行う業務である。		
表彰理由	防災監視として落石、岩盤崩落や地すべり斜面、洞門、トンネル、のり面に関する観測、WEBカメラ監視、落石検知センサー監視、計測データ整理等を実施し、また、施工管理としてグラウンドアンカー工現場の施工管理と現地観測とともに、防災ドクターや土木研究所等との関係機関協議を迅速に実施するなど、優れた成果を上げ、貢献した。 また能登半島地震を受け全国実施した緊急盛土点検では、8箇所の緊急点検と安定度評価を迅速に実施するなど、優れた成果を上げ、貢献した。		
