

工事情報【譲原地すべり対策（神流川流域）】

かやかぶちくあんかーこうじ

工 事 名 R7 栢ヶ舞地区アンカー工事
工 期 令和8年5月11日～令和8年12月25日
受 注 者 佐田建設株式会社
工事場所 群馬県藤岡市譲原地先
工事目的 地すべりを抑止することを目的として、
アンカーを施工します。


施工状況写真

令和8年9月2日現在

アンカー工 受圧板設置、削孔等



アンカー工 受圧板設置、削孔等

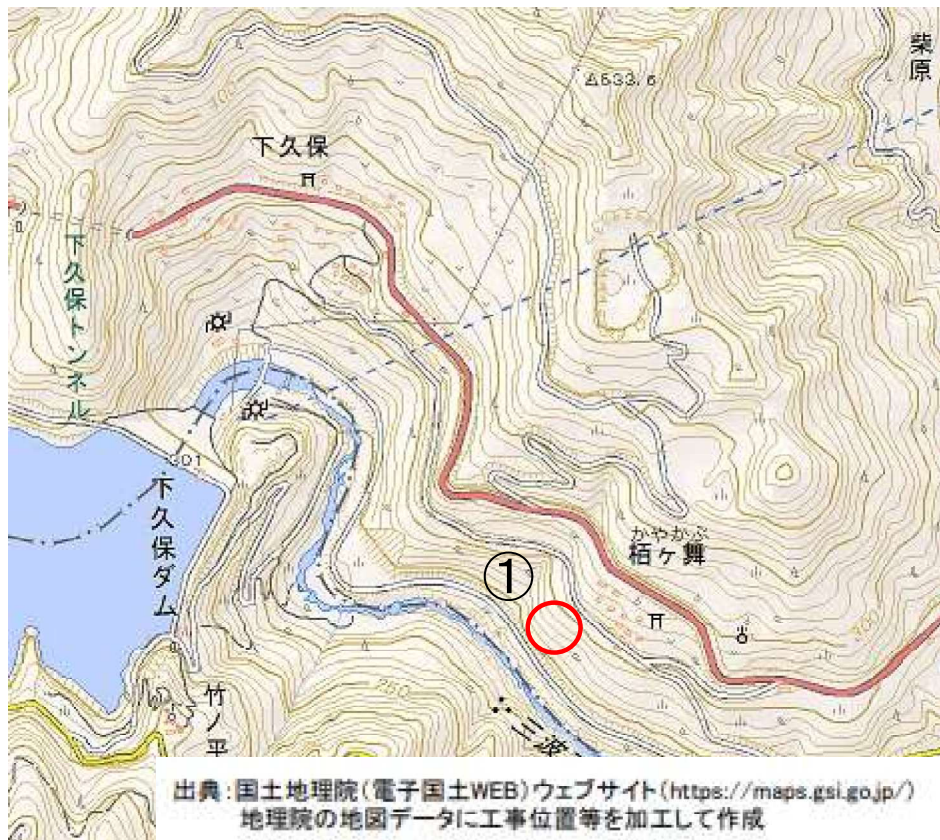

工事情報【譲原地すべり対策（神流川流域）】

法面工 平面図 S=1:250

工事範囲 L=108.38m

アンカー(2×φ13, 付、T3=559, 5kN/本、 $\tau=40$ 本(89.0m)

受圧板(2.40×2.40×0.21) 83.0、 $\tau=40$ 基 ラス金網張り(φ2×50×50) A=280m²

小段部モデル枠付(付5.0m) 付12m²

植生基盤吹付(付7.0m) A=159m²

