



2. 決壊した堤防の応急復旧～チーム印旛沼～【9月27日(日) 17時時点】

発災日時・場所: 9月22日 5時頃※、①千葉県成田市船形干拓地先、②千葉県成田市下方地先
9月23日13時頃※、③千葉県印旛郡栄町酒直地先 ※については②と③は覚知日時
被災延長・被災概要: ①堤防決壊 L=約100m(速報値) ②堤防決壊 L=約50m(右岸)、L=約50m(左岸) (速報値)
③堤防決壊 L=約20m(右岸)(速報値)


被災箇所の状況

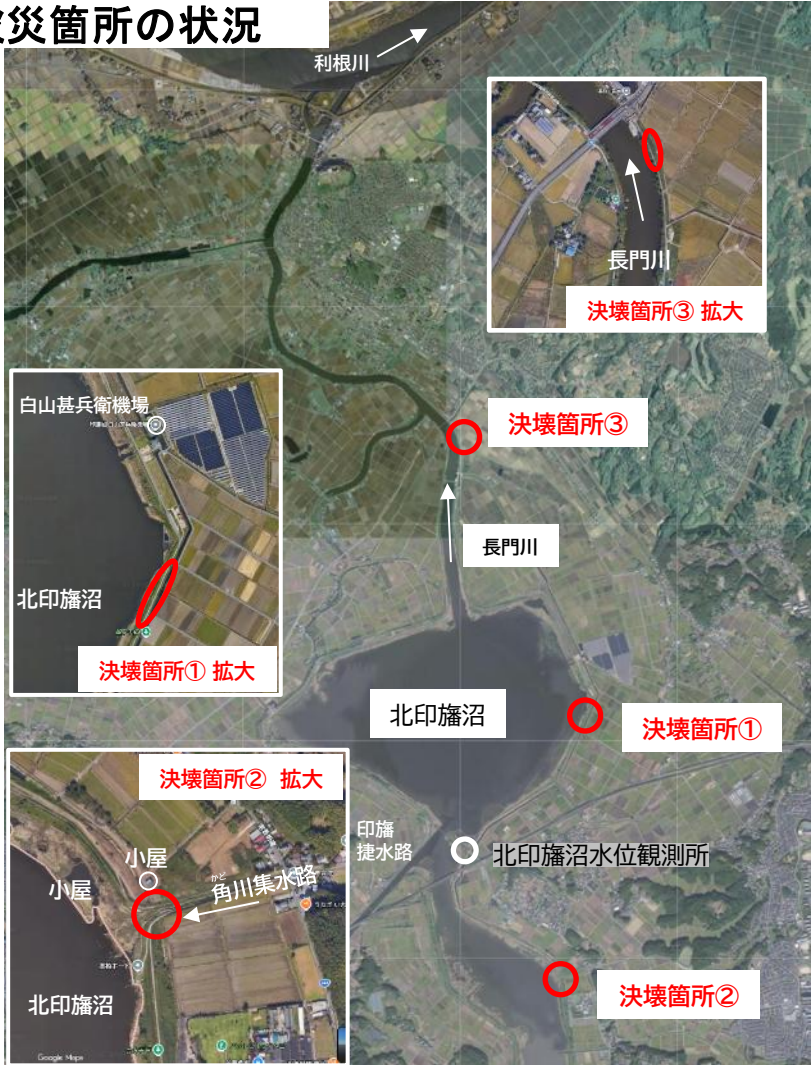

荒締切断面図 (決壊箇所①船形地先)

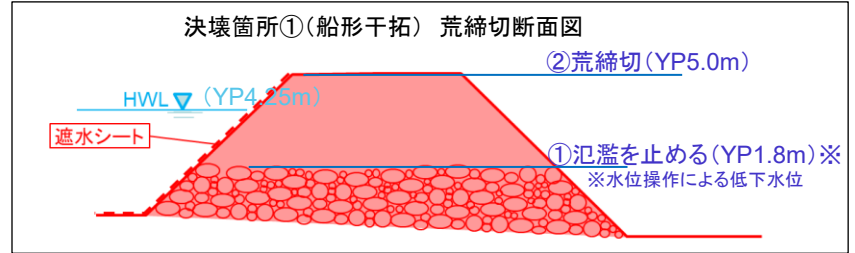

荒締切工程

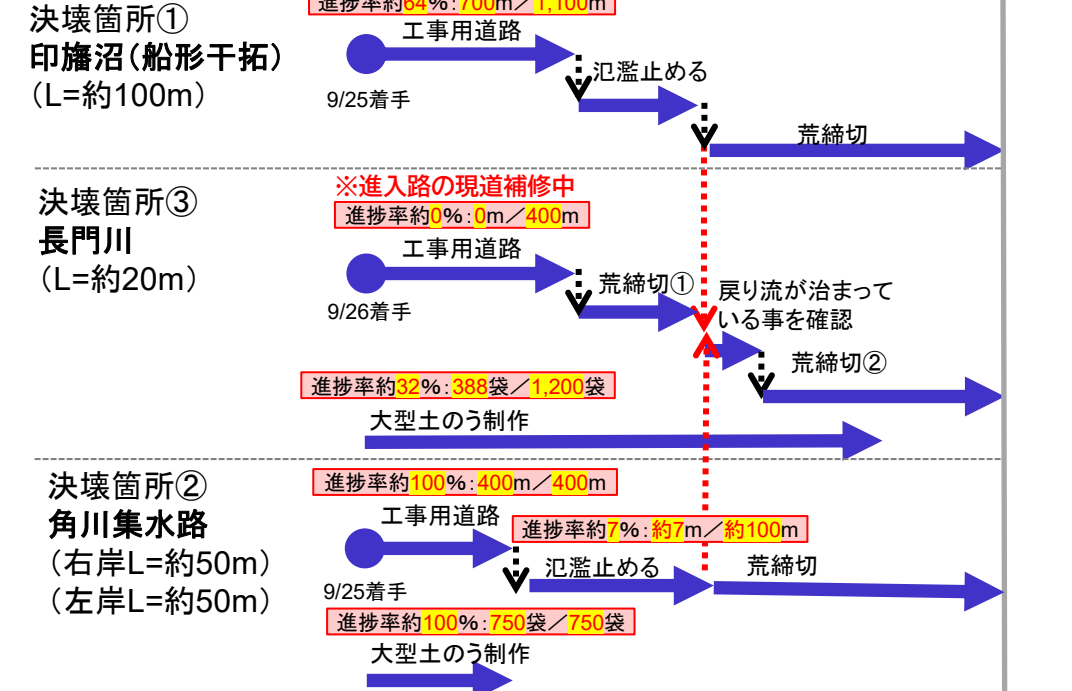

1. 工事概要

決壊した印旛沼の堤防の緊急復旧について、千葉県の要請に基づき技術的支援を実施しており、25日から緊急復旧工事に着手し、早期完了を目指し鋭意進めています。

【施工業者】鹿島建設(株)

【緊急復旧工事内容】

- ・工事用道路工
- ・荒締切工
- ・鋼矢板二重締切工

2. 工事経過


- ・9月25日(金) 緊急復旧工事着手
- ・9月27日(日) 工事用道路工 64%完了

【施工位置: 成田市船形干拓地先】




進捗状況

位置図

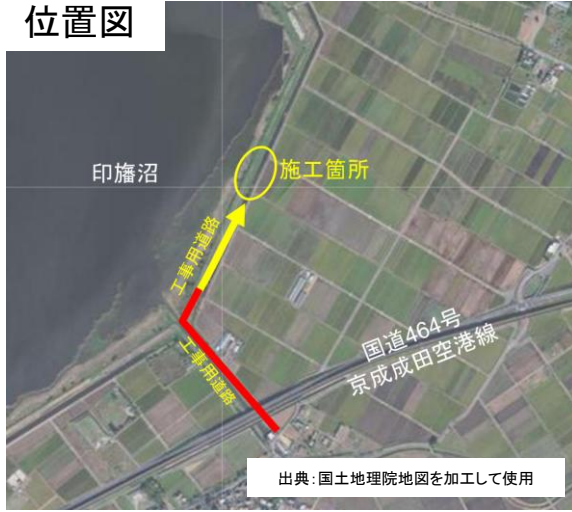

凡例 □: 未施工 ▨: 施工中 ■: 施工完了

荒締切断面図



工事進捗率		
○工事用道路工		64%
○荒締切工		0%
○鋼矢板二重締切工		0%

※進捗率は全体施工量より算出しています

現地施工状況

工事用道路整備状況



9月27日 11:30撮影

2. 決壊した堤防の応急復旧 ～チーム印旛沼～【9月27日(日) 17時時点】

角川集水路


発災日時	9月22日(火)5時頃※覚知日時	対応状況	9月24日	テックフォース及び県で現地を確認し、 応急復旧方針を決定後着手予定
発災場所	千葉県成田市 ^{したかた} 下方地先			
被災概要	堤防決壊 L＝約50m(右岸)、L＝約50m(左岸) (速報値)	9月25日	緊急対応着手【施工業者:(株)小高興業 ^{おだかこうぎょう} 】	
		9月27日	工事用道路が完了し、荒締切着手	

【位置図】



北印旛沼 拡大図

【応急対策内容】

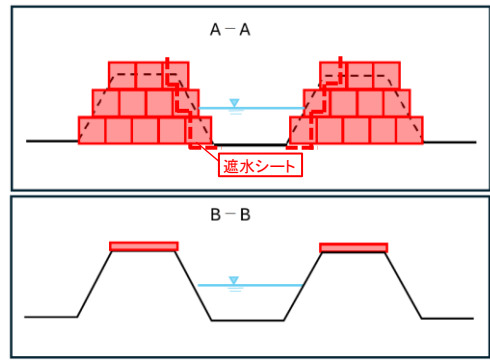

【被災箇所の状況】



【応急対策の状況】

<作業状況写真>



9/27 作業状況

<作業終了時 定点写真>



9/27 17時時点

工事用道路整備(敷鉄板敷設)状況

2. 決壊した堤防の応急復旧

～チーム印旛沼～【9月27日(日) 17時時点】
利根川水系長門川



国土交通省
関東地方整備局


発災日時 9月23日(水) 13時頃※覚知日時
発災場所 千葉県栄町酒直地先
被災概要 堤防決壊 L=約20m(右岸)(速報値)

対応状況 9月24日 テックフォース及び県で現地を確認し、
応急復旧方針を決定後着手予定
9月26日 緊急対応着手【施工業者:村楳建設工業(株)】

【位置図】



【応急対策内容】

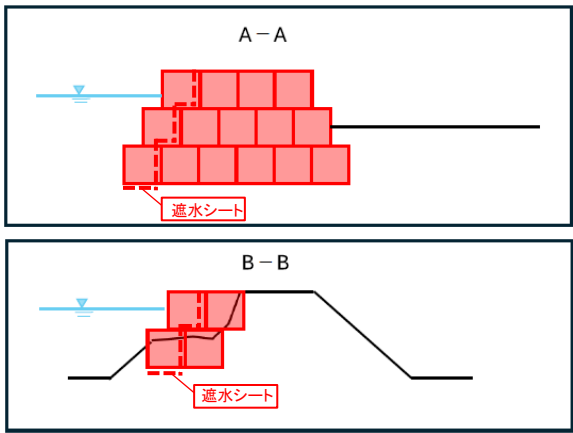

【被災箇所の状況】



【応急対策の状況】

<作業状況写真>



<作業終了時 定点写真>



工事用道路整備(大型土のう作成)状況
