

【工事概要】 既設管きよの老朽化に伴い、管きよの更新を行う工事

【具体的な工夫】


■騒音・振動の緩和

・既設の鉄筋コンクリート管のこわし作業において、ブレーカーを極力使用せずコア削孔を併用することで、騒音・振動の低減に努めた。



■渋滞緩和・解消

・他企業工事と隣接していたが、同一車線を確保するよう、規制帯を調整し、通行車両の導線を確保した。

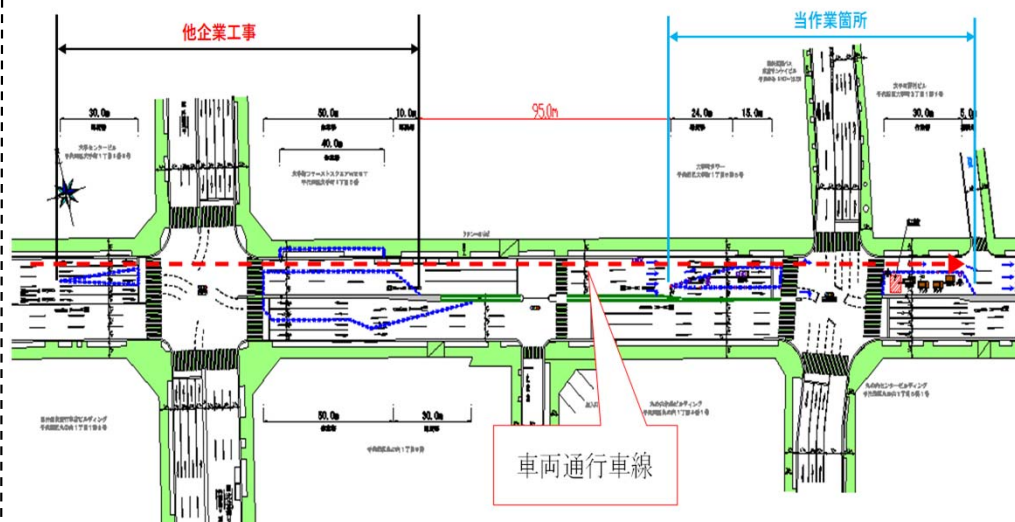

■地域への貢献

・デジタルサイネージを設置し、夜間においてもたくさんの工事情報をコンパクトに掲示することでイメージアップに努めた。



■安全対策

・通行車両から視界に入りやすいよう、通行車両誘導用矢印板を高さを変えて複数設置した。

