


- 講師を招いて熱中症予防教育を、職員・作業員全員を対象として実施
- 熱中症予防体調チェックシートによる対象確認

【熱中症予防教育】

- ・半日安全教育時に大塚製薬(株)講師にて実施

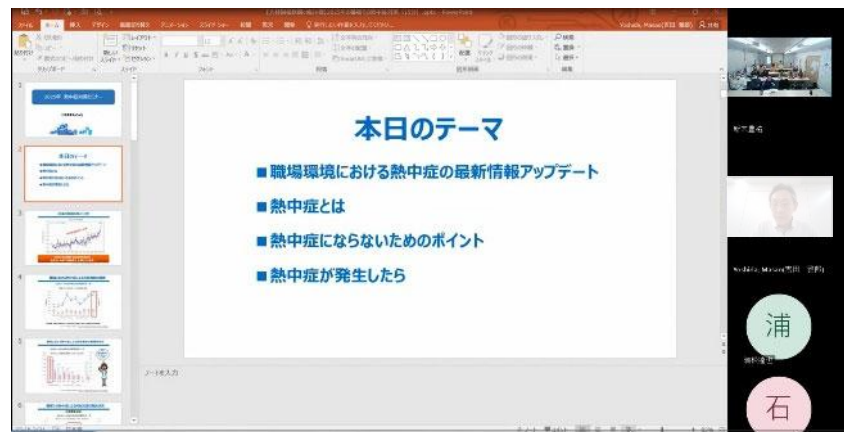

【熱中症予防体調チェックシート】

- ・ATKY活動時各自当日の体調を確認して記入
- ・当日の水分・塩分摂取量を休憩時間毎に記入

[illegible]

工事現場における熱中症予防対策事例②(暑さ指数(WBGT値)の測定)

【取組事例: R3横浜湘南道路藤沢地区改良その4工事】

- 現場内3カ所において、「SisMil(シスミル)」による測定及び「direct(ダイレクト)」による配信
- 携帯WBGT計を各作業班ごとに携帯し、各作業エリアで測定


【北西ヤード測定器】



【北東ヤード測定器】



【direct配信画面】

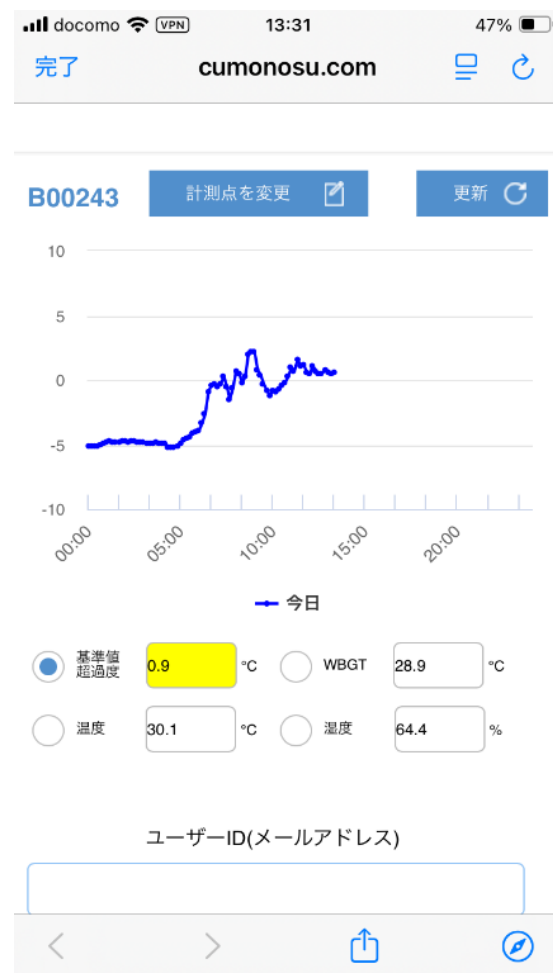

【携帯WBGT計】



- **WBGT値34以上**

34未満となるまで作業一時中止

- **WBGT値34未満28以上**

28以上は、1時間に30分休憩

- **WBGT値28未満25以上**

25以上は、1時間に10分休憩

・作業中止・休憩時間はdirectにより送信 強制的に実施

1. 空調服全員着衣



2. 熱中症対策リストバンド全員着装



3. 防暑タレ全員着装



工事現場における熱中症予防対策事例⑤(熱中症対策リストバンド発報時の対応)

【取組事例：R3横浜湘南道路藤沢地区改良その4工事】

- 熱中症対策リストバンドが発報したら、現場事務所に連絡
- 発報が解除されるまで休憩継続、本社に状況を直接報告



10分以上休憩すべきこと



【注意！】 WBGT値25℃以上の場合は、50分連続作業ごとに休憩10分以上確保
湿度50%以上、WBGT値31℃以上では、もっと作業時間を減らす必要があります

リストバンドアラーム報告

鳴動したら必ず報告！



東京本店
横浜支店
関東支店用

本社 安全本部

勘定コード／物件キー 5桁
例)10AAXXXXX この赤字を記載

XXXXX

MAKE BEYOND
つくるを拓く

リストバンドは正しく着用

出退勤も着用



装着！



自宅からの着用で
正確な検知ができます



検知！



猛暑は夕方でも気を
抜けません。ご注意！



脱着！



正しく着用

正常着用
OK!



バンド緩い
NGX



電源OFF
NGX



腕が濡れた
NGX



服の上から
NGX



リストバンドアラーム報告

鳴動したら必ず報告！



東京本店
横浜支店
関東支店用

本社 安全本部

勘定コード／物件キー 5桁
例)10AAXXXXX この赤字を記載

XXXXX

MAKE BEYOND
つくるを拓く

工事現場における熱中症予防対策事例⑥(熱中症対策室の設置)

【取組事例：R3横浜湘南道路藤沢地区改良その4工事】

- 24時間エアコンフル稼働
- 室内はカーペット敷き
- 冷蔵庫に飲料他常備
- 熱中症対策ポスター掲示

【熱中症対策室(熱中症シェルター)】



【応急品の配置】



【熱中症対策ポスター掲示】



【現場事務所カーペット敷き】



【冷蔵庫】



工事現場における熱中症予防対策事例⑦(熱中症対策用設備の設置)

【取組事例: R3横浜湘南道路藤沢地区改良その4工事】

【現場事務所に設置】

アイススラリー冷蔵庫



冷水器



製氷機



ヘルメット洗浄機



【屋外トイレに設置】

エアコン



脱水症セルフチェック



【現場に設置】

スーパーウィン



スポットクーラー

