


中川・綾瀬川緊急流域治水プロジェクトの進捗状況（春日部市）

～令和5年6月大雨を受けて国・県・市町が連携し、緊急的な取組を実施～


【R7.11末時点】

○春日部市では、「**氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策**」として、内水氾濫に対応するための排水ポンプ施設の整備、雨水管きょ施設、雨水貯留施設の整備を行います。「**被害対象を減少させるための対策**」として、特定都市河川浸水被害対策法に係る検討・調整を実施します。また、「**被害の軽減、早期復旧・復興のための対策**」として、小型浸水センサの設置により浸水箇所を早期に把握し、早期復旧・復興に努めます。

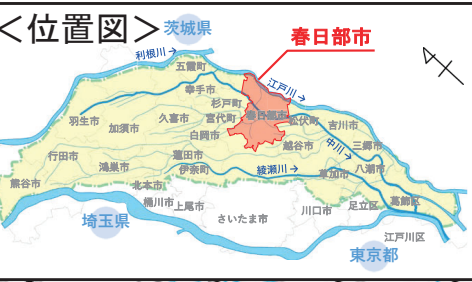

● 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

対策内容	対象地区	主体	進捗率		
			20%	40%	100%
①排水ポンプ施設の整備	①-1 緑町ポンプ場	市			
	①-2 藤塚地区ポンプ場	市	30%		
②排水ポンプ施設の検討・整備	②-1 土井ポンプ場	市			
	②-2 備後ポンプ場	市			
③雨水管きょ施設の整備	③-1 谷原排水区(管渠)	市	50%		
	③-2 会之堀第一幹線	市	30%		
④雨水貯留施設の整備	新方川・会之堀川流域(谷原雨水貯留施設)	市	70%		

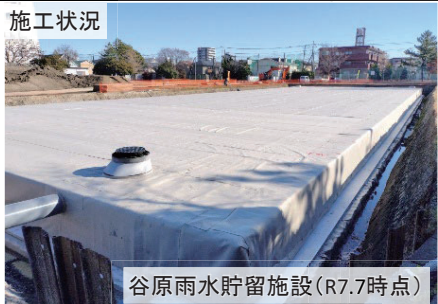

※ 国による「河川整備【中川】」、県による「河橋梁架換・樋門改築・堤防嵩上【新方川】・河道掘削【会之堀川、大落古利根川】校庭貯留施設整備」の進捗状況は別紙のとおり

● 被害対象を減少させるための対策

- 令和6年度は、流域水害対策計画の策定に向けた調整を行い、令和7年3月に計画が策定されました。
- 今後は、貯留機能保全区域の設定に向けて関係機関と協議します。

流域水害対策計画の策定

令和7年3月策定済

● 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

- 令和7年度末に市ホームページで公開予定の「雨水出水浸水想定区域図」の作成中。
- 市内の道路冠水常習地点に浸水センサーを道路部局、河川部局において合計15箇所設置。道路冠水の早期把握に活用。

令和6年度設置済(15箇所)



谷原地区 (R7.7時点)
