

H27 台風18号常総市三坂町(下流工区)緊急復旧工事【本復旧】

茨城県常総市三坂町地先 鬼怒川左岸20.9K付近 大成建設株式会社

施工前



【施工前】2016年1月12日

完成



【完成】2016年5月27日

工事の工夫した点

盛土の徹底した品質管理



～プラント製造の3種混合土とRIを用いた締固め管理～



【技術屋のこだわり】

地域の皆さんを洪水から守るための堤防に用いる盛土材は、堤防の機能を確保するために3種類の土の混合が必要でした。そのため、プラントで混合攪拌する工法を採用することにしました。製造された盛土材の品質管理はもちろんのこと、盛土の締固め管理にもしっかり取り組みました。短時間で盛土の水分や密度が測定できるRI計器という測定器を採用することで、刻一刻と変化する現場条件に対応しながら、確実な築堤盛土を行いました。

施工の状況

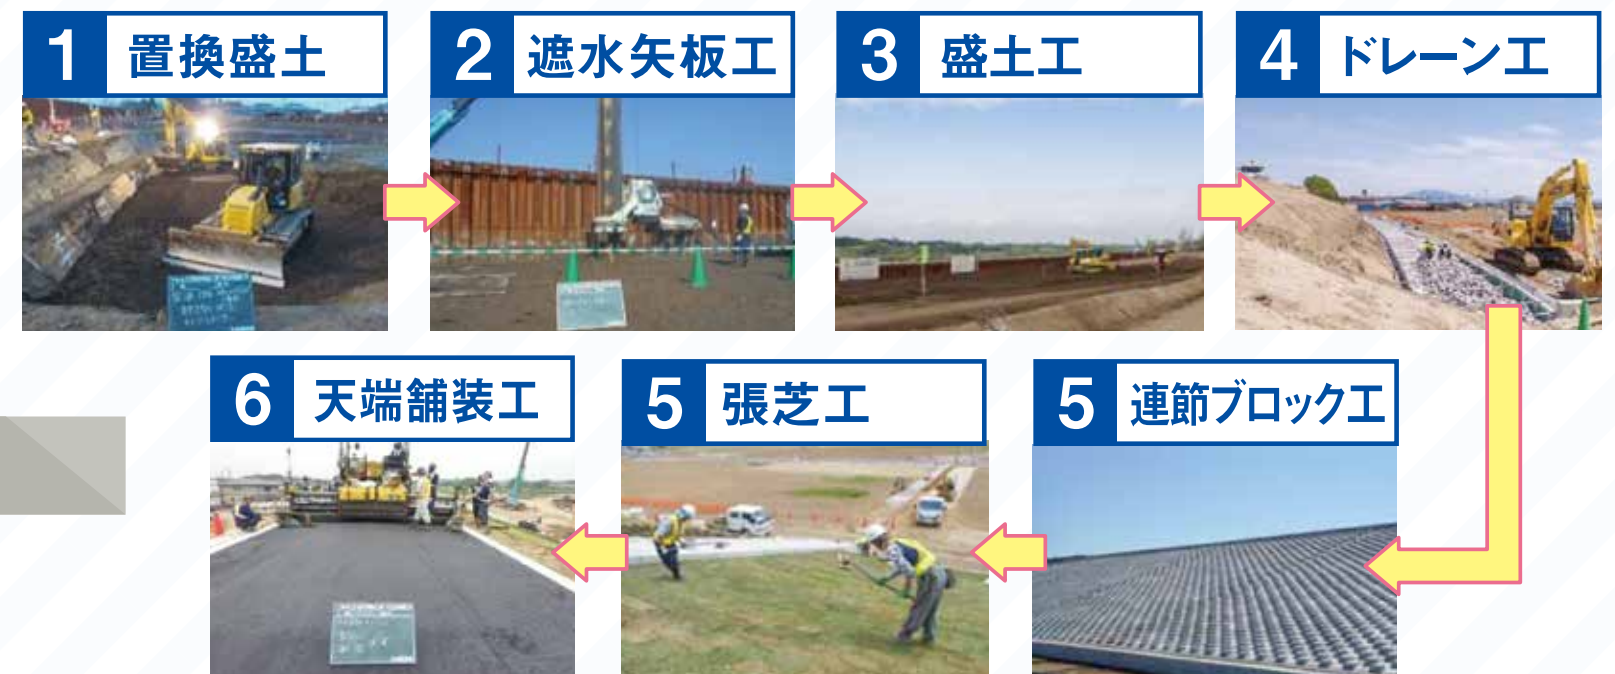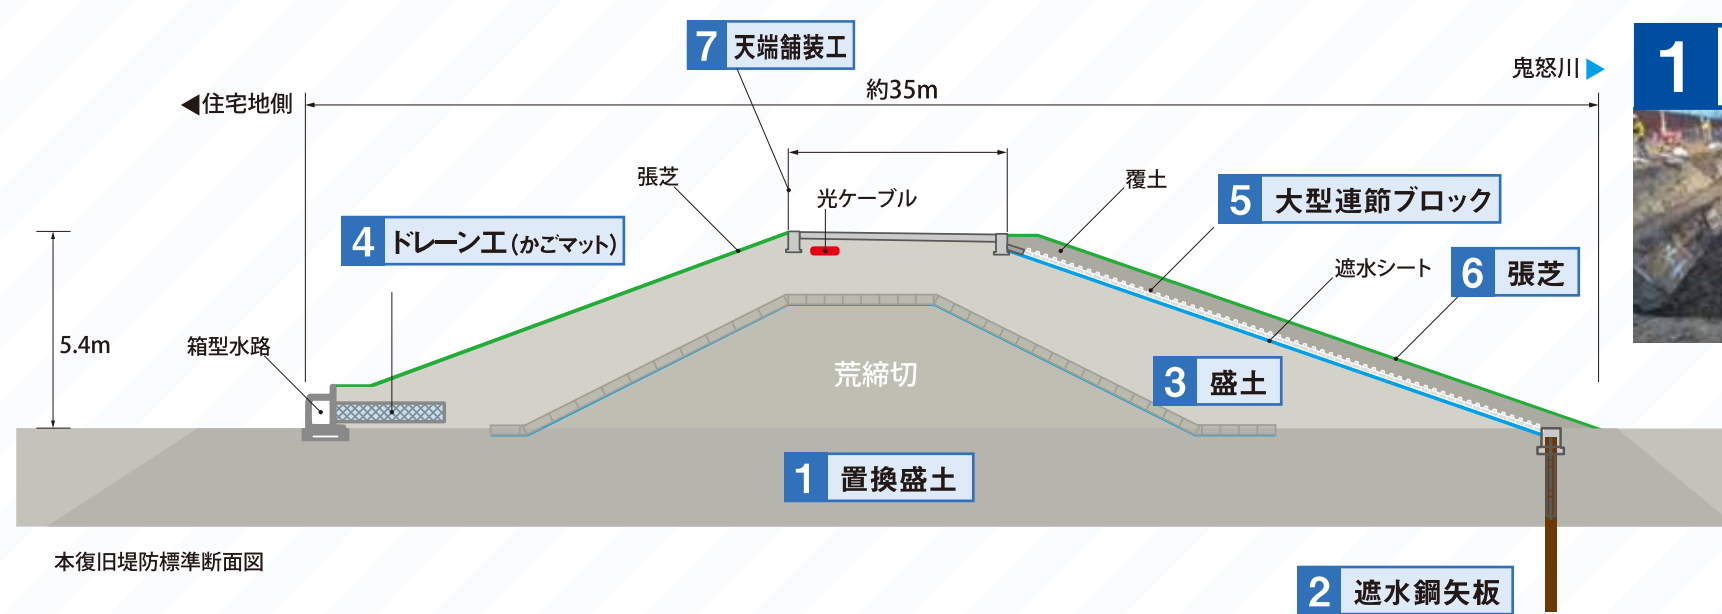

■工事諸元

施工延長 L=100m

- 構造物撤去工(荒締切・二重締切) 一式
- 築堤・護岸
 - 盛土工13,220㎡ 置換盛土9,300㎡
 - 矢板工 鋼矢板147枚(10H型,L=7.5m,9.0m)
 - 法覆護岸工 連節ブロック2,387㎡
 - 植生工 張芝3,560㎡
 - ドレーン工318㎡、階段工一式
- 仮設工 一式

現場に従事した人・施工した会社

■担当技術者 こだわりの技術屋




■現場従事者

中田 慎一 齋賀 雄 井上 誠司
生野 剛史 小橋 賢人 小谷 卓史
佐藤 一樹 長野 耕平 小山 節子

■協力会社

村上工業(株) 青木重機運輸(株) (株)オクノコー
大浦工測(株) 中央木材産業(株) (株)富田商事
中央建鉄(株) 清水インダストリー(株) テイクイ(株)

工事に協力して頂いた三坂地区の方々

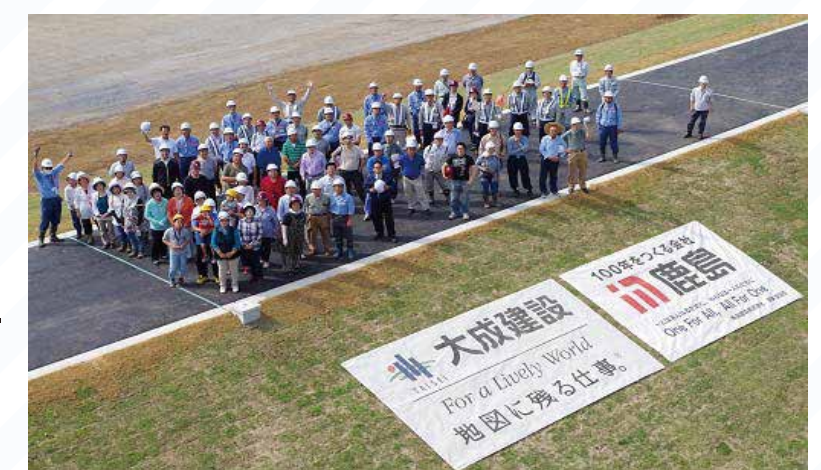

鬼怒川緊急対策プロジェクト

「水防災意識社会」の再構築 を流域・そして全国へ
