



国土交通省 関東地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kanto Regional Development Bureau

平成25年 4月 7日(日)
国土交通省関東地方整備局
荒川下流河川事務所

記者発表資料

4月6～7日低気圧に伴う大雨による管内の被災状況の対応

平成25年4月6日から7日による低気圧に伴う大雨により、荒川下流河川事務所管内において、堤防斜面の土砂が流出する被害が発生しました。現在復旧作業中です。

被害の状況及び対応状況についてお知らせいたします。

なお、今後専門家、学識者等の意見を伺って、原因究明を行い再発防止に努めます。

(平成25年4月7日 11時現在)

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ 埼玉県政記者クラブ 都庁記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所


ほりぐち あきら

副 所 長 堀口 智 (TEL.03-3902-2311)

かすみ やすゆき

工務 課長 霞 安行 (TEL.03-3902-2311)

荒川下流河川事務所管内の被災状況

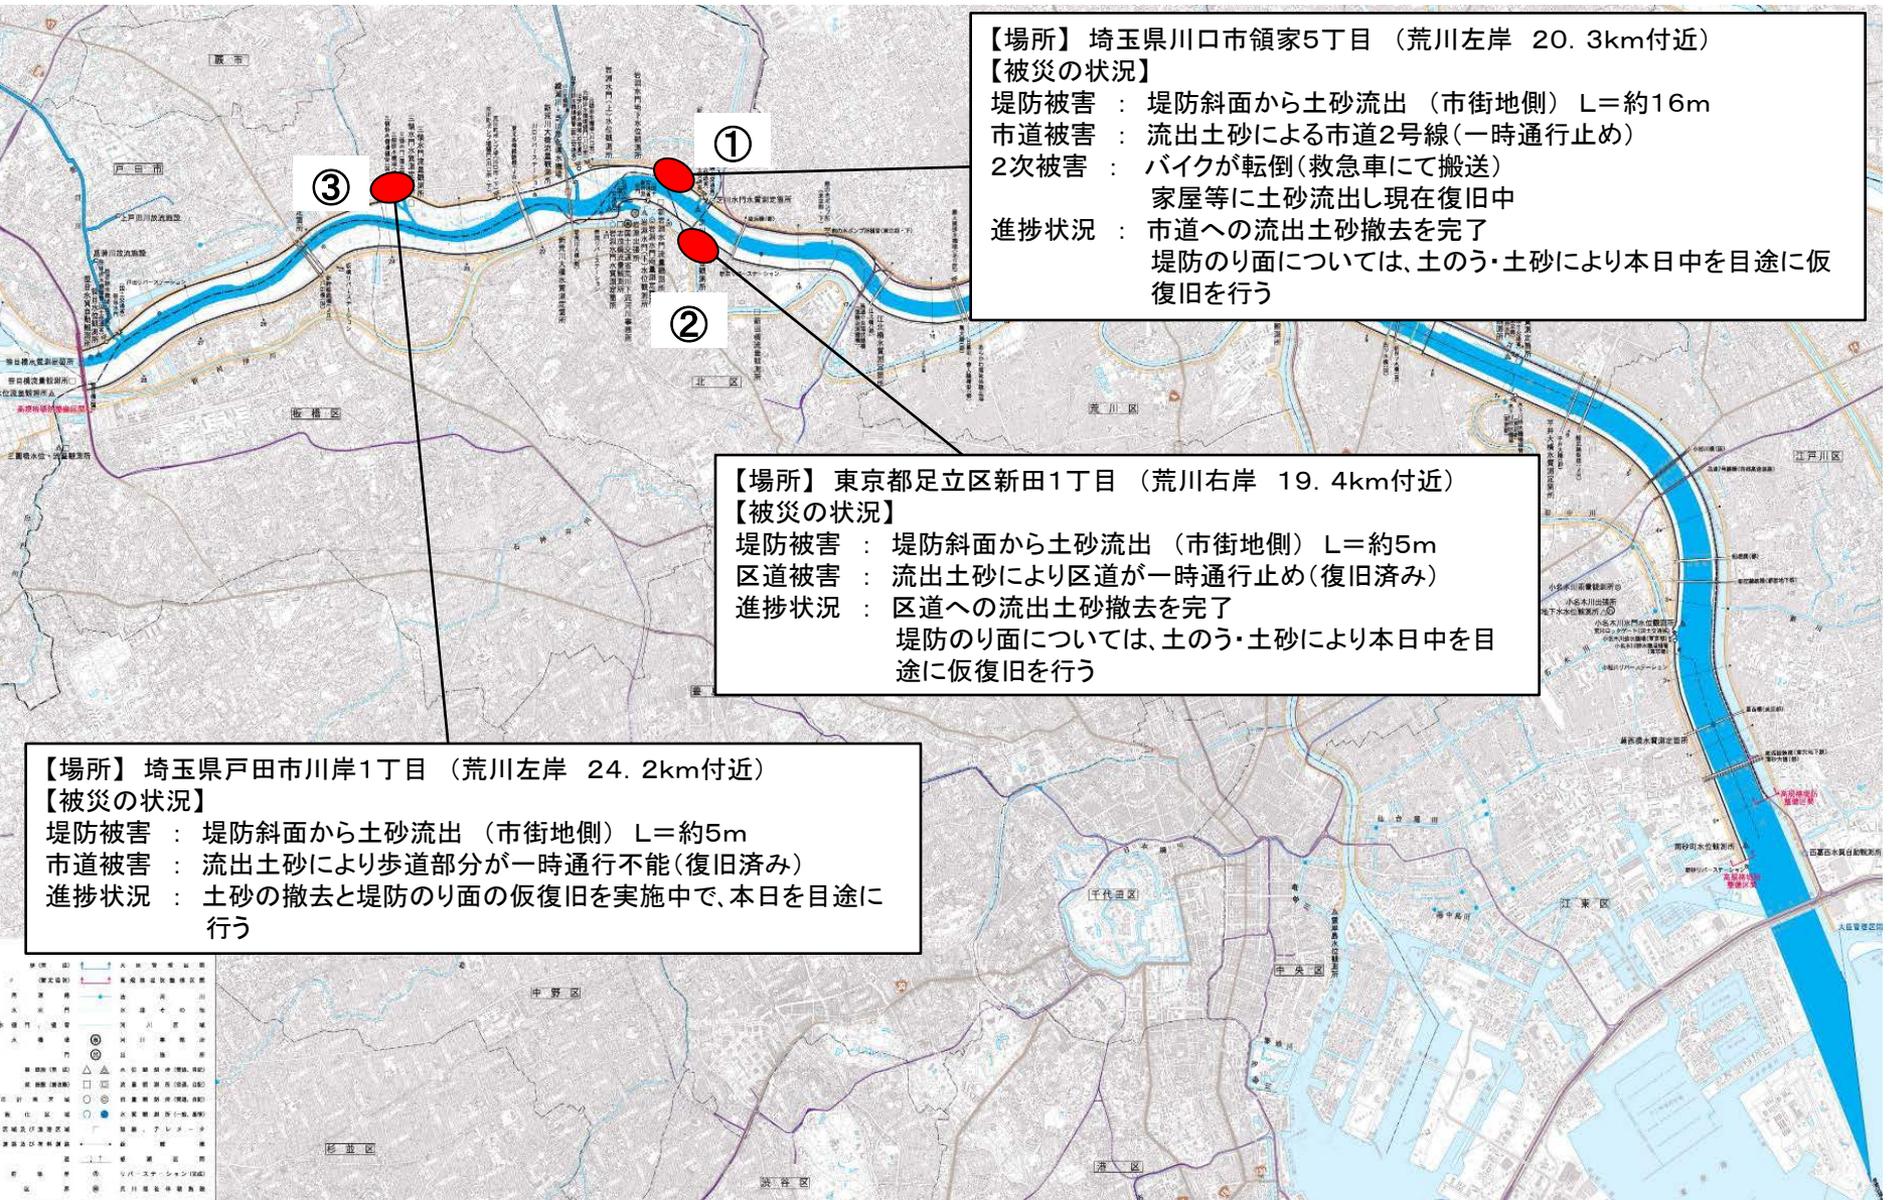

【場所】 埼玉県川口市領家5丁目（荒川左岸 20.3km付近）
【被災の状況】
堤防被害： 堤防斜面から土砂流出（市街地側）L=約16m
市道被害： 流出土砂による市道2号線（一時通行止め）
2次被害： バイクが転倒（救急車で搬送）
家屋等に土砂流出し現在復旧中
進捗状況： 市道への流出土砂撤去を完了
堤防のり面については、土のう・土砂により本日中を目途に仮復旧を行う

【場所】 東京都足立区新田1丁目（荒川右岸 19.4km付近）
【被災の状況】
堤防被害： 堤防斜面から土砂流出（市街地側）L=約5m
区道被害： 流出土砂により区道が一時通行止め（復旧済み）
進捗状況： 区道への流出土砂撤去を完了
堤防のり面については、土のう・土砂により本日中を目途に仮復旧を行う

【場所】 埼玉県戸田市川岸1丁目（荒川左岸 24.2km付近）
【被災の状況】
堤防被害： 堤防斜面から土砂流出（市街地側）L=約5m
市道被害： 流出土砂により歩道部分が一時通行不能（復旧済み）
進捗状況： 土砂の撤去と堤防のり面の仮復旧を実施中で、本日を目途に行う

- 堤防被害
- 市道被害
- △ 2次被害
- ◇ 進捗状況


① 川口市領家5丁目地先



堤防斜面 土砂流出状況
(4月7日10時時点)



土砂撤去状況
(4月7日9時時点)

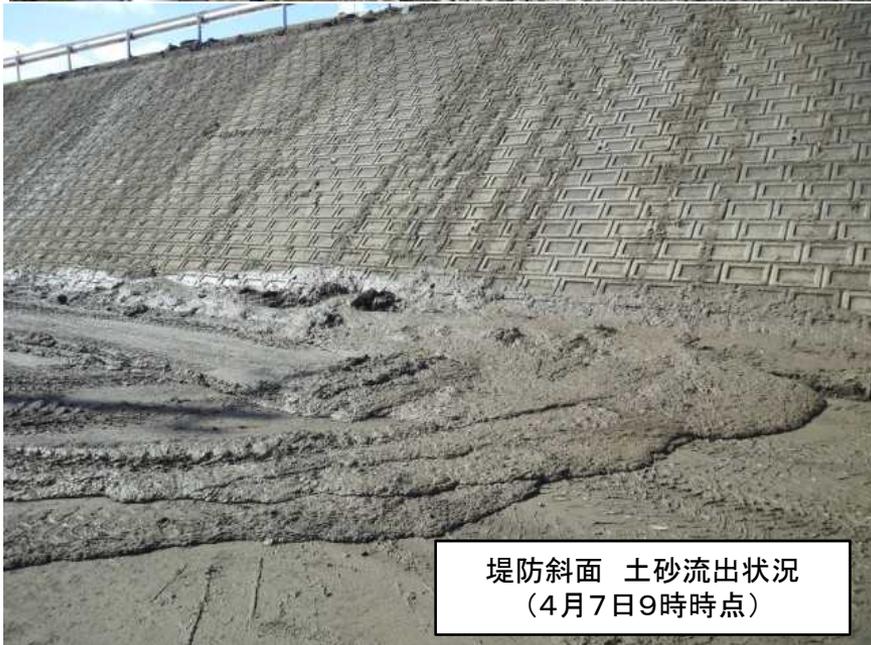

堤防斜面 土砂流出状況
(4月7日9時時点)
