荒川第二・三調節池整備工程（案）

令和8年4月1日時点

整備内容	進捗		工程（案）
第二調節池 （築堤延長＝7.6km：周囲堤含む）	工事	91%	基盤整備工事
		49%	囲ぎょう堤（一部段階効果発現範囲）／囲ぎょう堤、池内水路、越流堤 排水門、第一・二仕切堤
第三調節池 （築堤延長＝5.2km：周囲堤含む）	工事	11%	周囲堤、排水樋管
		0%	基盤整備工事
	用地取得	84%	第二・三仕切堤、囲ぎょう堤、池内水路、排水門、越流堤等
荒川右岸堤防（対岸堤） （築堤延長＝3.2km）	工事	23%	荒川右岸堤防
	用地取得	100%	
JR川越線 荒川橋りょう	工事	-	各種調査・架替位置検討
	用地取得	-	☆基本協定締結　概略設計　詳細設計　JR川越線 荒川橋りょう工事等（架替・旧橋撤去）

工程（案）：事業着手　着工　現時点　一部段階効果　完成予定

平成30年度　令和元年度　令和2年度　令和3年度　令和4年度　令和5年度　令和6年度　令和7年度　令和8年度　令和9年度　令和12年度

環境アセスメント　モニタリング

※1　築堤延長・工程（案）は、現時点での予定であり、今後の調査・検討等により変更が生じる場合があります。

※2　工事進捗は、上記※1における工事契約数量に基づいて算定しています。（現地の施工数量（出来高）の進捗率ではありません。）

※3　用地取得進捗は、面積ベースで算定しています（取得済面積／取得予定面積）。ただし、今後の用地測量等により取得予定面積は変わることがあります。

整備状況図

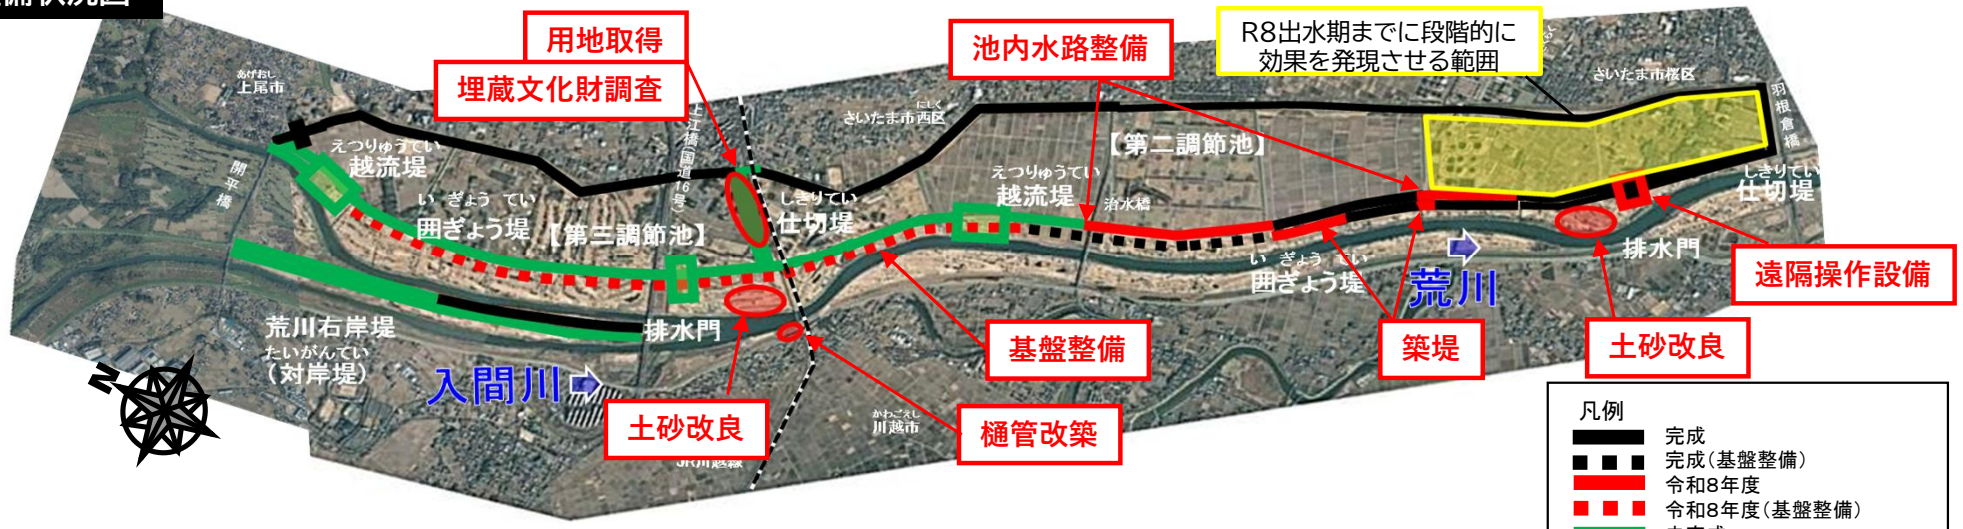

※基盤整備（点線）終了後に築堤等（実線）整備であり、点線施工中・未完成区間には実線は表示していません
