令和2年頃の状況



酒々井町緊急排水　対応経緯【9月28日～10月13日】

国土交通省 関東地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kanto Regional Development Bureau


台風第25号による被災状況



緊急排水　対応後



TEC-FORCEによる緊急排水経過

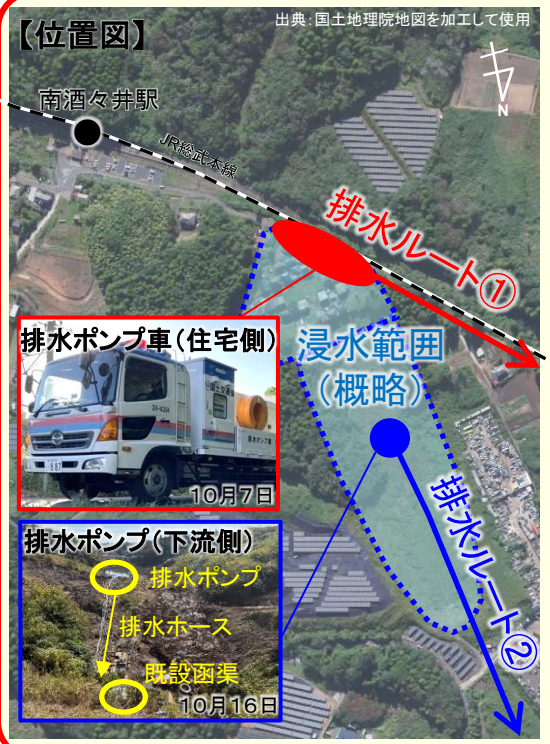

➢住宅側の排水

住宅の浸水被害　※今後の降雨状況により、増減する場合があります。

10/13 14:30時点　住宅地の浸水を解消

最大15戸　→　0戸

（うち、床上浸水11戸、床下浸水　4戸）



10月6日16時



10月12日12時

➢下流側の排水

○ 10月13日に住宅地の浸水が解消し、その後も、町が河道の原形復旧工事に着手できるよう、**河道閉塞によりせき止められた水の排水作業を継続。**

○ その結果、10月21日8時時点で町が実施する河道の**原形復旧工事に支障がない水位までの低下を確認。**



9月24日



10月21日

酒々井町馬橋川河道原形復旧工事　進捗状況【11月4日15時時点】

国土交通省 関東地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kanto Regional Development Bureau

【工事概要】

酒々井町馬橋地区の馬橋川において発生した、崩落土砂による河道閉塞について、千葉県及び酒々井町からの要請に基づき技術的支援を実施しており、排水作業により住宅地の浸水は10月13日に解消し、その後も、河道閉塞によりせき止められた湛水の排水を進め、10月21日に町が実施する河道埋塞土砂撤去工事に支障がない水位まで低下しました。

その後、撤去工事に必要な工事用道路や施工ヤードの整備等（準備工）について工事監督支援を行うとともに、町が実施する調査や復旧工法検討の技術的支援を行ってきました。

このたび、酒々井町は馬橋川の河道埋塞土砂撤去工事に本格着手します。


【施工内容】 場内整備工、既設函渠呑口部補強工などの準備工

【進捗経過】
10月　8日　既設函渠を用いた排水を開始
10月13日　住宅地の浸水解消
10月21日　河道の原形復旧工事に支障がない水位まで低下
11月　4日　工事用道路・施工ヤードの整備等（準備工）完了

※酒々井町が実施する馬橋川に関する工事の監督支援は、千葉県による酒々井町への支援体制が整ったことから千葉県が実施し、関東地方整備局は、引き続き、千葉県及び酒々井町の取組への技術的支援を行います。
※河道の原形復旧工事が完了するまで、排水ポンプは現地に残すとともに、降雨等の際には、町役場に貸与・前進配備した排水ポンプ車も活用し、排水作業を実施します。

■位置図

出典：国土地理院地図を加工して使用

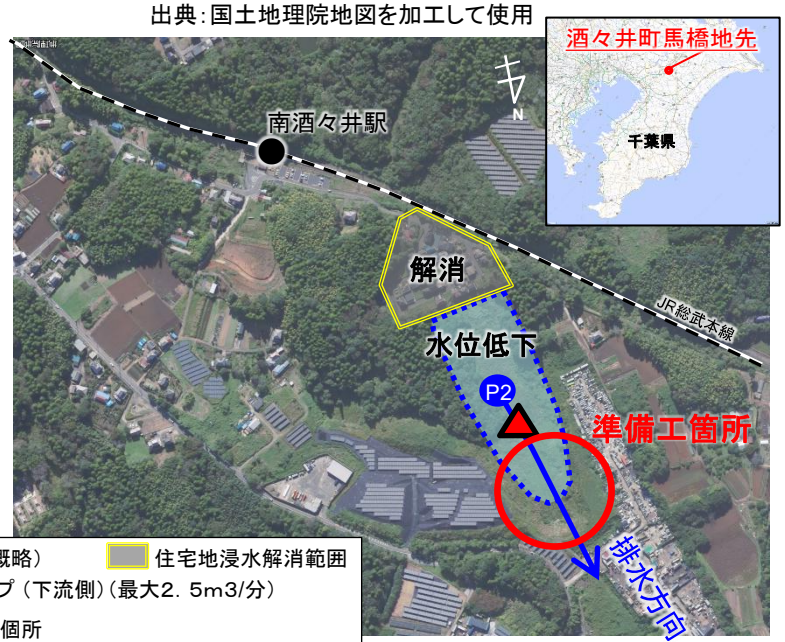

■進捗状況

排　水
（ポンプ設置含む）
→ ポンプ設置後、順次排水開始
10/21
水位低下を確認

場内整備工

既設函渠呑口部
補強工
→ 11/4
河道埋塞土砂撤去工事※へ
移行

袋型根固め（製作）
進捗率約100%

袋型根固め（据付）
進捗率約100%
（60袋／60袋）

※千葉県による工事監督支援

■施工状況



施工箇所全景
10月16日撮影



場内整備状況（呑口部周辺の補強工）
11月4日撮影
