# さがみ縦貫道路（西久保JCT～相模原IC区間）の事業進捗についてのお知らせ

○さがみ縦貫道路（圏央道）は、「目標宣言プロジェクト」として開通目標年次とその達成条件を公表し、徹底した進捗管理のもとで事業を進めてきています。

○平成１９年８月末現在、用地については約９５％の取得を完了しており、工事についても約７４％の区間で着手しています。

・西久保ＪＣＴ（新湘南バイパス）～海老名北ＪＣＴ（東名高速）は、平成６年度に用地取得に着手し、現在、大部分の用地取得を完了（用地取得完了まで後２９件）し、用地取得率は約９４％（面積ベース）となっております。
しかしながら、平成１６年度末に概ね９割の用地を取得した後の用地取得は、伸び悩んでおり、一部の工事に着手できない状況です。
今後は、出来るだけ速やかに用地取得を完了すべく、任意での取得交渉と並行して、**土地収用法の適用も視野に入れ事業認定手続きの準備を進めてまいります。**

・海老名北ＪＣＴ～海老名北ＩＣは、既に土地収用法に基づき手続きを進めており、神奈川県収用委員会に対して事業者(中日本高速道路)より事業用地取得に係る裁決申請（対象７件）を行い、平成１９年２月までに、神奈川県収用委員会において全ての審理が終了され（結審）、9月２０日に３件の裁決が下り、現在は残り４件について裁決の準備がなされているところです。

・海老名北IC～相模原ICは、約９６％の用地取得を完了し、継続して任意での取得交渉を進めているところです。

○今後も、引き続き平成２１年度（海老名北JCT～海老名北IC）及び平成２２年度（西久保JCT～海老名北JCT、海老名北IC～相模原IC）の開通目標の達成に向けて事業を推進してまいります。

平成１９年１０月４日
国土交通省　関東地方整備局　横浜国道事務所
中日本高速道路株式会社　横浜支社　厚木工事事務所

| 発　表　記　者　ク　ラ　ブ | | |
|---|---|---|
| 竹芝記者クラブ、 | 神奈川建設記者会、 | 横浜海事記者クラブ |
| 神奈川県政記者クラブ、 | 横浜市政記者会、 | 横浜ラジオ・テレビ記者会 |


| 問　合　せ　先 | | |
|---|---|---|
| 国土交通省　関東地方整備局　横浜国道事務所　０４５－３１１－２９８１（代表） | | |
| 計画課長 | 土肥（どひ）　学（まなぶ） | 内線　３０１ |
| 調査課長 | 近藤（こんどう）　進（すすむ） | 内線　４６１ |
| 中日本高速道路株式会社　横浜支社　厚木工事事務所　０４６－２２３－８７２１（代表） | | |
| 工務課長 | 今井（いまい）　智満（ともみつ） | |

道路見える化計画
課題が見える・やり方が変わる

# さがみ縦貫道路（西久保ＪＣＴ～相模原ＩＣ区間）用地取得状況

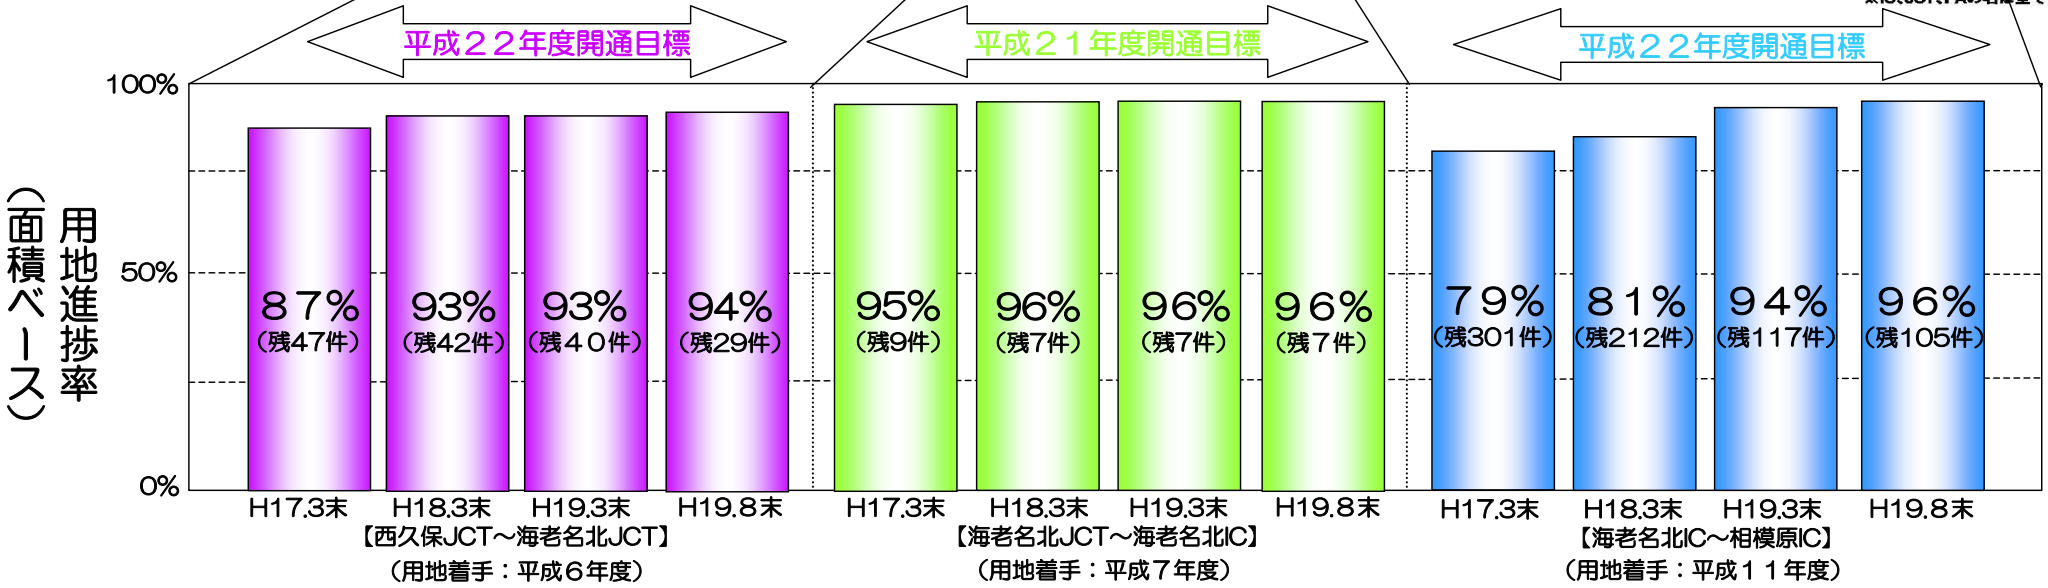
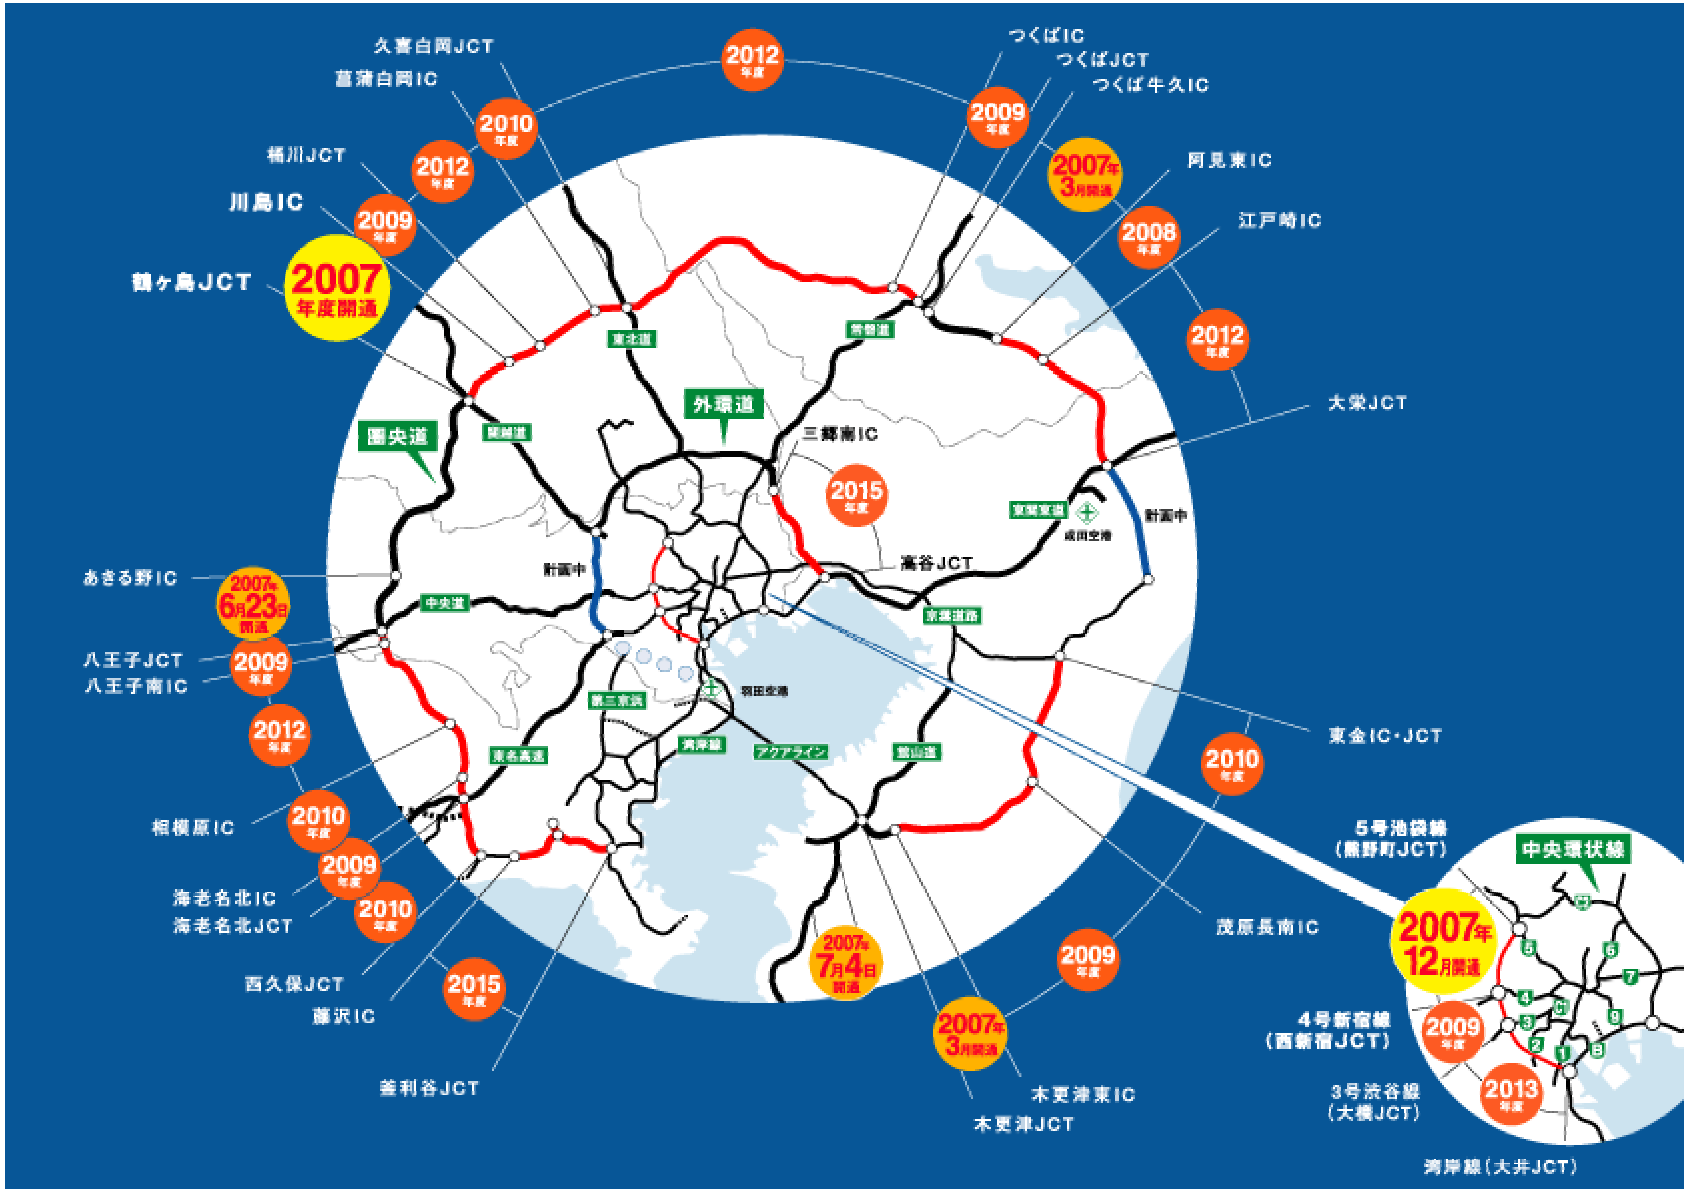
# 一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車道　開通目標年次
