平成１９年９月２３日１８時

台風９号で被災した西湘バイパスの復旧状況
【９月２３日１８時現在】

記者発表資料

西湘バイパスでは、平成１９年９月６日から７日にかけての台風９号の影響によって大きな被害が発生し、下記の区間で通行止めとなっています。

通行止め区間：【上り線】西湘バイパス　大磯西ＩＣ～西湘二宮ＩＣ
【下り線】西湘バイパス　大磯西ＩＣ～国府津ＩＣ

※【上り線】西湘バイパス　西湘二宮ＩＣ～橘ＩＣは９月１５日１１時に開通しました。

現在、上り車線を用いた対面通行の確保に向け、応急復旧工事を進めています。

９月２３日の作業実施内容　※復旧状況写真は別紙資料

国土交通省管理区間

・シートパイルと道路（上り車線）との空隙を充填する作業を進めています。
・区画線工の作業を進めています。
・保安施設工（ポストコーン設置他）の作業に着手しました。

中日本高速道路株式会社管理区間

・ 波浪により浸食された部分の仮設消波堤を施工しています。
・ シートパイルを補強するため、アンカー工を実施しています。

９月２４日以降の作業予定内容

国土交通省管理区間

・シートパイルと道路（上り車線）との空隙を充填する作業を引き続き進めます。
・暫定開通に向けて区画線工及び保安施設工の作業を引き続き進めます。

中日本高速道路株式会社管理区間

・波浪により浸食された部分の仮設消波堤の施工を引き続き実施します。
・シートパイル補強のためのアンカー工を引き続き実施します。

今後、台風や天候不良などの影響がなければ、平成１９年９月末までに応急復旧を完了し、上り車線を用いた対面通行での開通を目指します。

通行止めの影響で、国道１号(大磯･二宮地区)では渋滞が発生しています。東京･千葉･横浜方面と静岡方面の間を移動するときは、小田原厚木道路や東名高速道路、国道２４６号への迂回をお願いします。

なお、当面の間、小田原厚木道路の通行料金は全線無料です。

※ ＿＿＿は前日から変更があった箇所です

復旧の見込みなどの情報は、記者発表や道路情報板などで随時提供しており、ホームページ（横浜国道事務所http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/、中日本高速道路㈱http://www.c-nexco.co.jp/）での情報提供も行っています。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

平成１９年９月２３日
国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所
中日本高速道路株式会社 横浜支社

記者発表クラブ
竹芝記者クラブ、横浜海事記者クラブ、神奈川建設記者会、神奈川県政記者クラブ

問い合わせ先

関東地方整備局横浜国道事務所
計画課　課長　土肥（どひ）　学（まなぶ）　電話 045-311-2981（内線301）
中日本高速道路株式会社横浜支社
広報・ＣＳチーム　電話 045-475-9207

《別紙資料》

西湘バイパス　復旧状況写真

国土交通省管理区間

西湘二宮ICから大磯西IC方面を望む
２３日１４時撮影

空隙充填箇所でのコンクリート打設の状況
２３日１４時撮影

区画線工の状況
２３日１４時撮影

国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所

中日本高速道路㈱管理区間

西湘二宮ICから橘IC方面を望む
２３日１４時撮影

仮設消波堤の施工状況
２３日１４時撮影

シートパイルアンカー工施工状況
２３日１４時撮影

中日本高速道路株式会社横浜支社

台風9号による西湘バイパス通行止めに伴う広域迂回のお願いについて
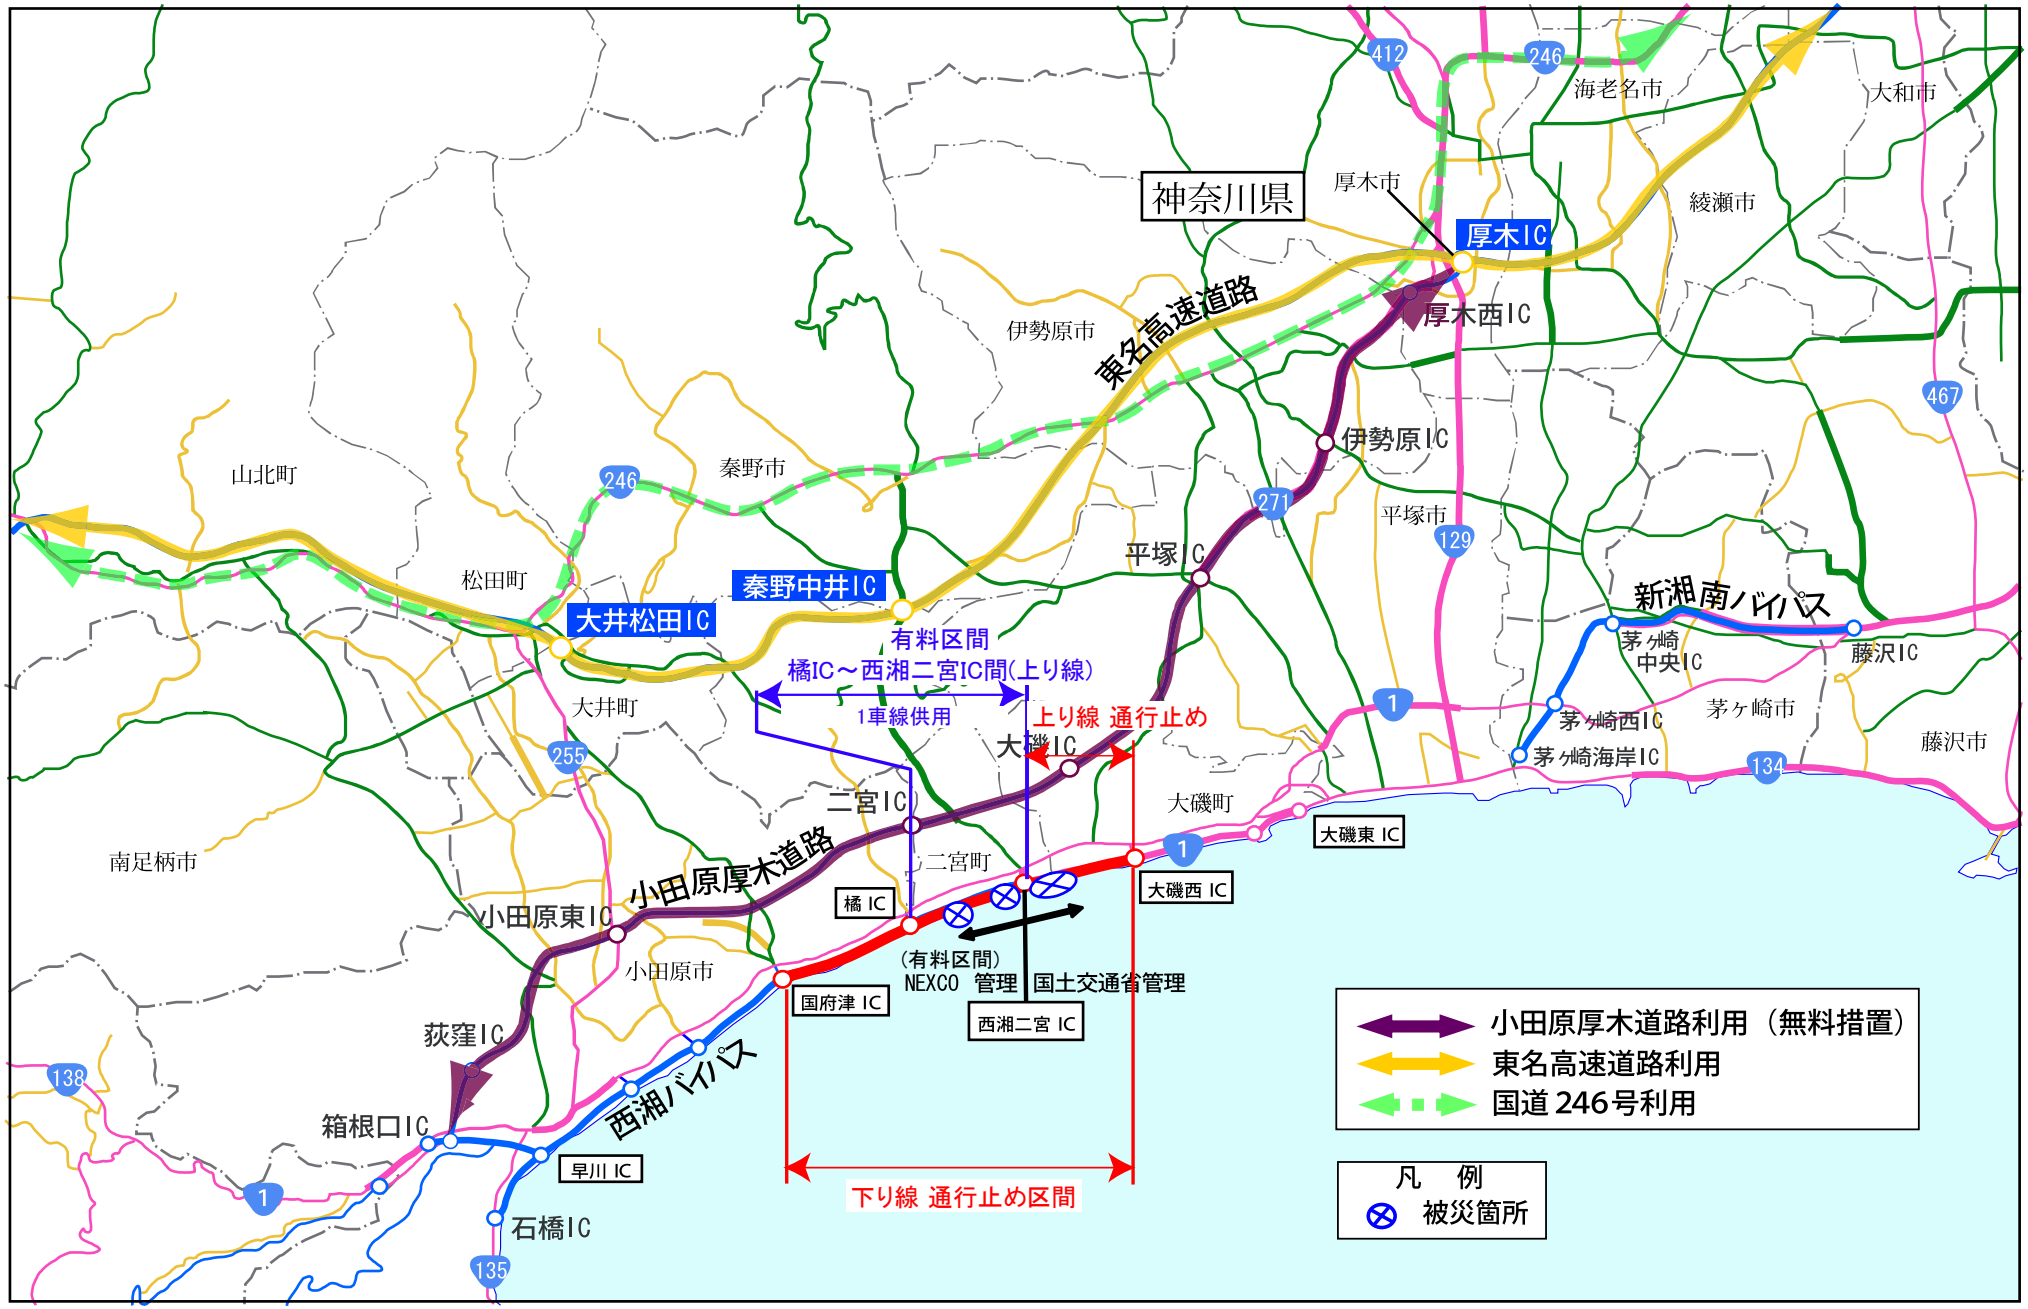
西湘バイパスの通行止めの影響により、国道1号（大磯・二宮地区）で渋滞が発生しています。東京・千葉・横浜方面と静岡方面の間での移動については、小田原厚木道路や東名高速道路、国道246号へ迂回していただきますようお願いします。
なお、迂回路として利用していただけるように、**当面の間、小田原厚木道路の通行料金を全線無料とします。**
