

中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



はらとがわばし ①原戸川橋

2016年10月



2017年9月

橋長：59.5m



かぞねだいよん ②楮根第四トンネル

2016年1月

延長：1,852m



2017年9月

2017年9月末現在 掘削延長 1,622m



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



ふじかわおおはし ③富士川大橋

2014年1月



2015年10月



2017年7月



橋長：994.5m

- 下部工：2015年3月完成
- 上部工：A1～P9間架設完了
(P9～A2間はJR委託 架設中)

中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)難工事の状況



国土交通省施工区間 L=28km



つばきがわばし

④ 椿川橋

2014年3月



2017年4月



2017年9月



橋長：387.0m



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



いりのさわがわばし ⑤入ノ沢川橋

2016年12月




2016年10月



2017年9月

橋長：259.0m

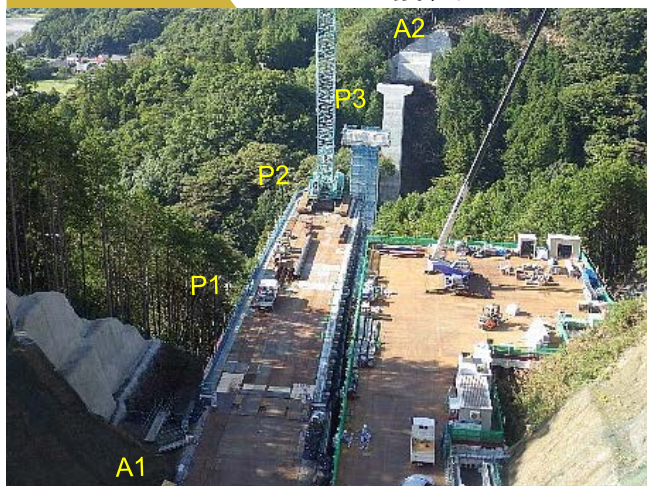

2017年9月

橋長：261.0m



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



しもべおんせんはやかわ

⑦ 下部温泉早川IC

2016年2月



2017年9月



てんじんさわがわばし

⑧ 天神沢川橋

2017年3月



2017年9月

橋長：26.0m



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)難工事の状況



国土交通省施工区間 L=28km



いっしき ⑨ 一色トンネル

2016年4月

延長：1,275m



2017年9月



しろやま ⑩ 城山TN起点側改良

2016年7月



2017年9月



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



⑪ しろやま 城山トンネル

2014年7月

延長：2,087m



2017年8月



2017年9月末現在 掘削延長 1,958m

⑫ ろくごう 六郷IC

2015年10月



2017年4月



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況




想定以上に脆い地盤による掘削面の崩落、トンネル掘削後の断面の変形

■掘削面の崩落(楮根第3トンネル)^{かぞね}




■地盤の膨張によりトンネル断面が圧縮され、掘削後の断面に変形が生じ、下面に亀裂が発生(城山トンネル)^{しろやま}

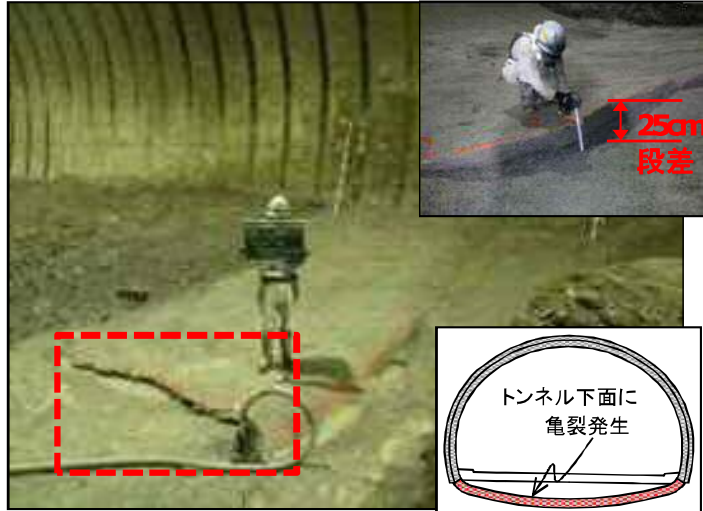

トンネル掘削中の湧水の発生

■トンネル坑内の冠水の状況(上八木沢トンネル)^{かみやぎさわ}

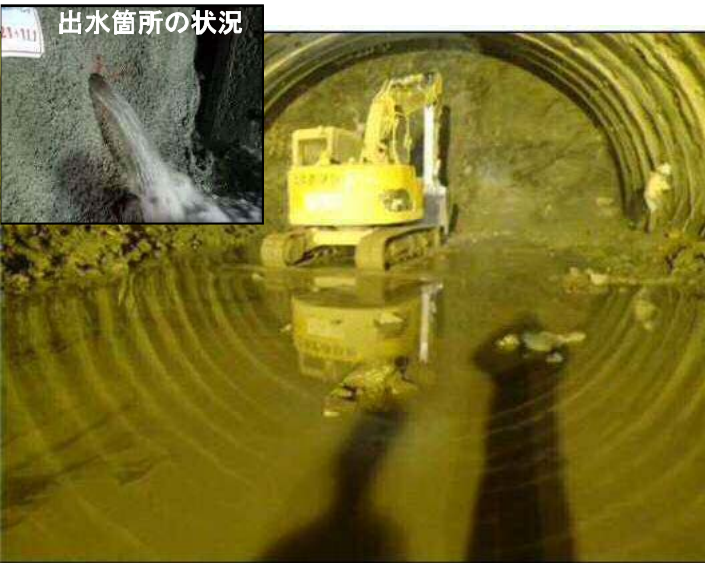

■トンネル坑内の冠水の状況(楮根第4トンネル)^{かぞね}

