

唐子地区堤防整備に関する説明会 (国管理区間)

令和6年6月9日

荒川上流河川事務所




目 次

1. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの
進捗状況について・・・・・・・・・・ P 2
2. 唐子地区の整備について・・・・・・・・ P 8
3. 用地取得について・・・・・・・・・・ P 1 3
4. 今後のスケジュールについて・・・・ P 1 4

1. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について(R6.5末時点)

唐子地区説明会
R 6. 6. 9

- 令和元年東日本台風と同規模の洪水に対して、再度災害を防ぐことを目標に、令和7年度までに河道掘削、堤防整備等を実施し、遊水地整備を進めていきます。
- 減災に向けた更なる取組として、関係機関等が連携し、円滑な水防・避難行動のための体制等の充実を図ります。

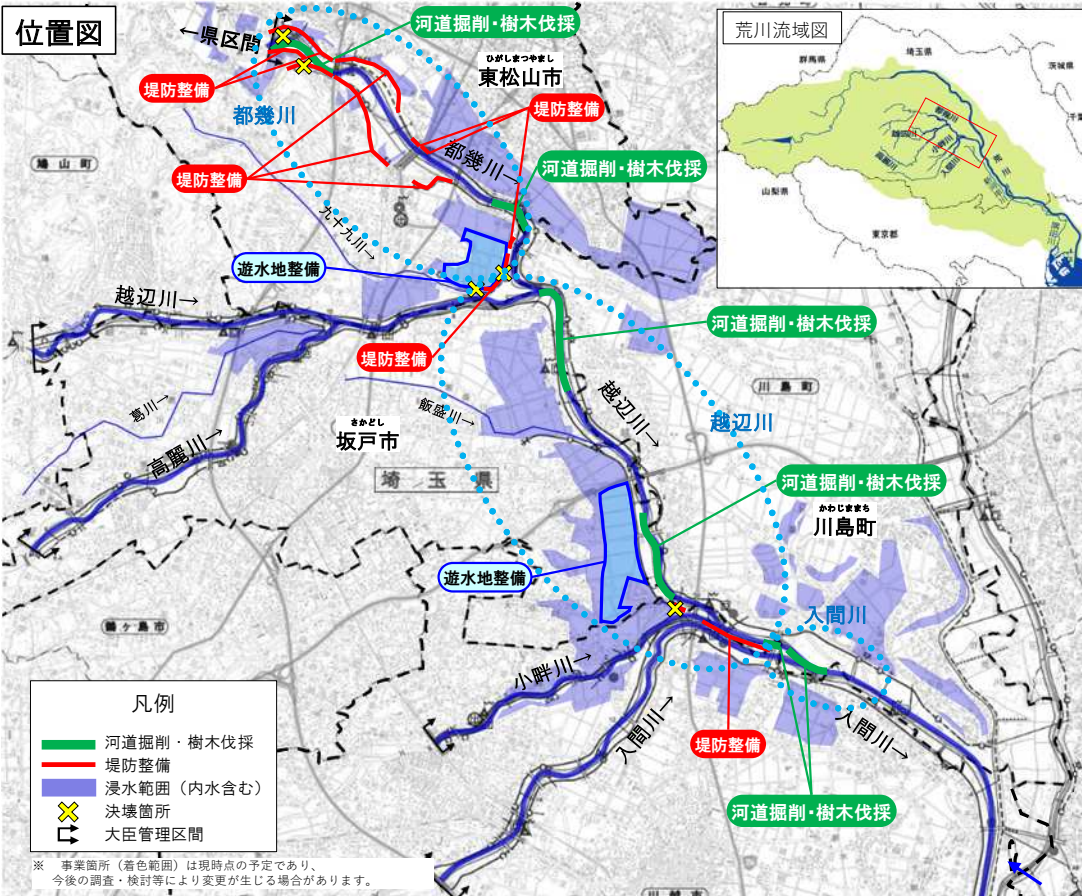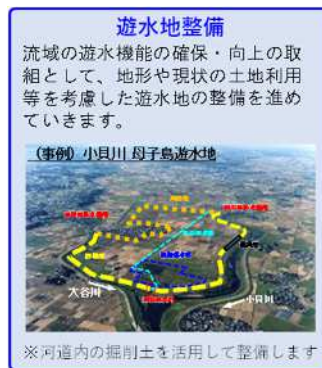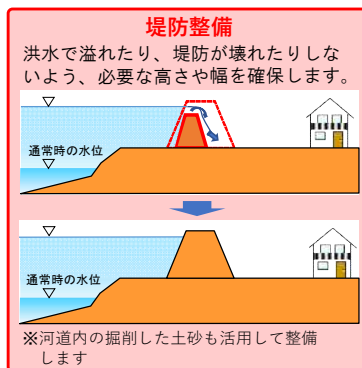

【整備手順の考え方と進捗状況】

河道掘削は上下流バランスを踏まえ、下流入間川区間から実施し、全体的な水位低下を図ります。並行して都幾川区間では堤防整備を優先的に進め、安全に流せる洪水の量を増加させます。

		進捗	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度以降
入間川	河道掘削・樹木伐採 約67万m ³	100.0%		測量	施工					プロジェクト目標達成
	用地取得	100.0%		用地調査・用地取得	(河道掘削)					
越辺川	河道掘削・樹木伐採 約60万m ³	44.5%		測量	施工					
	堤防整備 約13万m ³	100.0%		施工						
	遊水地整備		検討	測量				施工		
	用地取得	96.9% 0%		用地調査・用地取得(河道掘削)	用地調査・用地取得(遊水地)					
都幾川	河道掘削・樹木伐採 約12万m ³	48.1%		測量	施工					
	堤防整備 約54万m ³	43.7%		測量	施工					
	遊水地整備		検討	測量				施工		
	用地取得	94.9% 4.3%		用地調査・用地取得(河道掘削・築堤)	用地調査・用地取得(遊水地)					

※ 数量・スケジュールは現時点での予定であり、今後の調査・検討等により変更が生じる場合があります。
※ 上記の対策の他、河川管理上必要な対策を行う場合があります。
※ 国管理区間のみの進捗状況を示しています。

東松山市葛袋地先 (都幾川左岸 6.0k付近)



簡易型河川監視カメラ・越水センサー設置状況



1. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について

主要な地区を
掲載


唐子地区説明会
R 6. 6. 9

堤防整備

都幾川左岸 石橋地区



堤防整備イメージ



1. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について


主要な地区を
掲載

唐子地区説明会
R 6. 6. 9

堤防整備

都幾川左岸 高畑樋管


整備前 (R3.9)

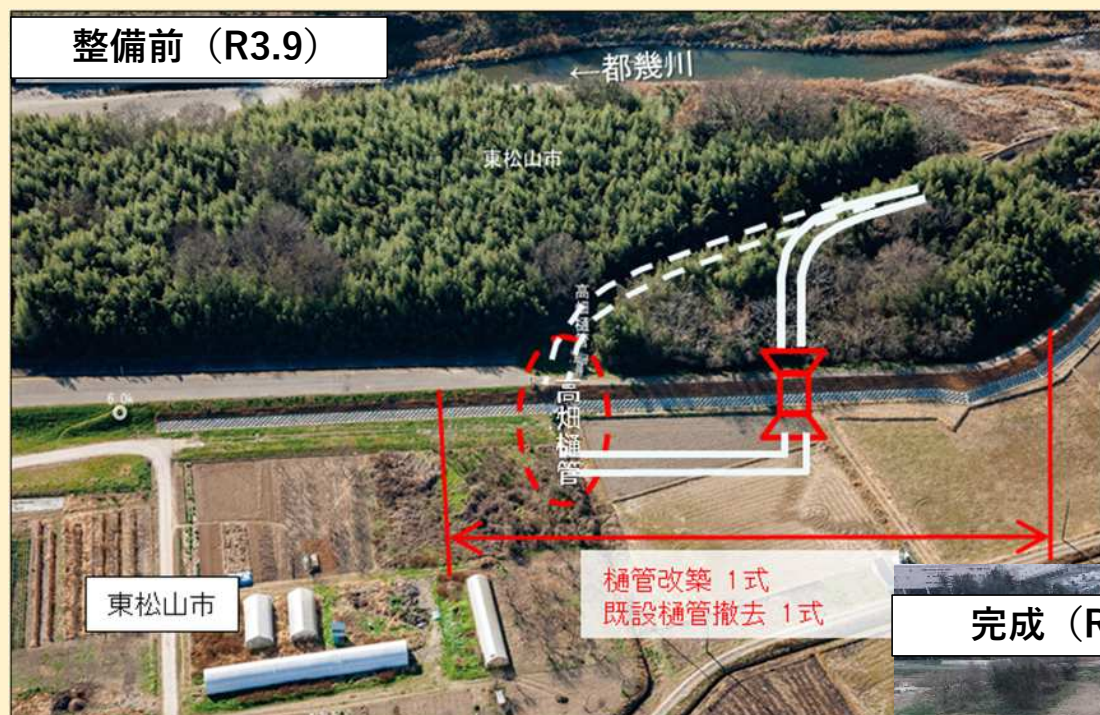

完成 (R6.3)



堤防整備イメージ

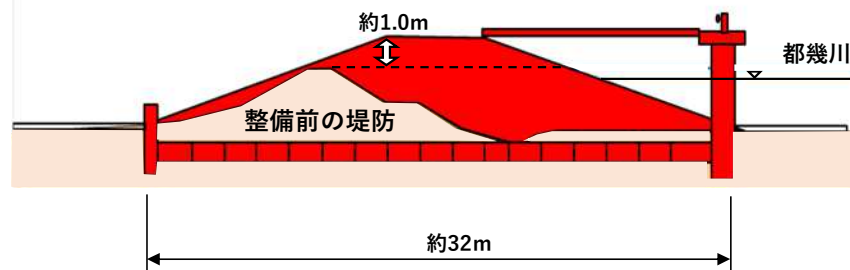

1. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について

主要な地区を
掲載

唐子地区説明会
R 6 . 6 . 9

堤防整備

河道掘削

都幾川右岸 葛袋地区


整備前 (R5.5)



現在 (R6.5)



堤防整備・河道掘削イメージ

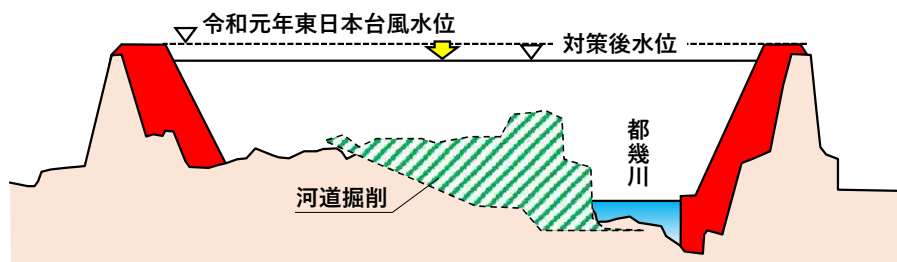

1. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について

主要な地区を
掲載

唐子地区説明会
R 6 . 6 . 9


堤防整備

都幾川左岸 下青鳥地区

整備前 (R4.10)



堤防整備イメージ



完成 (R6.3)



1. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について

主要な地区を
掲載

唐子地区説明会
R 6. 6. 9

河道掘削

越辺川右岸 赤尾地区




掘削前 (R5.4)



完成 (R6.3)



河道掘削イメージ

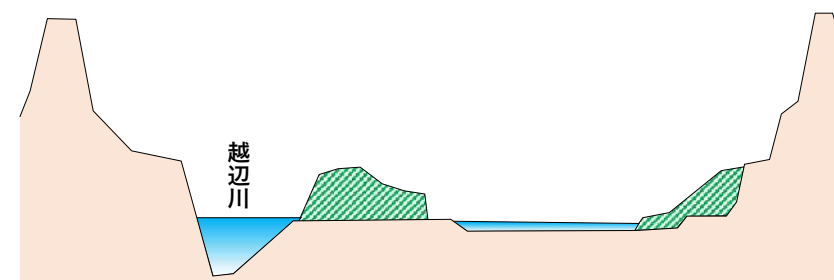

河道掘削・樹木伐採により、断面を確保し流れやすくすることで、洪水時の川の水位を低くします。

2. 唐子地区の整備について

唐子地区説明会
R 6. 6. 9

■都幾川上流部における堤防整備、河道掘削・樹木伐採につきまして、下記の位置で計画しております。

早期施行のため、堤防整備にあたっては現在の堤防を極力活用し、川幅が狭い一部を除き、川側に拡幅します。

また、洪水を安全に流下させるため、川幅を広くとる等により、家屋の浸水被害を軽減させつつ貯留機能を保全（霞堤含む）します。

■令和7年までの事業完成に向け、工事が本格化します。工事には細心の注意を払い施工いたしますが、工事車両の通行などで地域の皆様へご迷惑をおかけする場合もございます。何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※R6.6.9時点版であり、今後の検討により変更となる可能性があります



都幾川上流部（国管理区間）スケジュール

■被災した堤防の整備予定		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
決壊・被災箇所の堤防整備		完了	堤防復旧(葛袋、石橋)R2.8完了					
■多重防御治水の推進(事業別)		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
河道掘削 樹木伐採	都幾川				測量・用地取得			施工
	東松山 葛袋地先							
	新東松山橋～都幾川橋 東松山市あずま町～ 葛袋地先			測量・用地取得				施工
	都幾川橋より上流 東松山市葛袋、石橋、 下唐子地先			測量・用地取得				施工
堤防整備	都幾川							
	構造物周辺 (用排水樋管、早俣橋、 東松山橋、東上線、 唐子橋、都幾川橋)			測量・用地取得(堤防整備と重複)				施工

※樋管や橋梁等の構造物周辺部については関係機関協議などが必要

※ スケジュールは現時点での予定であり、今後の調査・検討等により変更が生じる場合があります。また、地先名は主な地先を記載しています。


※ 上記の対策の他、河川管理上必要な対策を行う場合もあります。

実施内容

堤防整備：洪水で溢れたり、堤防が壊れないよう必要な高さ・幅を確保します。

河道掘削・樹木伐採：流れやすくすることで、洪水時の川の水位を低くします。

整備イメージ図



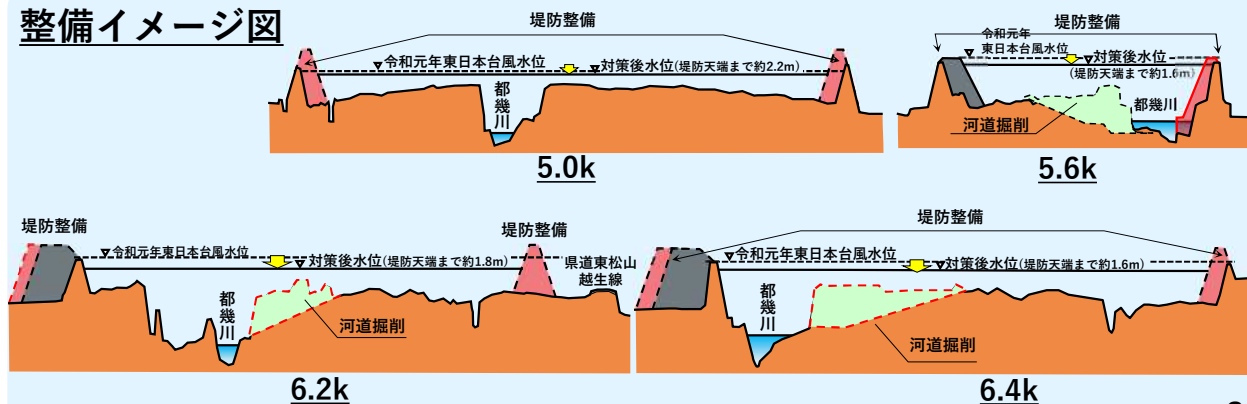


※現地の調査や測量結果によっては、記載している内容に変更が生じる場合があります

2. 唐子地区の整備について

唐子地区説明会
R 6. 6. 9

都幾川の堤防等の整備について（都幾川橋上流）

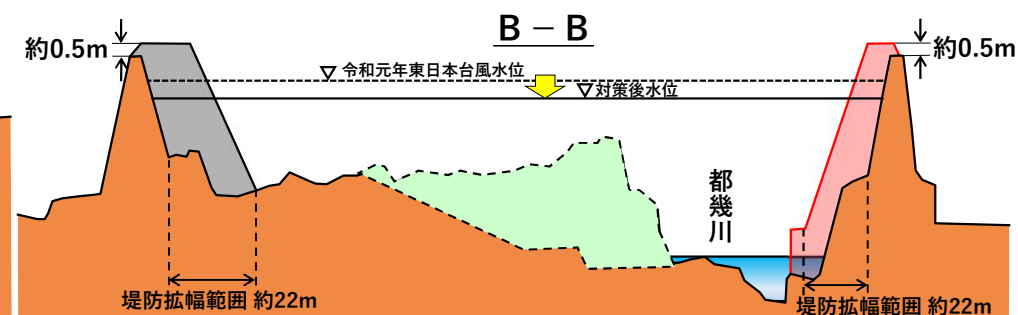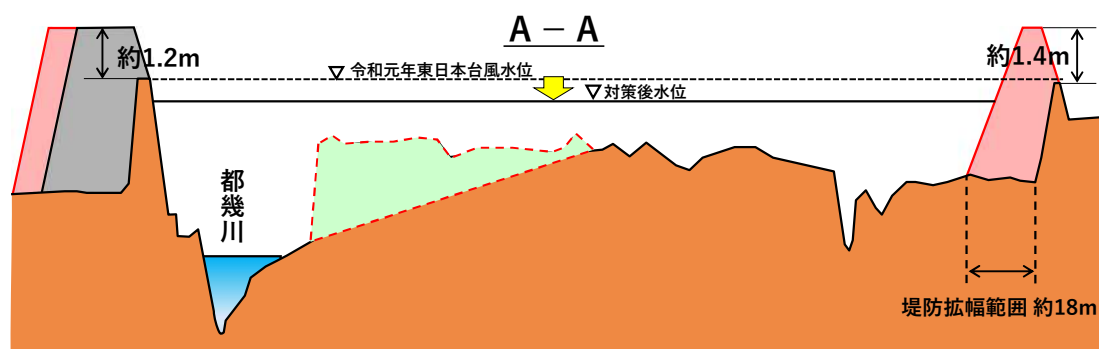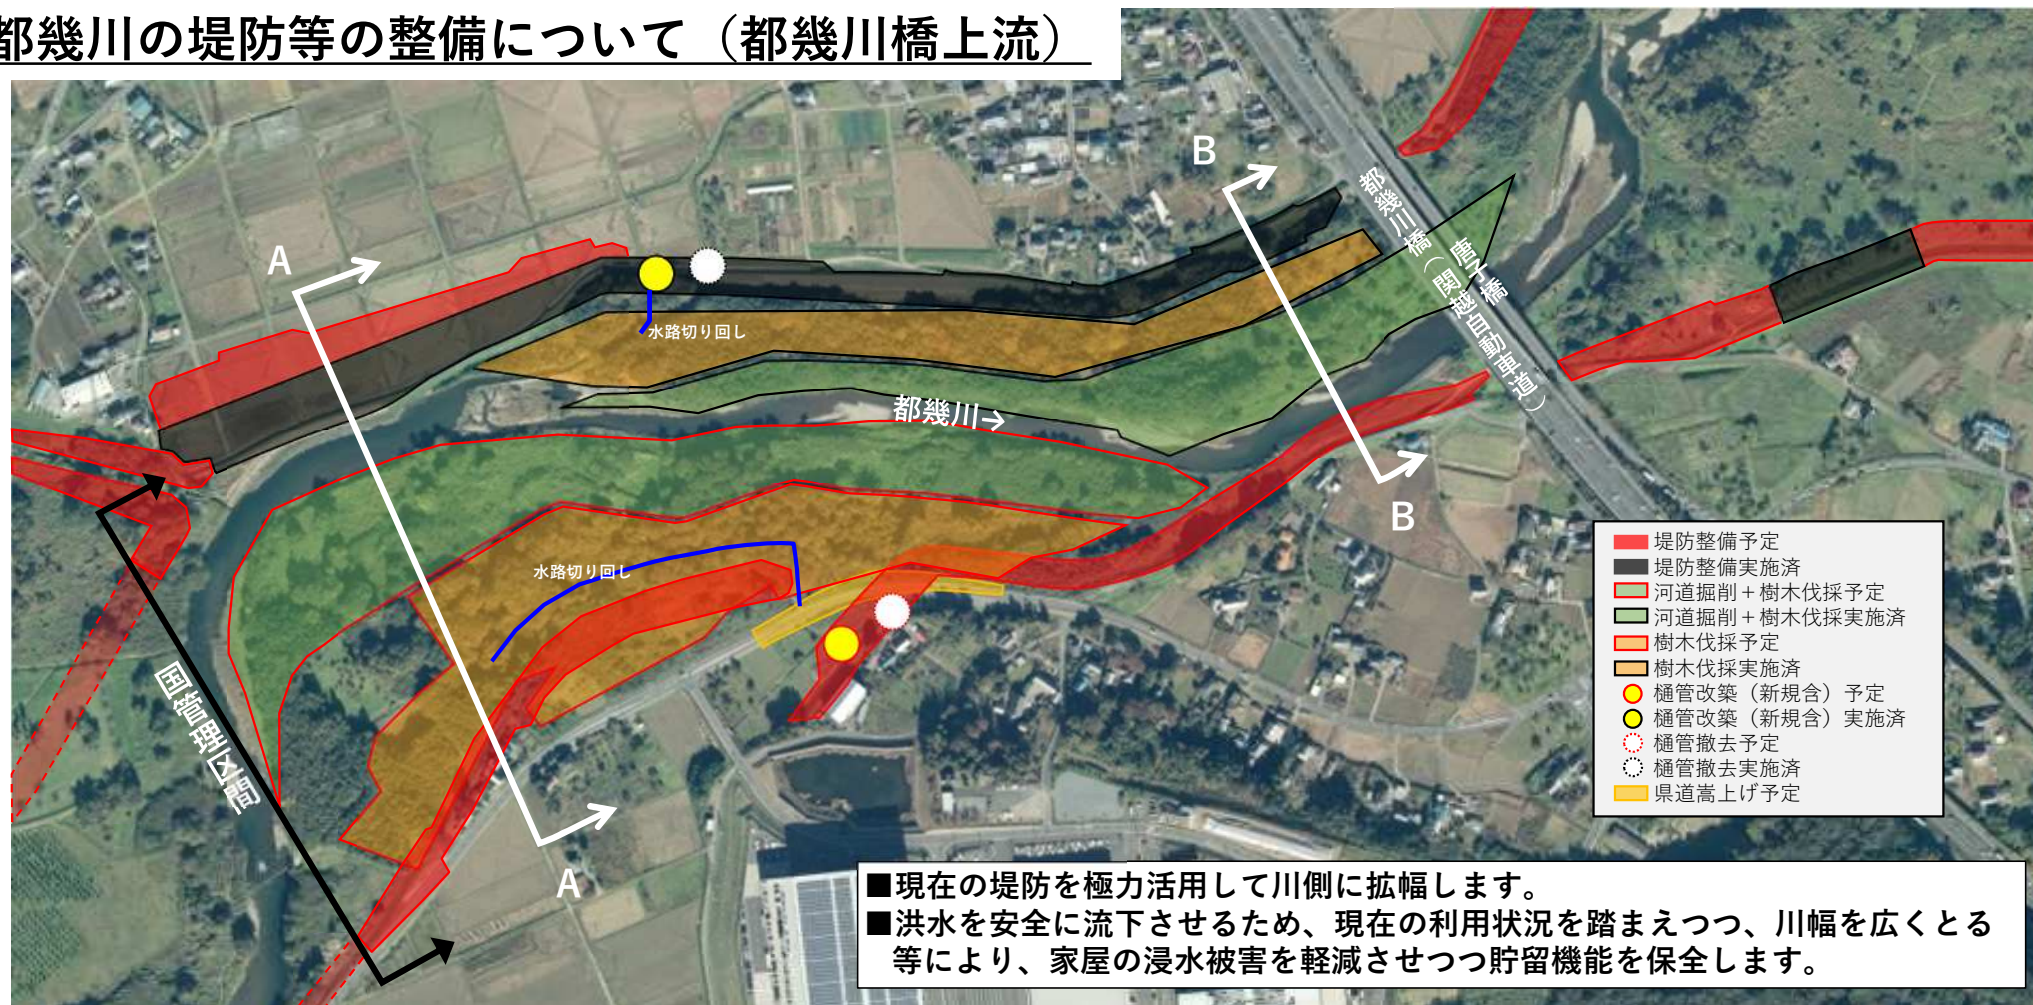


※ R 6. 6. 9 時点版であり、今後の検討により変更となる可能性があります
標準的な堤防の断面であり、地形状況（地盤高）により堤防（盛土）の高さや幅は異なります

2. 唐子地区の整備について

唐子地区説明会
R 6. 6. 9

堤防整備の計画（右岸：下唐子、葛袋地区）

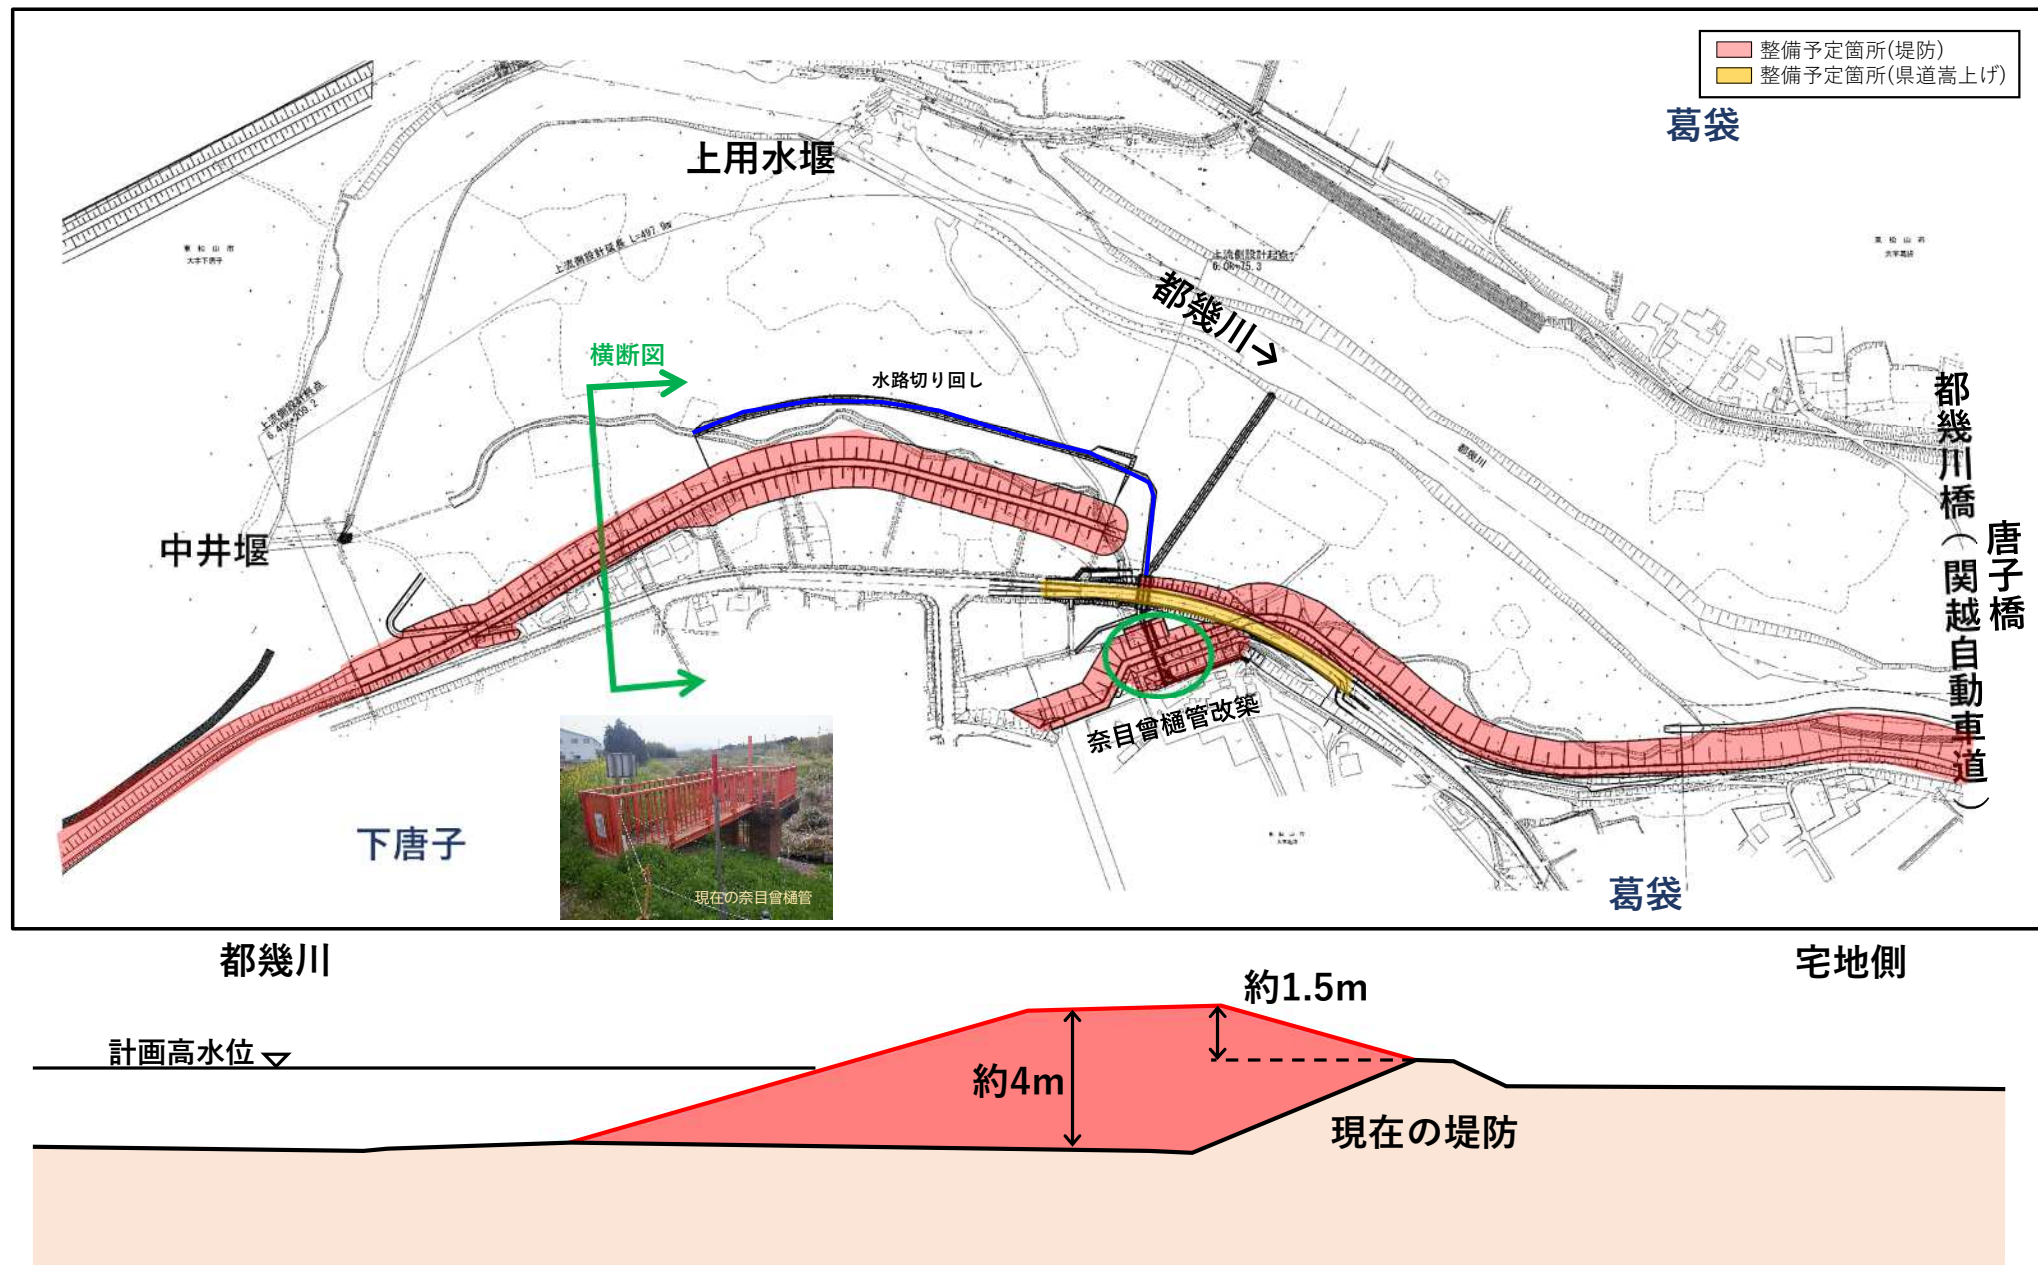



※ R 6. 6. 9 時点版であり、今後の検討により変更となる可能性があります
標準的な堤防の断面であり、地形状況（地盤高）により堤防（盛土）の高さや幅は異なります

2. 唐子地区の整備について

唐子地区説明会
R 6. 6. 9

堤防整備の計画（右岸：下唐子、葛袋地区）


工事による通行止め（令和6年7月1日～令和7年6月20日）

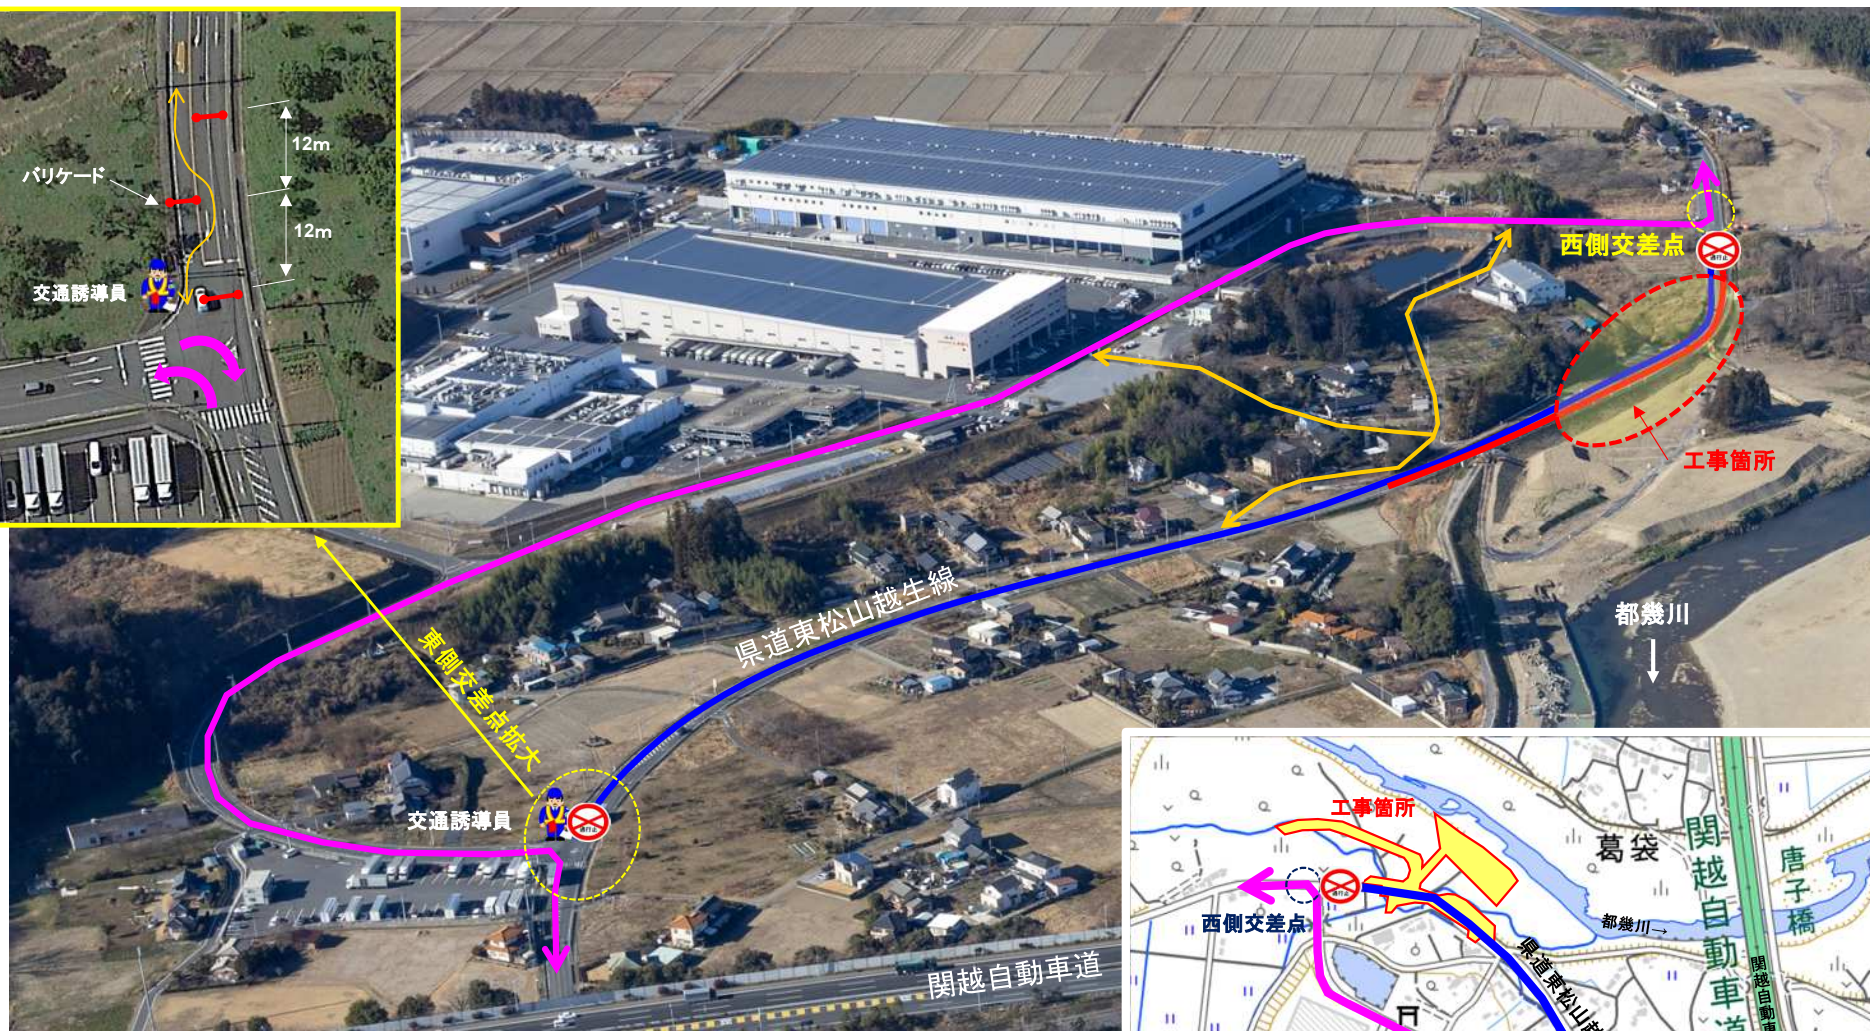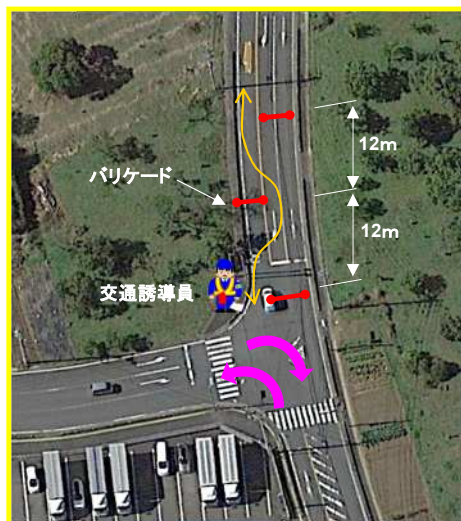

凡 例

- : 全面通行止め区間（工事車両のみ進入可能）
- : 通行止め区間（工事関係車両及び一部居住者通行可能）
- ↔ : 迂回路
- ↔ : 居住者進入可能経路

- ・ 東側交差点部につきましては、平日8：00～17：00までの間、交通誘導員を配置いたします。休日及び夜間は、出入口の封鎖は行わず、バリケードを千鳥状に設置いたしますので居住者の方につきましては通行可能となっております。
- ・ 西側交差点においては、工事関係車両のみの出入りとなります。

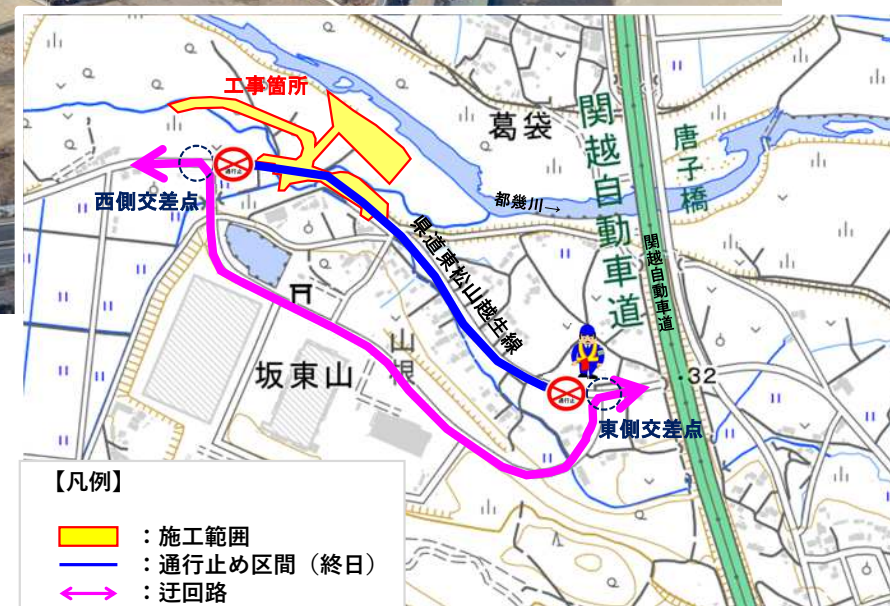


【凡例】

- : 施工範囲
- : 通行止め区間（終日）
- ↔ : 迂回路

2. 唐子地区の整備について

唐子地区説明会
R 6. 6. 9

堤防整備の計画（都幾川左岸 石橋地区(新郷排水路)）

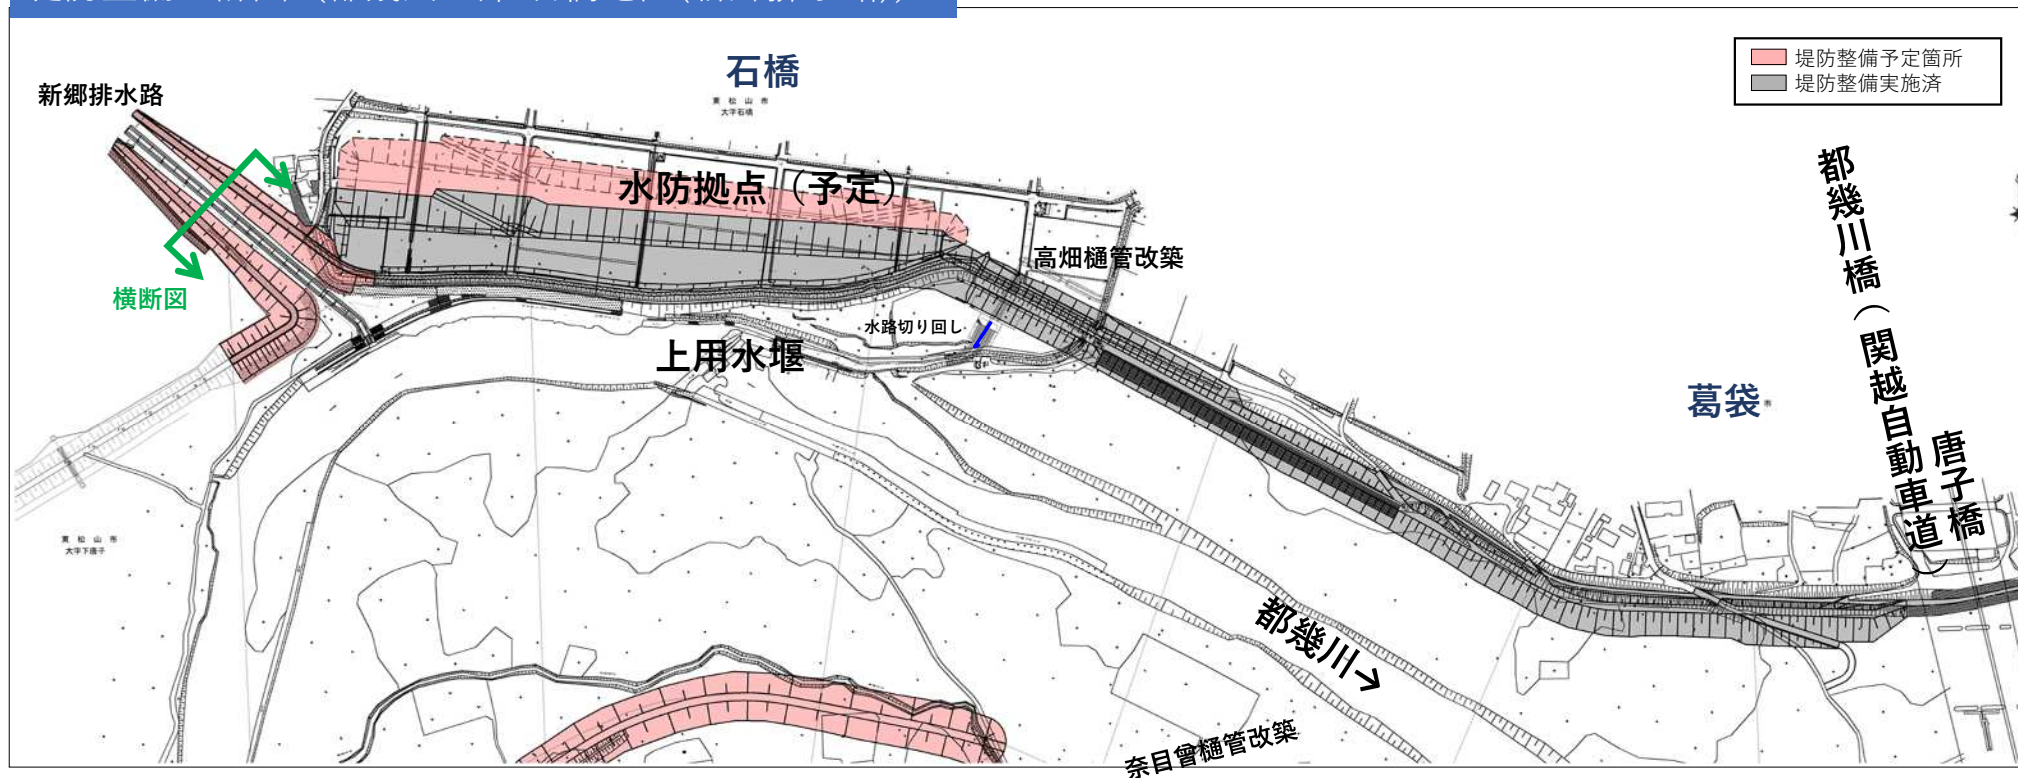

都幾川
下流側

都幾川
上流側



※ R 6. 6. 9 時点版であり、今後の検討により変更となる可能性があります
標準的な堤防の断面であり、地形状況（地盤高）により堤防（盛土）の高さや幅は異なります

3. 用地取得について

○用地取得の流れを説明します。

用地幅杭の設置

事業で必要な土地の範囲を示す杭の設置を行います。



用地測量及び物件等の調査

土地の境界立会等の測量、工作物、立竹木等の物件調査を行います。

土地調書・物件調書による
面積・数量等の確認

調査結果に基づき作成した土地取得面積や物件の数量等の調書を確認していただきます。

補償金の算定

確認結果をもとに補償額を算定します。



補償説明・協議
(用地交渉)

補償内容について、土地所有者及び関係者の方々にご理解いただけるようそれぞれ個別に説明いたします。

契約

契約書に署名・押印(実印)を行っていただきます。契約に際し、実印と印鑑証明書を用意いただきます。



土地登記・土地の引渡

所有権移転登記は国が実施します。

支払い

土地の引渡を受けたのち補償金をお支払いします。
補償金は金融機関の口座振込によって支払います。



4. 今後のスケジュールについて

唐子地区説明会
R 6 . 6 . 9



問合せ先 荒川上流河川事務所 （計画全般に関すること） 流域治水課 TEL：049-246-6360
（用地・補償に関すること） 用地課 TEL：049-246-6373
