

参考資料 1

令和 6 年度取組進捗率一覧

取組番号	取組項目
1	新たな関係機関参画の検討・推進

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

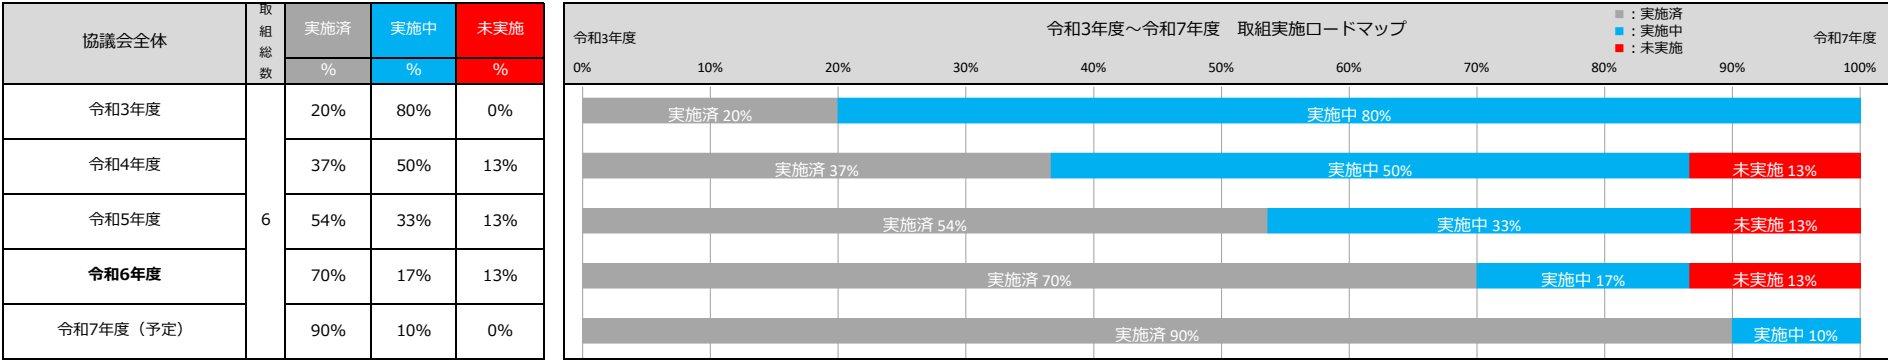

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
藤 岡 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉 村 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
神 川 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上 里 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
国 道 事 務 所	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		20%	0%	80%
	令和5年度		20%	0%	80%
	令和6年度		20%	0%	80%
	令和7年度（予定）		40%	60%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）



取組番号	取組項目
2	優先的に実施する堤防整備（流下能力対策）


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

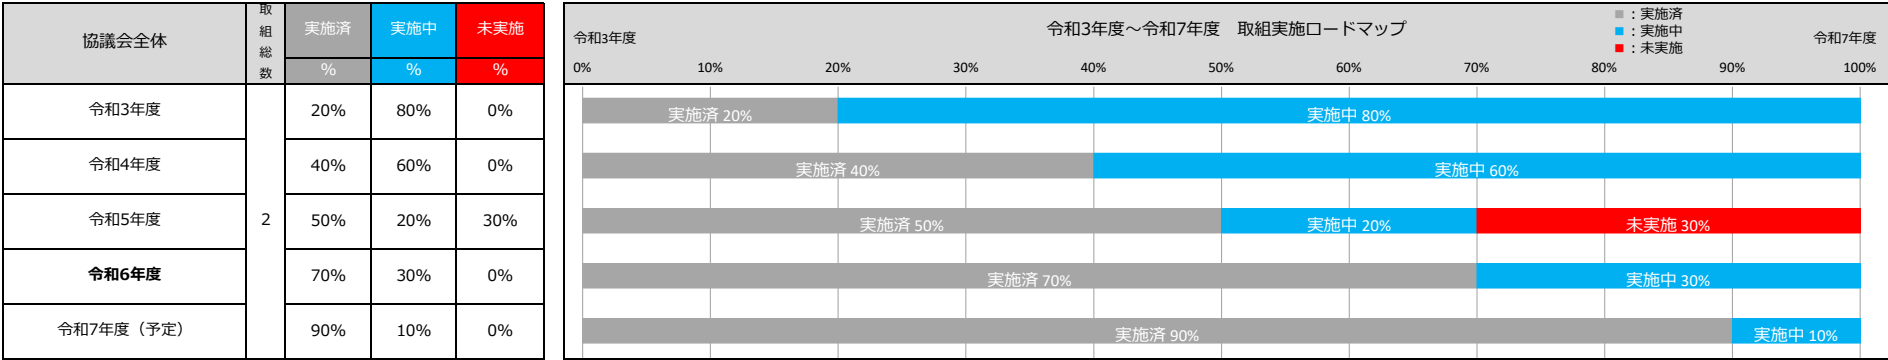

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関	取組 総 数	実施済	実施中	未実施
		%	%	%
国 道 事 務 所 高 崎 河 川	令和3年度	20%	80%	0%
	令和4年度	40%	60%	0%
	令和5年度	50%	20%	30%
	令和6年度	70%	30%	0%
	令和7年度（予定）	90%	10%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

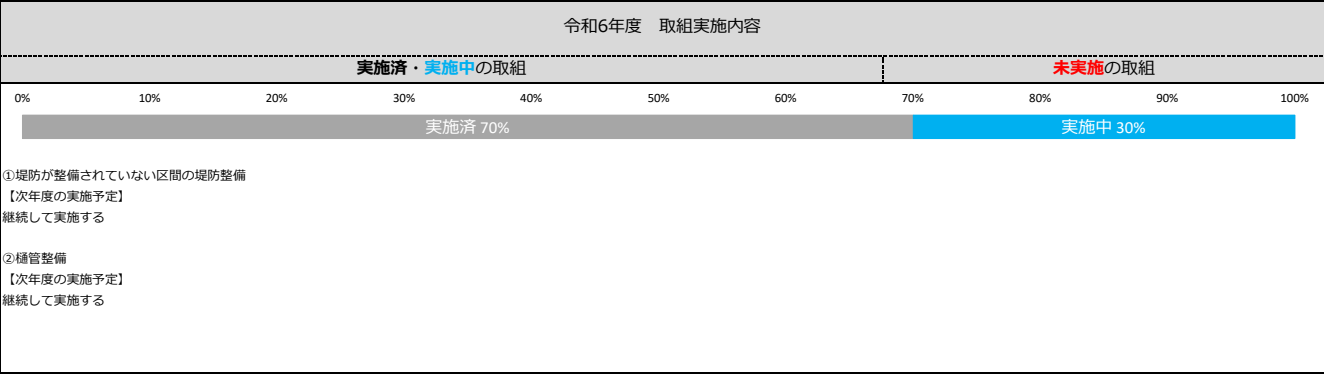

取組番号	取組項目
3	事前防災等の必要な樹木伐採・河道掘削の実施


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

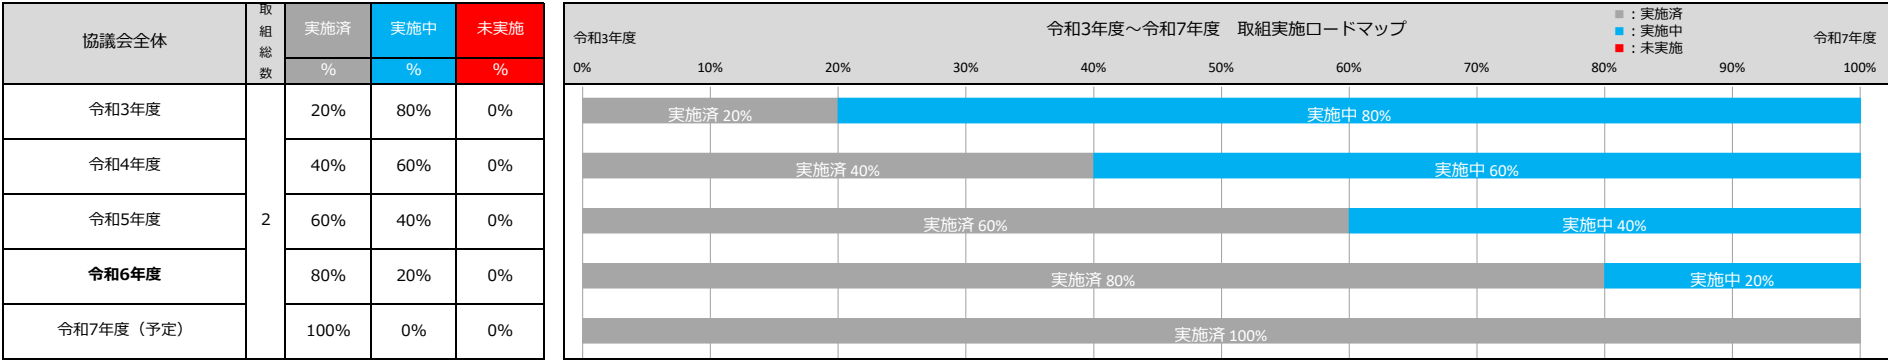

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

各機関	取組 総 数	実施済	実施中	未実施
		%	%	%
国 道 事 務 所 高 崎 河 川	令和3年度	20%	80%	0%
	令和4年度	40%	60%	0%
	令和5年度	60%	40%	0%
	令和6年度	80%	20%	0%
	令和7年度（予定）	100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

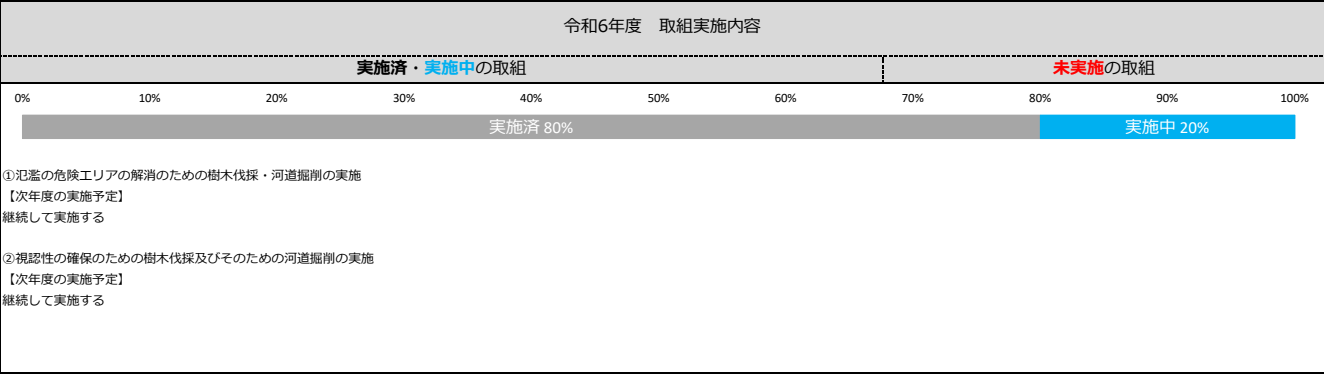

取組番号	取組項目
4	雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達するための施設を必要に応じて整備

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

協議会全体	取組 総 数	実施済	実施中	未実施	令和3年度	令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ										令和7年度			
		%	%	%		0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%		100%		
令和3年度	3	47%	53%	0%	実施済 47% 実施中 53%														
令和4年度		60%	40%	0%	実施済 60% 実施中 40%														
令和5年度		73%	27%	0%	実施済 73% 実施中 27%														
令和6年度		93%	7%	0%	実施済 93% 実施中 7%														
令和7年度（予定）		100%	0%	0%	実施済 100%														

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
群馬県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
下久保ダム管理所	令和3年度	1	100%	0%	0%
	令和4年度		100%	0%	0%
	令和5年度		100%	0%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
国道高崎河川事務所	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

令和6年度 取組実施内容																			
実施済・実施中の取組															未実施の取組				
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 実施済 100%																			
①「河川氾濫に関する群馬県減災対策協議会」で必要箇所を整理し、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの拡充を行う																			
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 実施済 100%																			
①必要に応じ、水位計、異常洪水時の放流警報装置等の追加設置																			
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 実施済 80% 実施中 20%																			
①必要に応じ、危機管理型水位計、簡易河川監視カメラの追加設置																			
【次年度の実施予定】																			
継続して実施する																			

取組番号	取組項目
5	堤防等の復旧を効率的に行うための水防拠点や堤防天端上の車両交換場所の整備促進


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

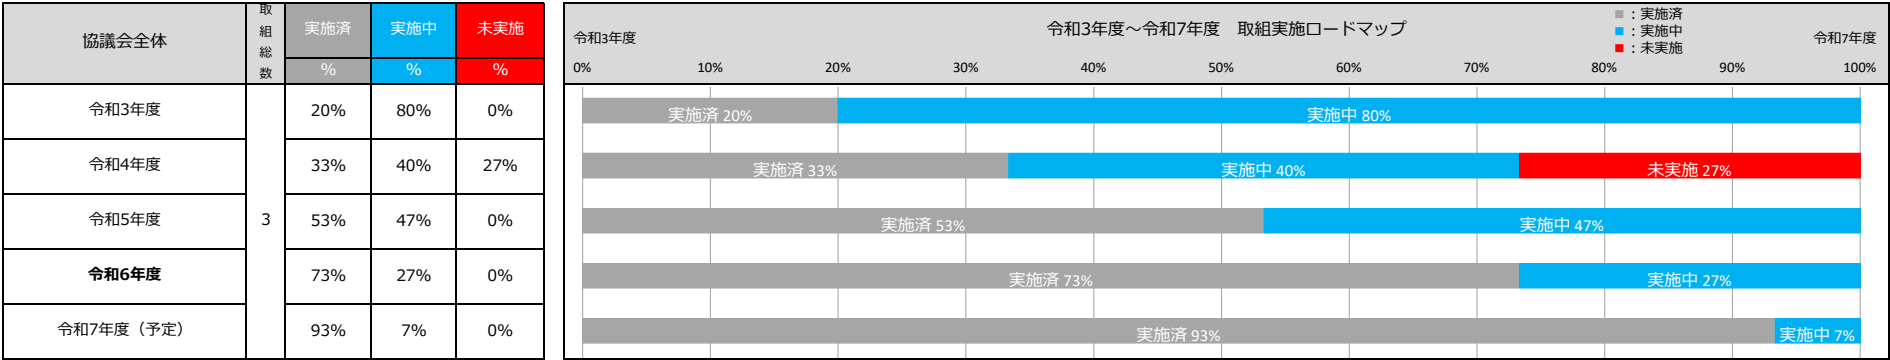

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
国 道 事 務 所	令和3年度	3	20%	80%	0%
	令和4年度		33%	40%	27%
	令和5年度		53%	47%	0%
	令和6年度		73%	27%	0%
	令和7年度（予定）		93%	7%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

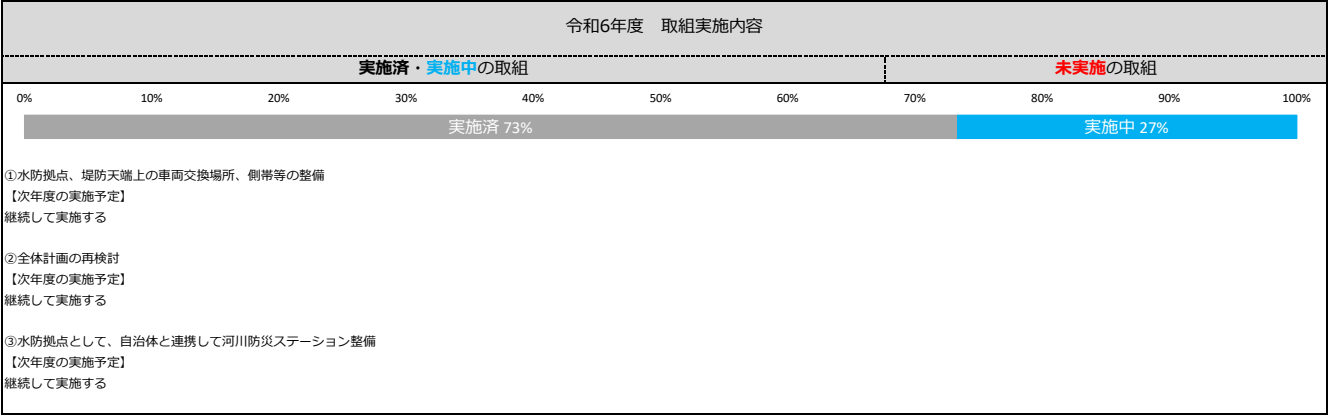

取組番号	取組項目
6	水防資機材の配備


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

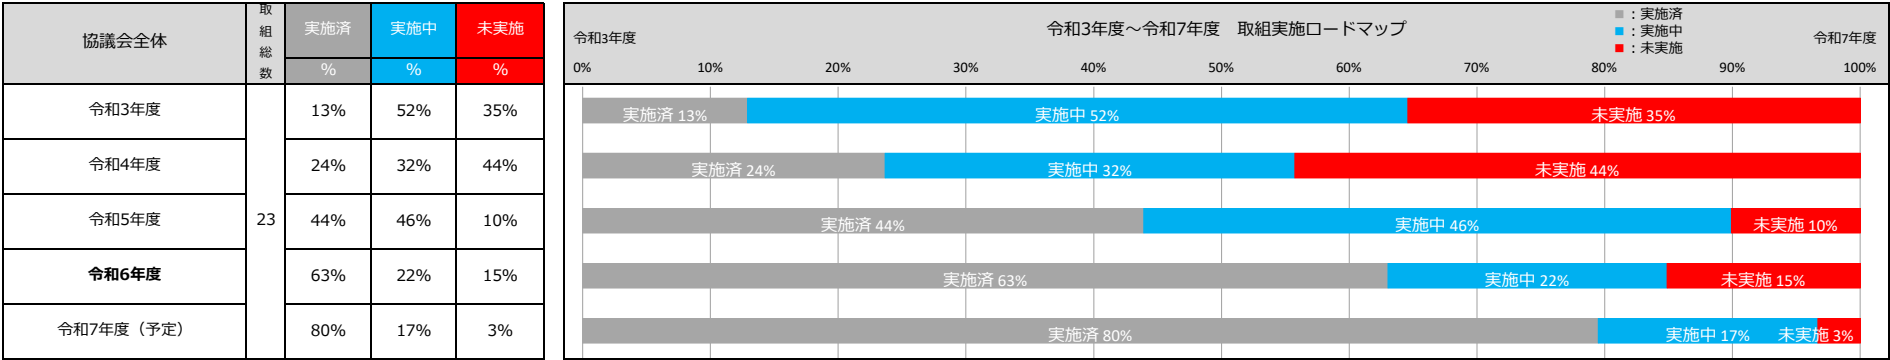

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	3	20%	80%	0%
	令和4年度		27%	20%	53%
	令和5年度		33%	13%	53%
	令和6年度		40%	7%	53%
	令和7年度（予定）		53%	20%	27%
藤 岡 市	令和3年度	4	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		75%	25%	0%
	令和7年度（予定）		90%	10%	0%
玉 村 町	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		13%	20%	67%
	令和5年度		27%	40%	33%
	令和6年度		67%	0%	33%
	令和7年度（予定）		73%	27%	0%
神 川 町	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		13%	20%	67%
	令和5年度		33%	67%	0%
	令和6年度		53%	47%	0%
	令和7年度（予定）		73%	27%	0%
上 里 町	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		50%	10%	40%
	令和7年度（予定）		70%	30%	0%
群 馬 県	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
埼 玉 県	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

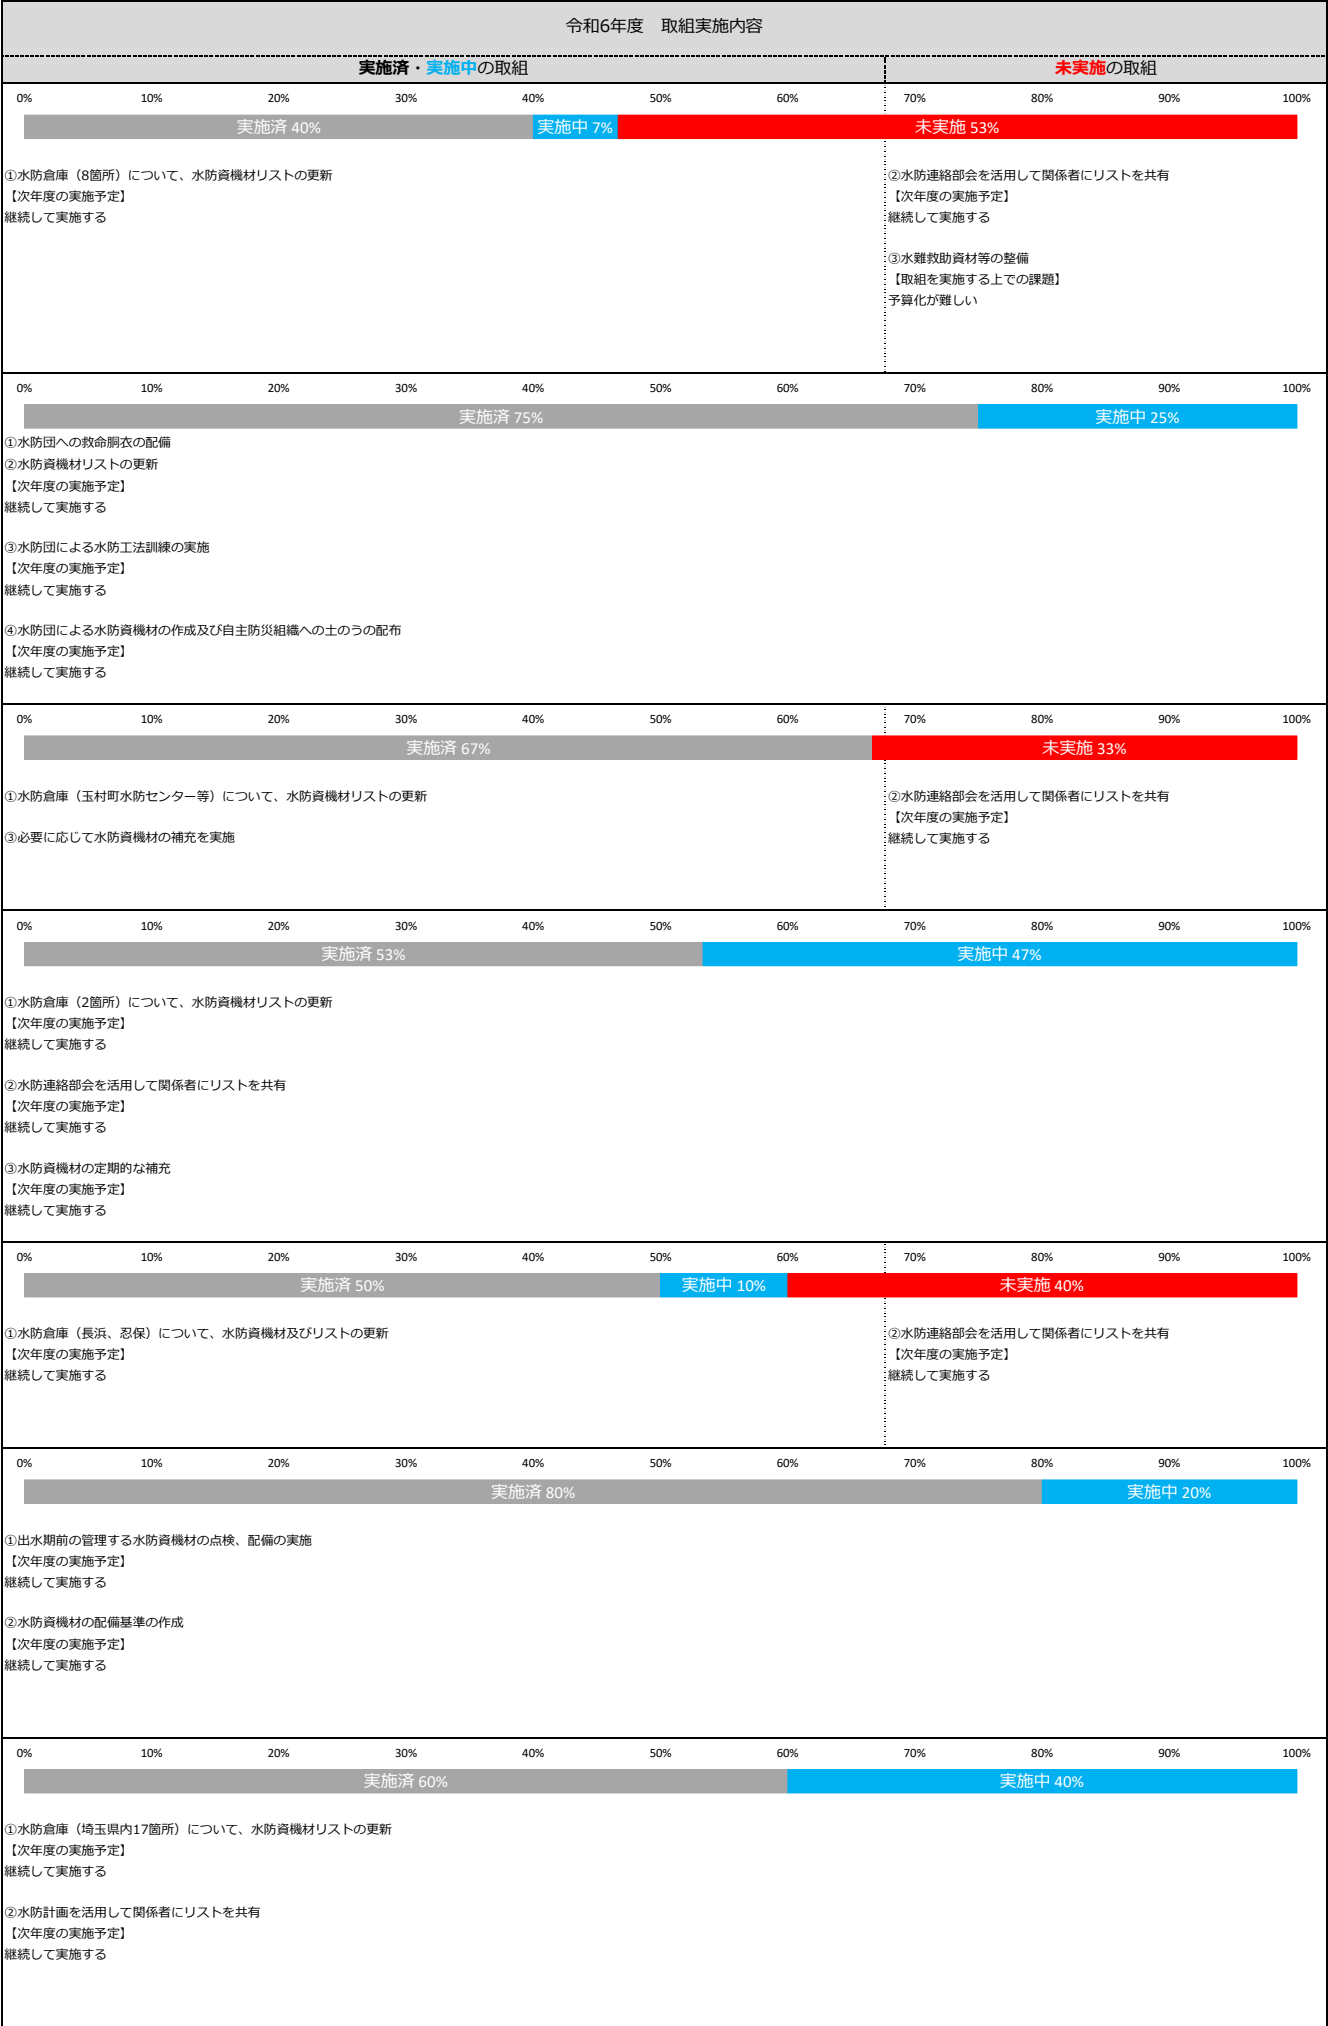

取組番号	取組項目
6	水防資機材の配備


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

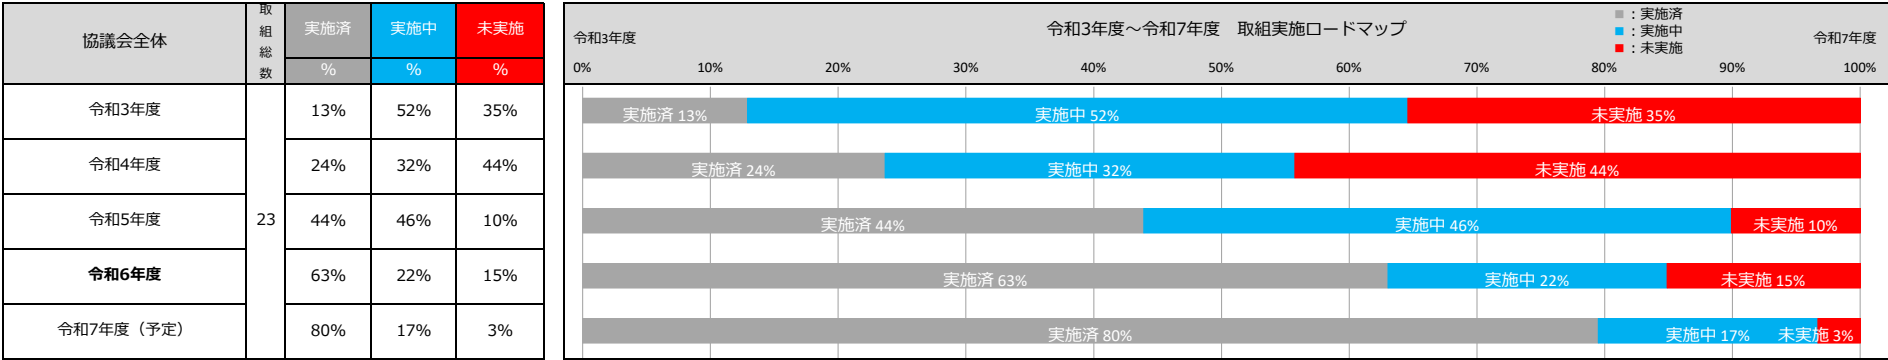

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
国 道 事 務 所	令和3年度	4	20%	80%	0%
	令和4年度		35%	45%	20%
	令和5年度		55%	45%	0%
	令和6年度		75%	25%	0%
	令和7年度（予定）		95%	5%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

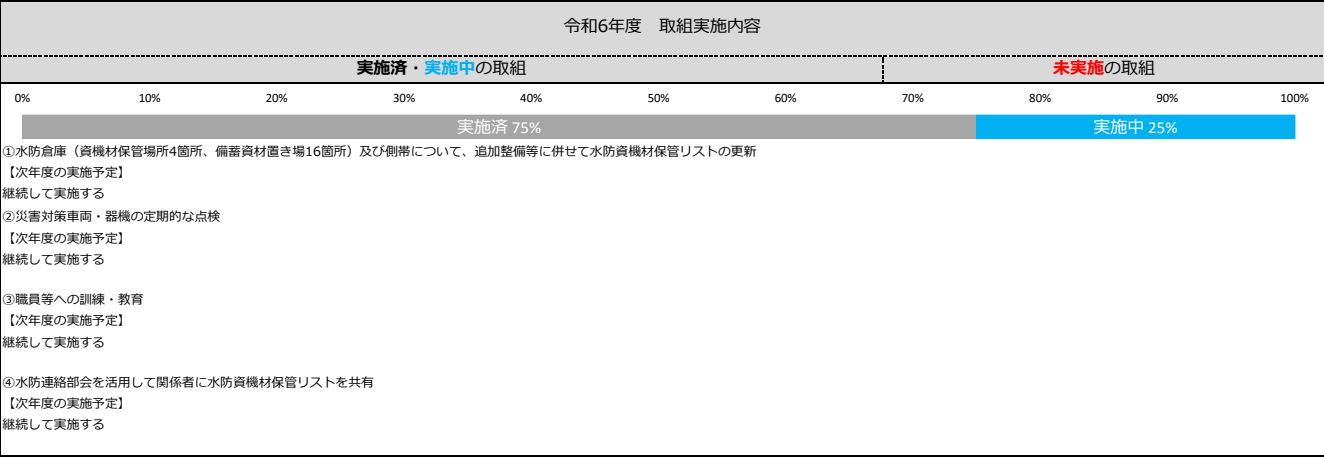

取組番号	取組項目
7	市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

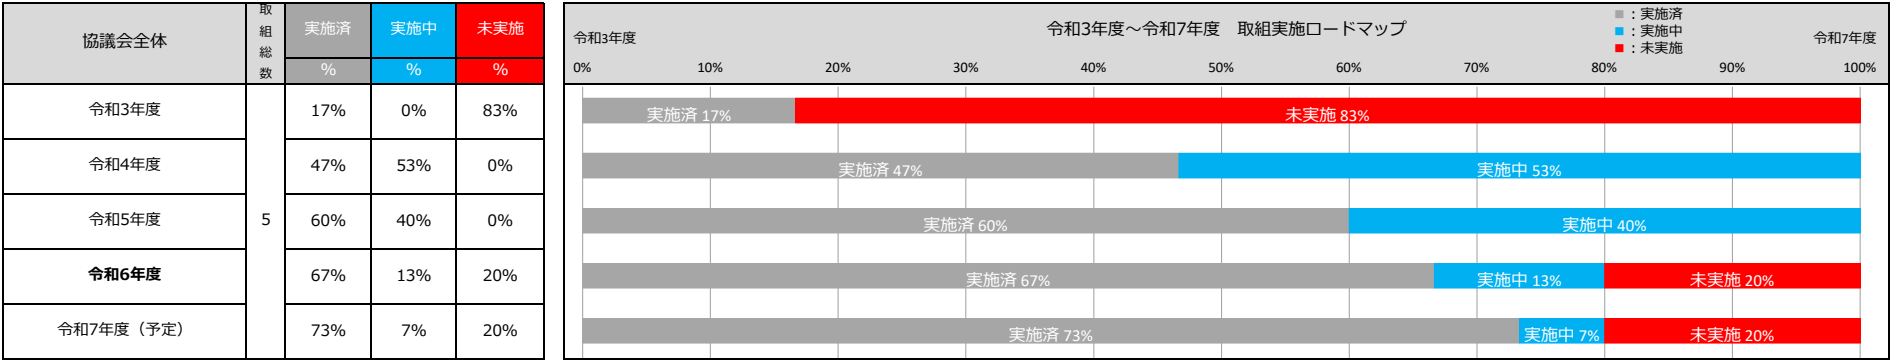

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
藤岡市	令和3年度	2	50%	0%	50%
	令和4年度		100%	0%	0%
	令和5年度		100%	0%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
J R 高崎支社	令和3年度	1	0%	0%	100%
	令和4年度		20%	80%	0%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
上信電鉄	令和3年度	2	0%	0%	100%
	令和4年度		20%	80%	0%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		40%	0%	60%
	令和7年度（予定）		40%	0%	60%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）



取組番号	取組項目
8	樋管の操作不要な無動力ゲートの導入による確実な運用体制の確保

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

協議会全体	取組 総 数	実施済	実施中	未実施	令和3年度	令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ										令和7年度			
		%	%	%		0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%		100%		
令和3年度	1	20%	80%	0%															
令和4年度		40%	60%	0%															
令和5年度		40%	0%	60%															
令和6年度		60%	40%	0%															
令和7年度（予定）		80%	20%	0%															

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
国 道 事 務 所	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		40%	0%	60%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

令和6年度 取組実施内容										
実施済・実施中の取組							未実施の取組			
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
実施済 60%							実施中 40%			
①既存排水樋管の無動力ゲート化の整備（フラップゲート化）（阿久津樋管） ※ R元年度（岩鼻樋管）、R2年度（栗師堂樋管）は完成 【次年度の実施予定】 継続して実施する										

取組番号	取組項目
9	リアルタイムの情報提供やプッシュ型情報の発信


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

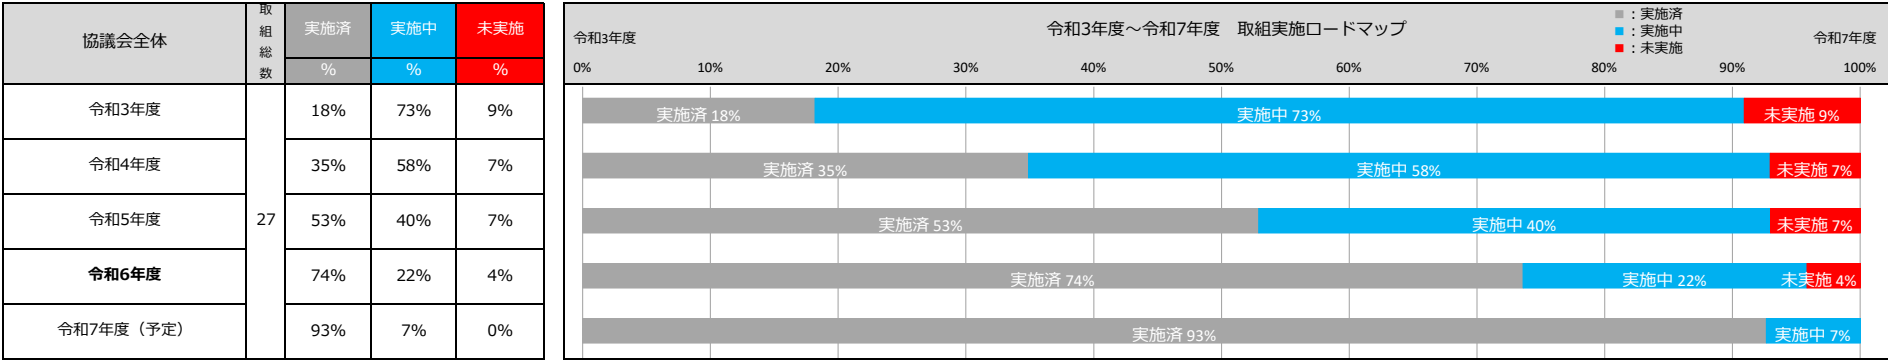

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
藤 岡 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉 村 町	令和3年度	4	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	35%	45%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		75%	25%	0%
	令和7年度（予定）		90%	10%	0%
神 川 町	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		30%	20%	50%
	令和6年度		40%	10%	50%
	令和7年度（予定）		60%	40%	0%
上 里 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
群 馬 県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
埼 玉 県	令和3年度	2			
	令和4年度		20%	80%	0%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
下 久 保 ダム 管 理 所	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

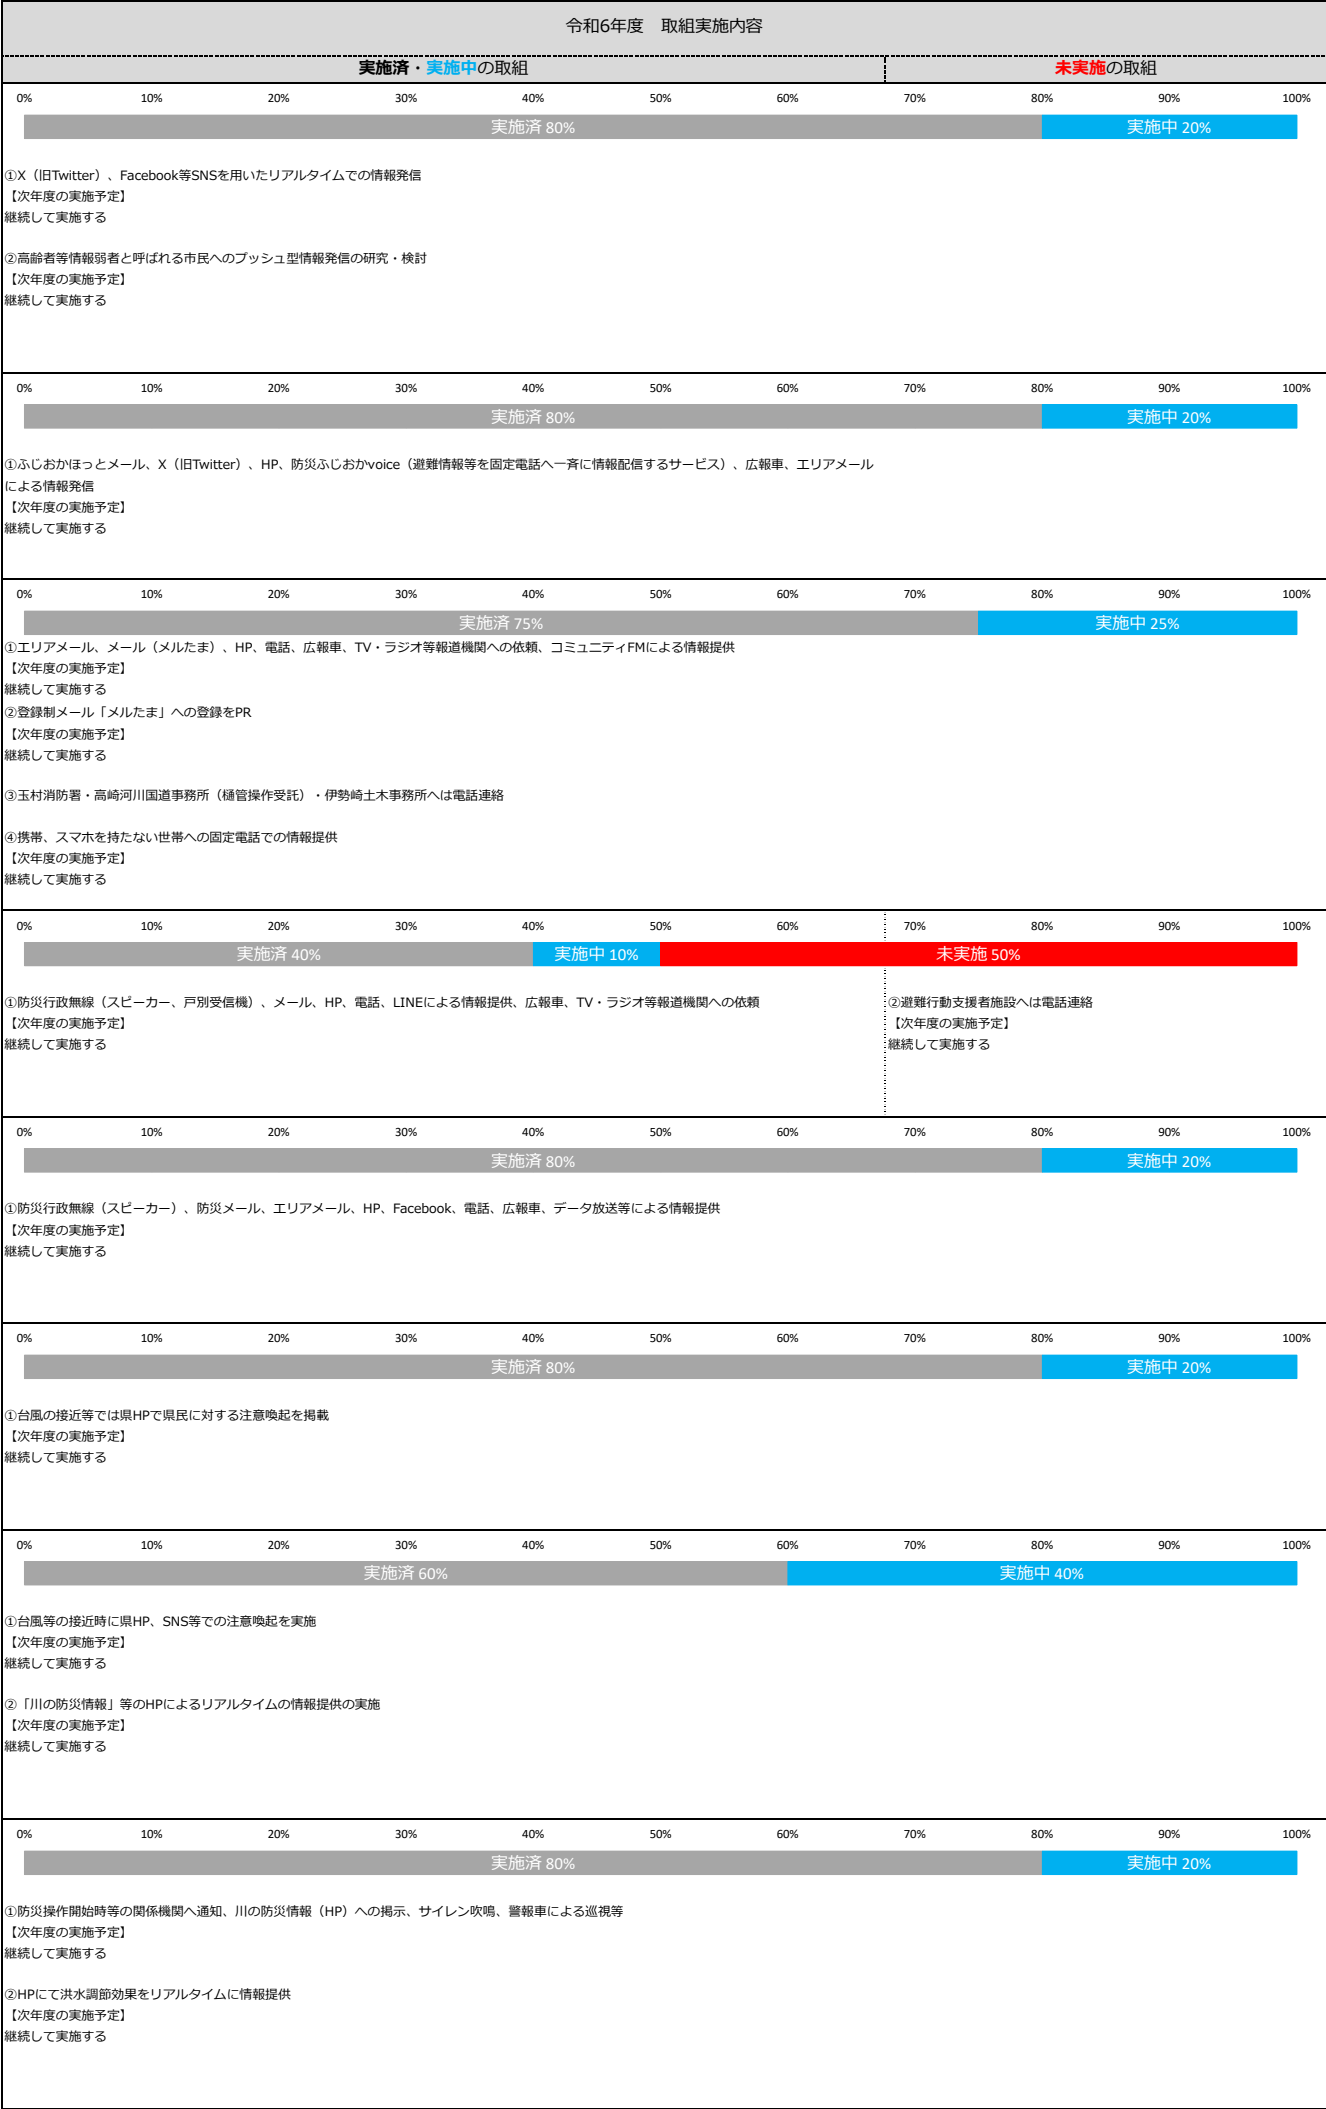

取組番号	取組項目
9	リアルタイムの情報提供やプッシュ型情報の発信


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

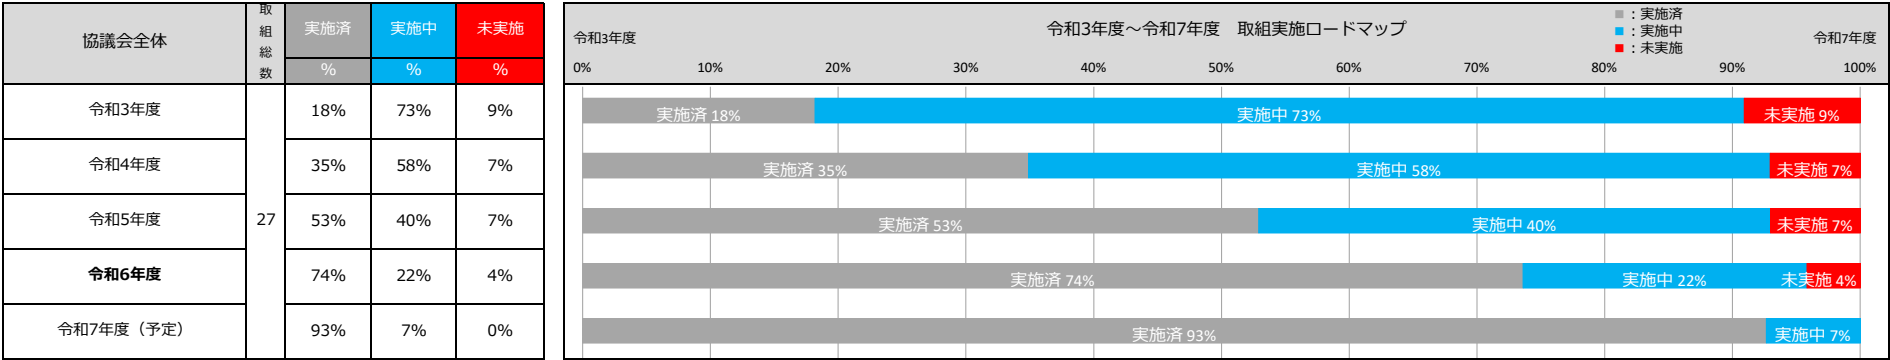

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
前橋地方気象台	令和3年度	4	20%	80%	0%
	令和4年度		35%	65%	0%
	令和5年度		55%	45%	0%
	令和6年度		75%	25%	0%
	令和7年度（予定）		95%	5%	0%
熊谷地方気象台	令和3年度	3	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
JR高崎支社	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
国道事務所 高崎河川	令和3年度	3	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		47%	13%	40%
	令和6年度		73%	27%	0%
	令和7年度（予定）		87%	13%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

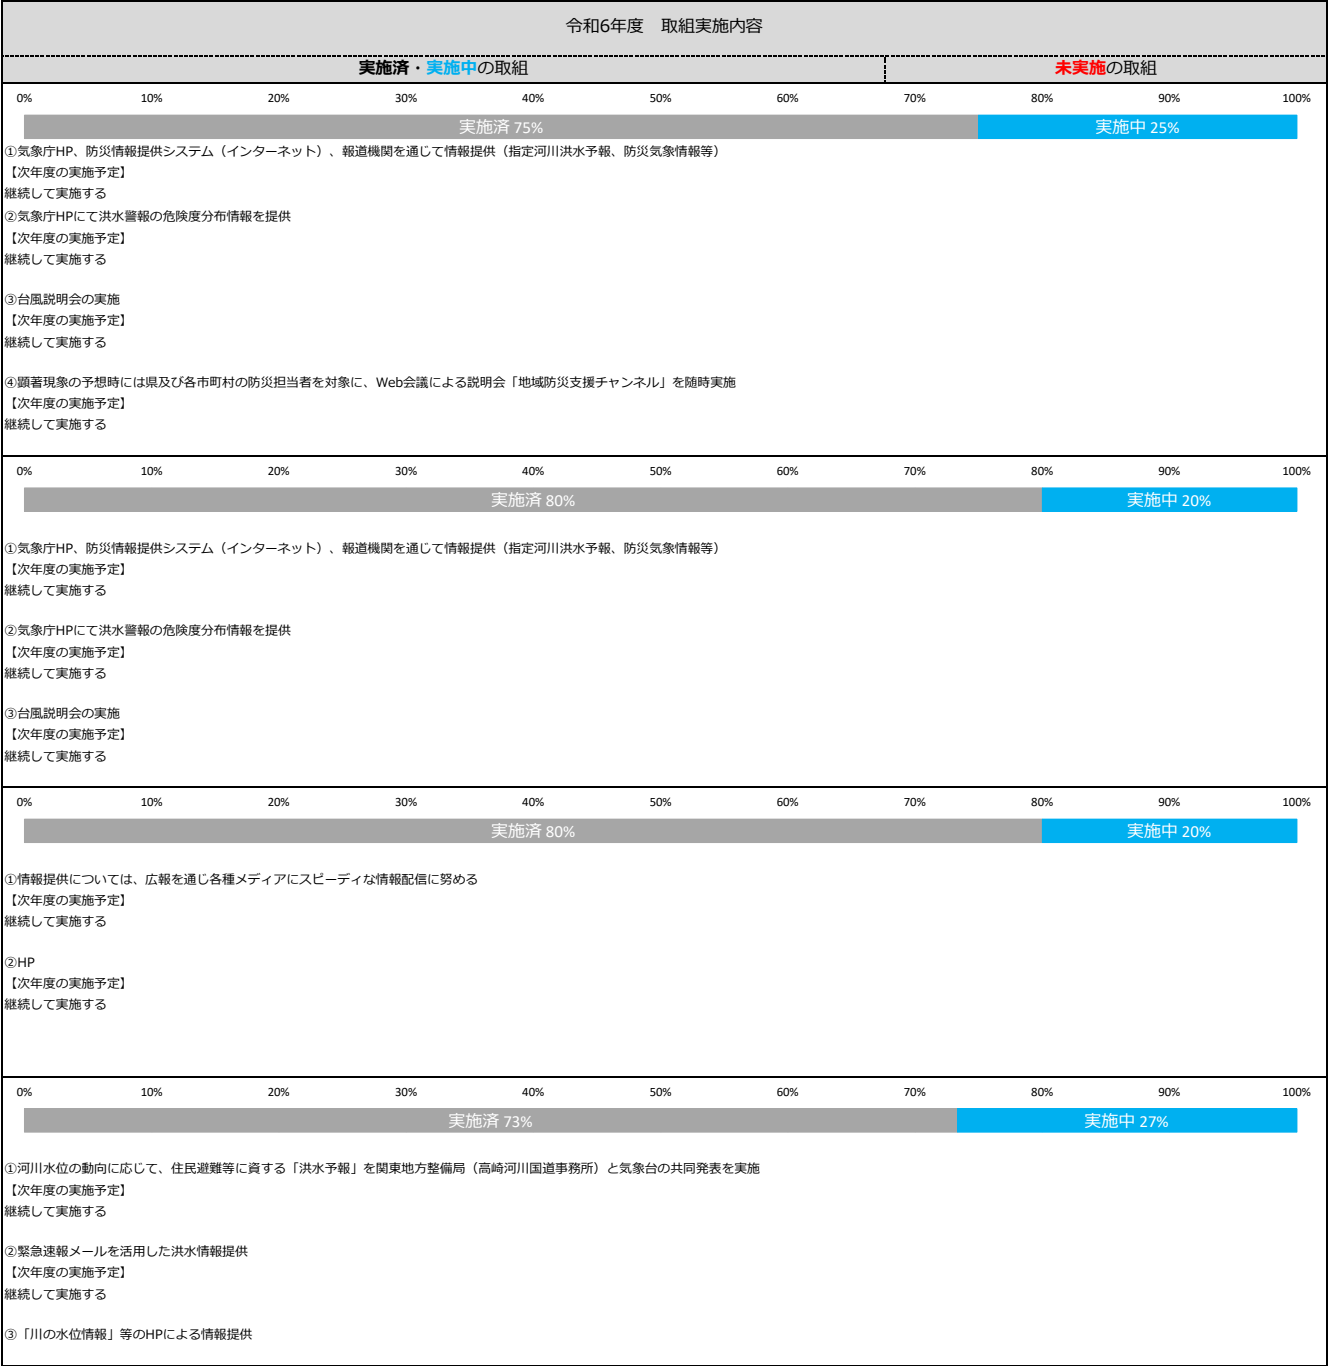

取組番号	取組項目
10	情報伝達手段の多重化（コミュニティFM放送の整備、防災ラジオの配布、SNS配信など）


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

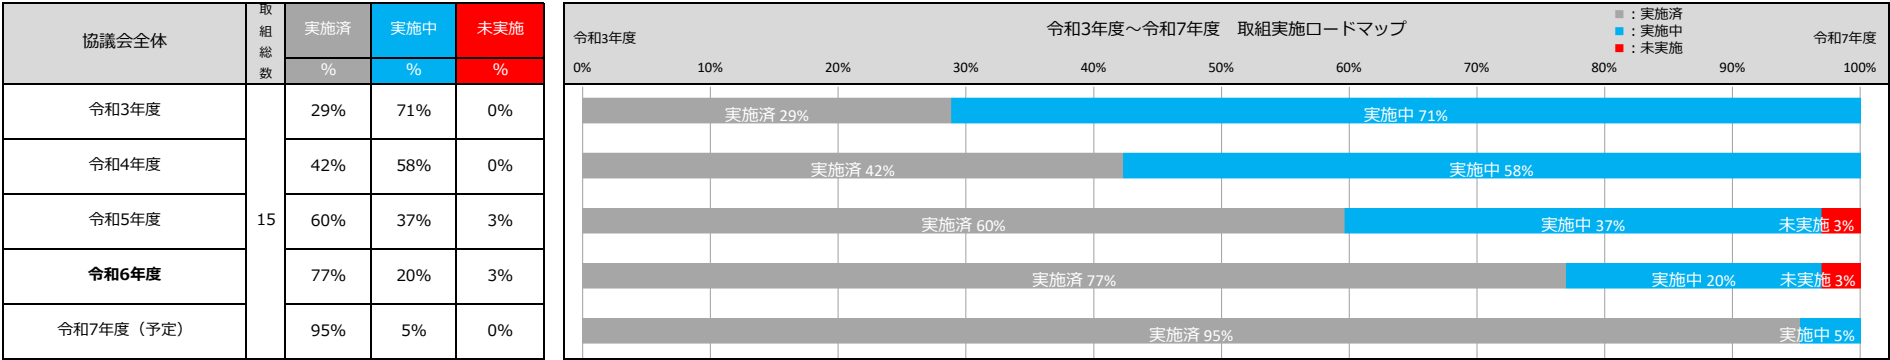

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高崎市	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
藤岡市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉村町	令和3年度	3	60%	40%	0%
	令和4年度		53%	47%	0%
	令和5年度		67%	33%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		93%	7%	0%
神川町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上里町	令和3年度	2	60%	40%	0%
	令和4年度		70%	30%	0%
	令和5年度		70%	0%	30%
	令和6年度		70%	0%	30%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
群馬県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
埼玉県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
JR高崎支社	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上信電鉄	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

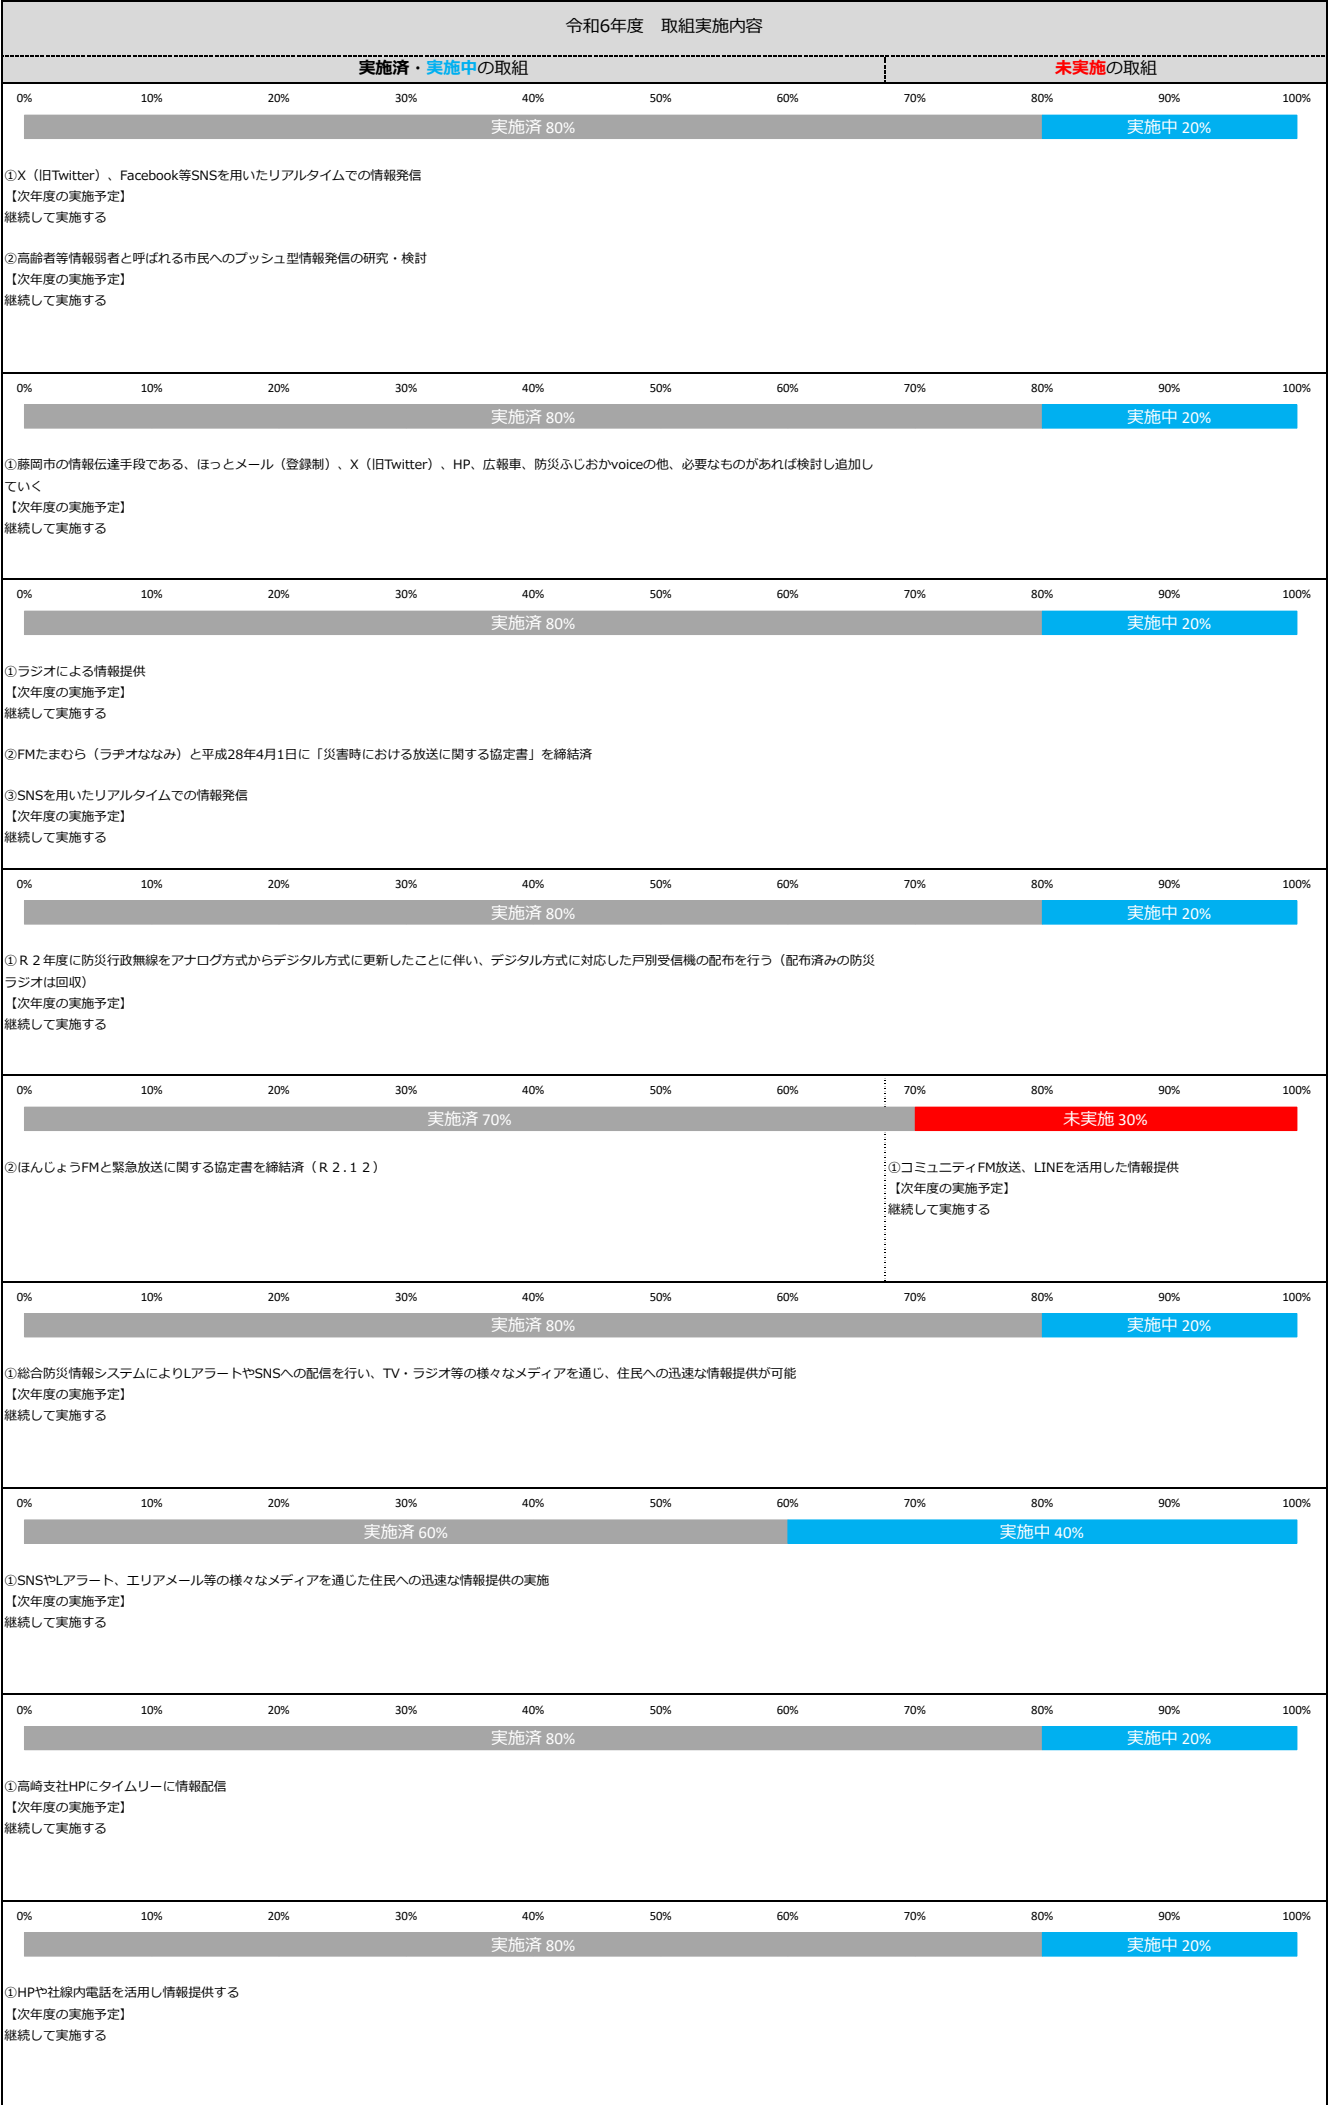

取組番号	取組項目
10	情報伝達手段の多重化（コミュニティFM放送の整備、防災ラジオの配布、SNS配信など）


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

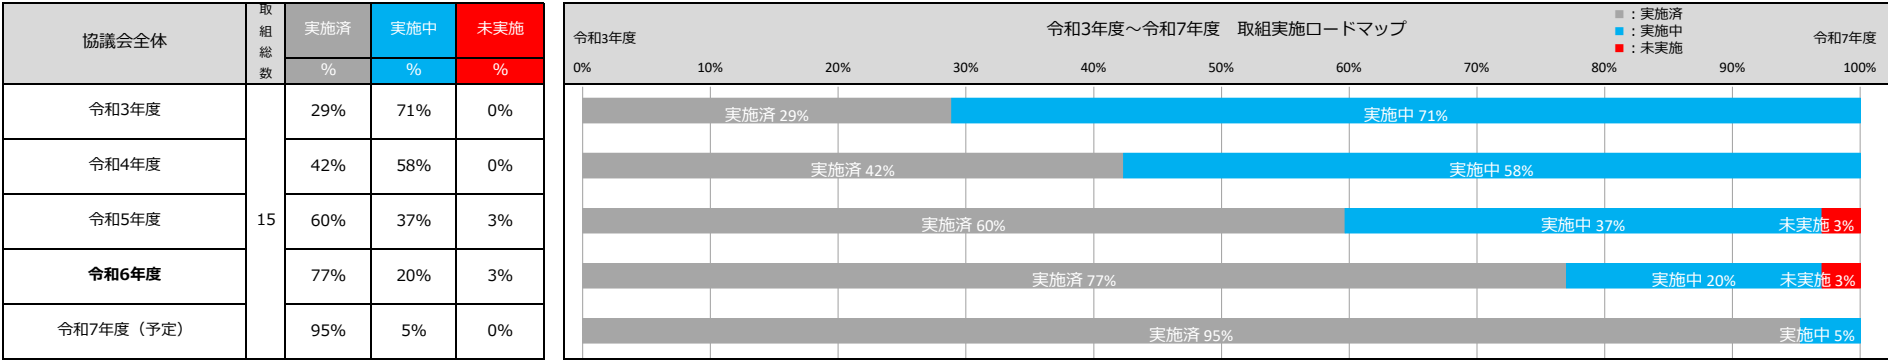

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関	取組 総 数	実施済	実施中	未実施
		%	%	%
国 道 事 務 所 高 崎 河 川	令和3年度	20%	80%	0%
	令和4年度	40%	60%	0%
	令和5年度	60%	40%	0%
	令和6年度	80%	20%	0%
	令和7年度（予定）	100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

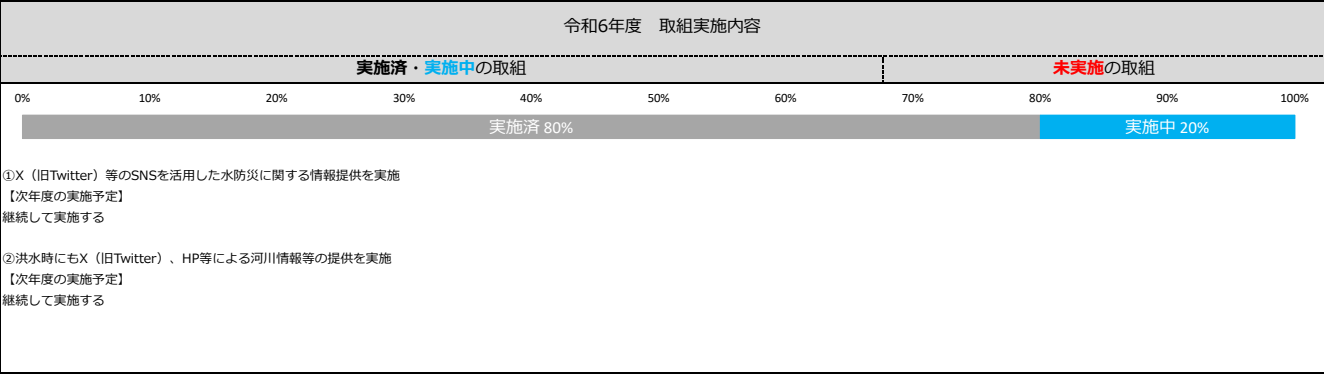

取組番号	取組項目
11	ライブカメラ等の情報をリアルタイムで提供


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

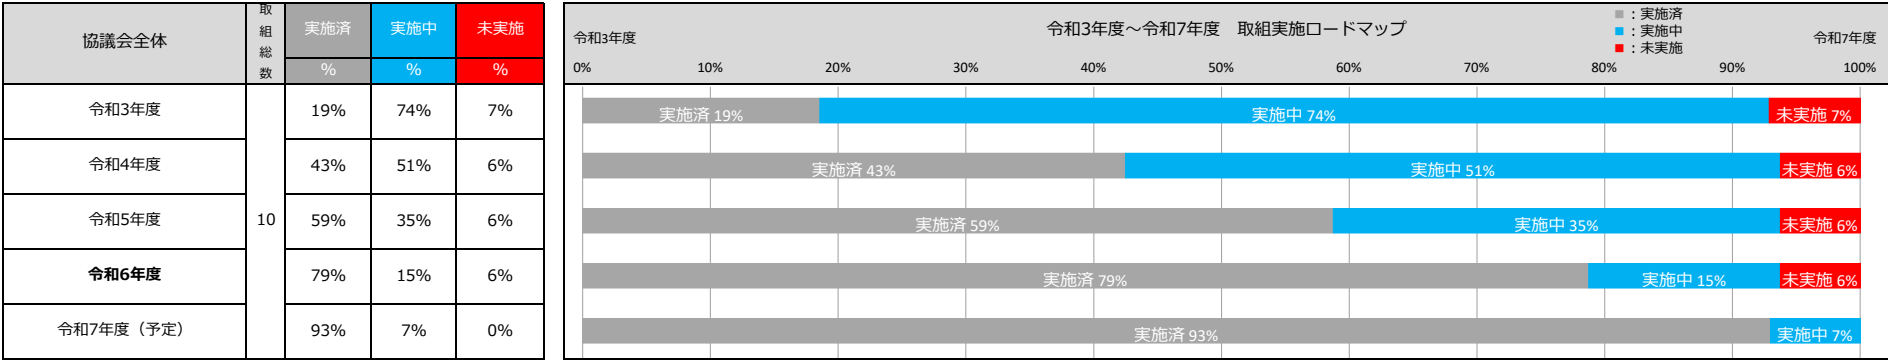

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
藤 岡 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉 村 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		100%	0%	0%
	令和5年度		100%	0%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上 里 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
群 馬 県	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
埼 玉 県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
上 信 電 鉄	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
国 道 事 務 所	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		30%	20%	50%
	令和6年度		50%	0%	50%
	令和7年度（予定）		60%	40%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

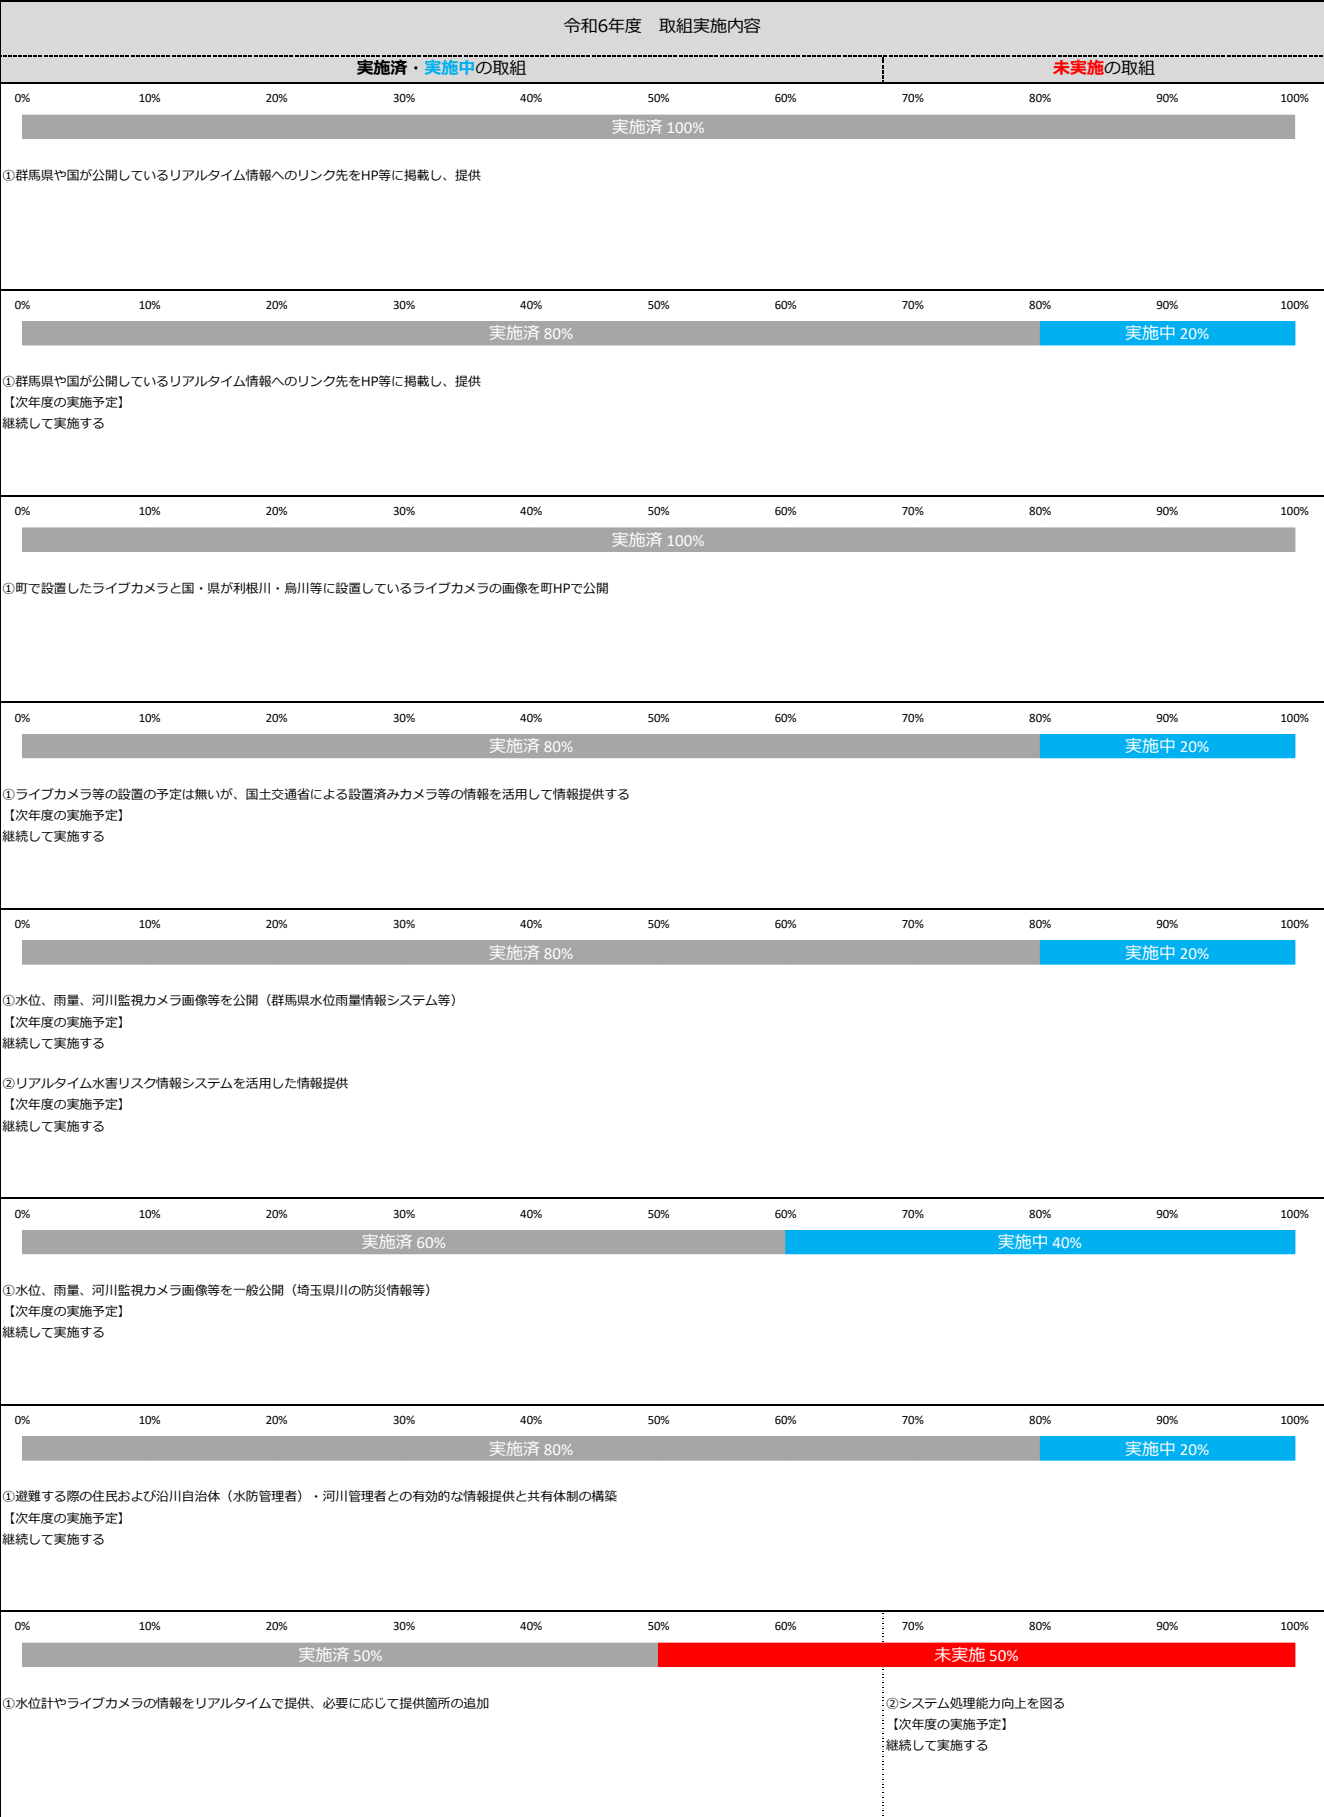

取組番号	取組項目
12	避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）の関連機関との連携状況や訓練の実施等を踏まえた精度向上

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

協議会全体	取組 総 数	実施済	実施中	未実施	
		%	%	%	
令和3年度	23	15%	59%	26%	令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ ■：実施済 ■：実施中 ■：未実施 令和3年度0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%令和7年度 実施済15% 実施中59% 未実施26% 実施済32% 実施中65% 未実施3% 実施済52% 実施中40% 未実施8% 実施済69% 実施中25% 未実施6% 実施済88% 実施中12%
令和4年度		32%	65%	3%	
令和5年度		52%	40%	8%	
令和6年度		69%	25%	6%	
令和7年度（予定）		88%	12%	0%	

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高崎市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
藤岡市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉村町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
神川町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上里町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
群馬県	令和3年度	2			
	令和4年度		20%	80%	0%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
埼玉県	令和3年度	2			
	令和4年度		23%	77%	0%
	令和5年度		70%	30%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		90%	10%	0%
下久保ダム管理所	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
前橋地方气象台	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		30%	70%	0%
	令和5年度		40%	20%	40%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

令和6年度 取組実施内容	
実施済・実施中の取組	
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%	実施済80%実施中20%
①タイムラインの実行性確認のための訓練の実施及びタイムラインの精度向上 【次年度の実施予定】 継続して実施する	
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%	
実施済80%実施中20%	
①タイムラインの実行性確認のための訓練の実施及びタイムラインの精度向上 【次年度の実施予定】 継続して実施する	
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%	
実施済80%実施中20%	
①タイムラインの実行性確認のための訓練の実施及びタイムラインの精度向上 【次年度の実施予定】 継続して実施する	
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%	
実施済80%実施中20%	
①タイムラインの実行性確認のための訓練の実施及びタイムラインの精度向上 【次年度の実施予定】 継続して実施する	
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%	
実施済60%実施中40%	
①タイムラインの実行性確認のための訓練の実施及びタイムラインの精度向上 【次年度の実施予定】 継続して実施する	
②中小河川へのタイムライン作成を呼びかける 【次年度の実施予定】 継続して実施する	
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%	
実施済80%実施中20%	
①タイムラインの実行性確認のための訓練の実施及びタイムラインの精度向上 【次年度の実施予定】 継続して実施する	
②中小河川へのタイムライン作成を呼びかける	
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%	
実施済80%実施中20%	
①伝達内容・手段（電話・メール、Web会議等）、タイミングなどを関係機関と意見交換 【次年度の実施予定】 継続して実施する	
②緊急放流等の場合のダム操作情報の伝達タイミング等について関係機関と検討 【次年度の実施予定】 継続して実施する	
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%	
実施済60%実施中40%	
①防災気象情報の伝達内容・手段（電話・メール、Web会議等）、タイミングなどを関係機関と意見交換 【次年度の実施予定】 継続して実施する	
②市町のタイムラインの精度向上に対する支援 【次年度の実施予定】 継続して実施する	

取組番号	取組項目
12	避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）の関連機関との連携状況や訓練の実施等を踏まえた精度向上


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

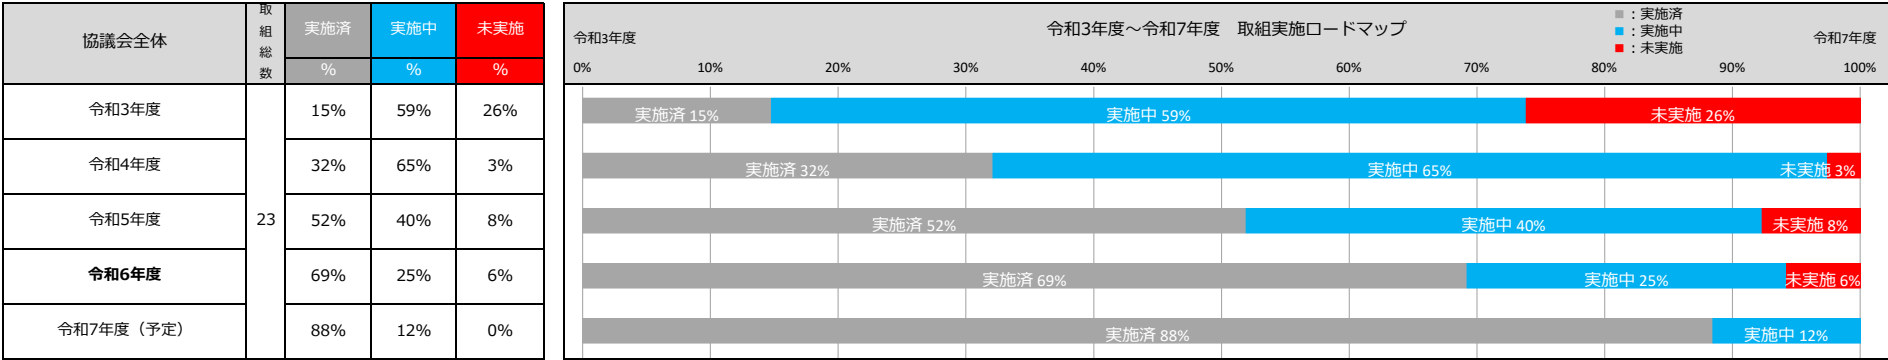

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組総数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
熊谷地方気象台	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		40%	0%	60%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
JＲ高崎支社	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		20%	47%	33%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
上信電鉄	令和3年度	1	0%	0%	100%
	令和4年度		20%	80%	0%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		40%	0%	60%
	令和7年度（予定）		60%	40%	0%
国道事務所 高崎河川	令和3年度	4	5%	20%	75%
	令和4年度		25%	75%	0%
	令和5年度		45%	55%	0%
	令和6年度		60%	25%	15%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

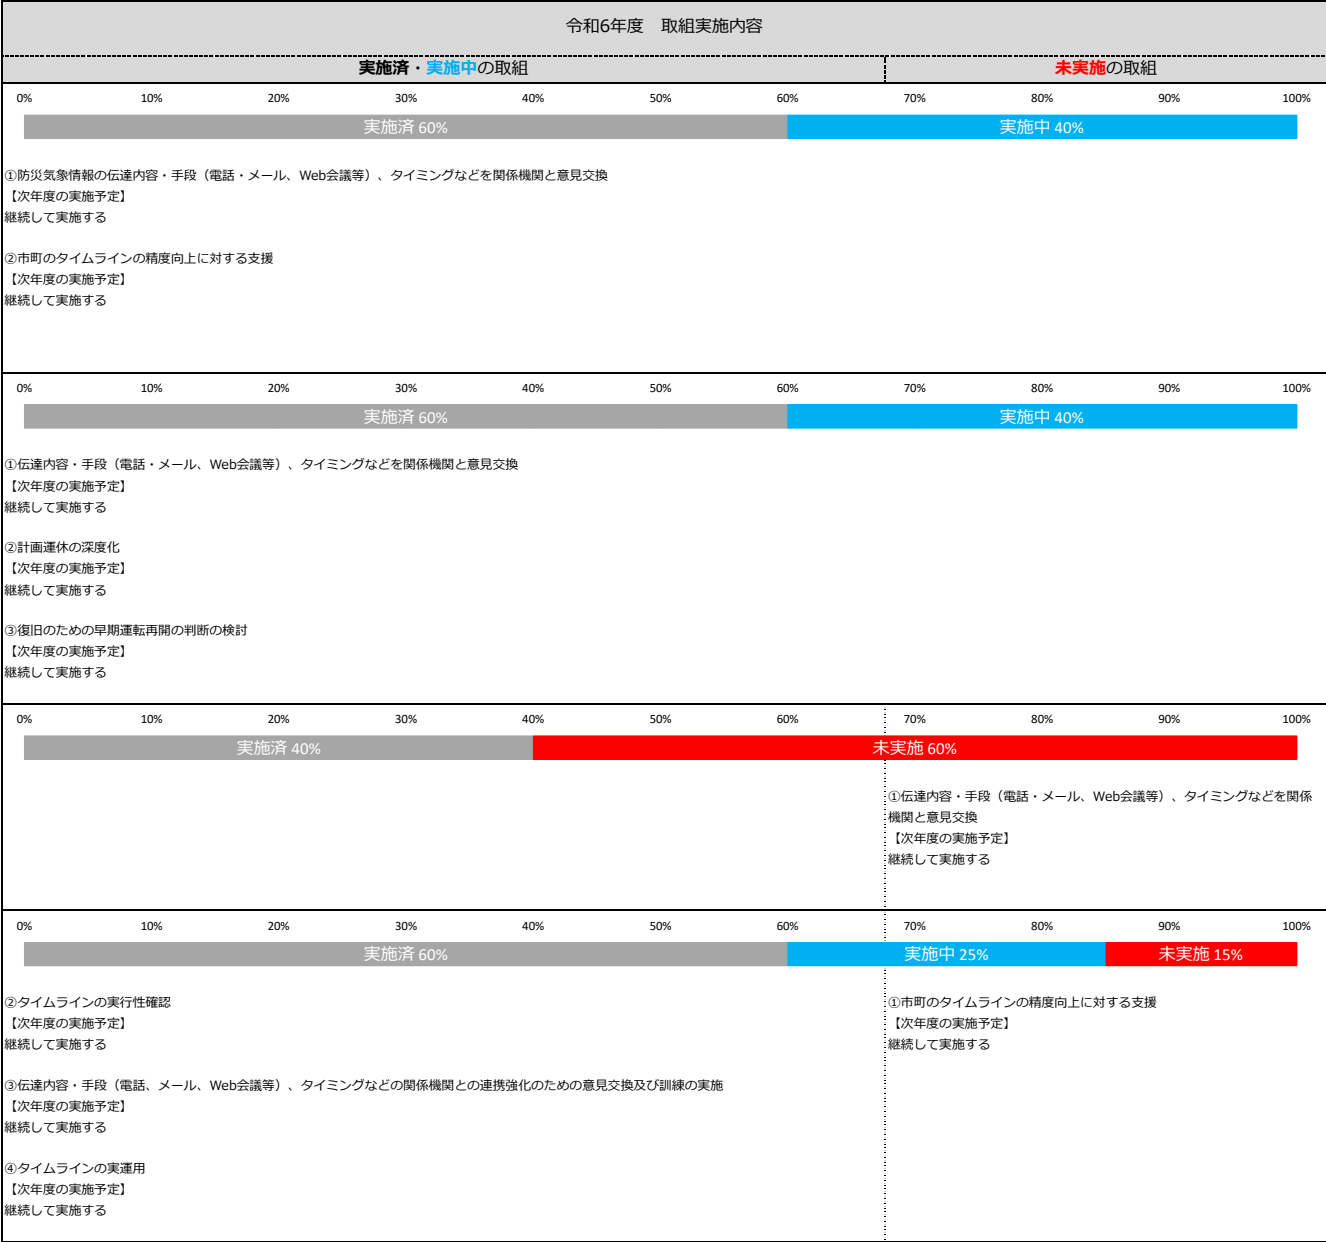

取組番号	取組項目
13	広域避難計画の策定

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

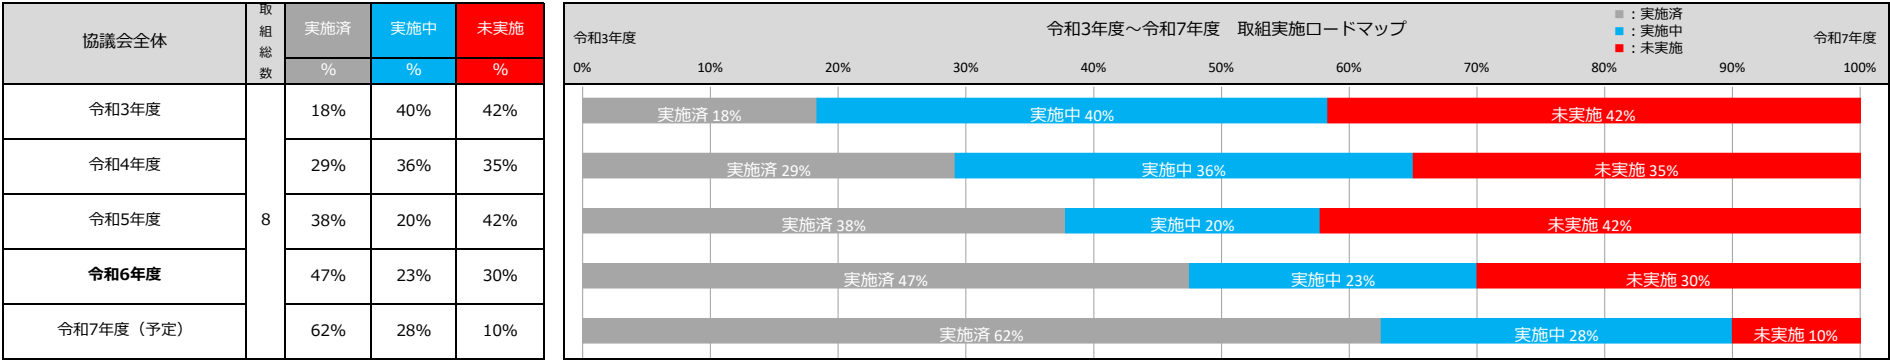

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

各機関		取組 総数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高崎市	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		20%	0%	80%
	令和6年度		30%	40%	30%
	令和7年度（予定）		50%	50%	0%
藤岡市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉村町	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		10%	0%	90%
	令和5年度		10%	0%	90%
	令和6年度		20%	30%	50%
	令和7年度（予定）		40%	60%	0%
上里町	令和3年度	3	33%	0%	67%
	令和4年度		47%	53%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		60%	0%	40%
	令和7年度（予定）		60%	0%	40%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）



取組番号	取組項目
14	緊急避難場所の確保

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

協議会全体	取組 総 数	実施済	実施中	未実施	令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ															令和7年度	
		%	%	%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%						
令和3年度	2	100%	0%	0%	実施済 100%																
令和4年度		100%	0%	0%	実施済 100%																
令和5年度		100%	0%	0%	実施済 100%																
令和6年度		100%	0%	0%	実施済 100%																
令和7年度（予定）		100%	0%	0%	実施済 100%																

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	2	100%	0%	0%
	令和4年度		100%	0%	0%
	令和5年度		100%	0%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

令和6年度 取組実施内容										
実施済・実施中の取組							未実施の取組			
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
実施済 100%										
①民間等の高層建物を一時避難場所として確保する取組を実施										
②新町の新設体育館を避難場所として確保										

取組番号	取組項目
15	要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難訓練の実施

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

協議会全体	取組 総 数	実施済	実施中	未実施	令和3年度	令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ										令和7年度			
		%	%	%		0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%		100%		
令和3年度	17	30%	56%	14%															
令和4年度		47%	43%	10%															
令和5年度		66%	31%	3%															
令和6年度		79%	18%	3%															
令和7年度（予定）		93%	7%	0%															

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高崎市	令和3年度	3	14%	53%	33%
	令和4年度		27%	47%	26%
	令和5年度		47%	53%	0%
	令和6年度		67%	33%	0%
	令和7年度（予定）		87%	13%	0%
藤岡市	令和3年度	3	24%	43%	33%
	令和4年度		37%	47%	16%
	令和5年度		80%	20%	0%
	令和6年度		87%	13%	0%
	令和7年度（予定）		93%	7%	0%
玉村町	令和3年度	3	47%	53%	0%
	令和4年度		80%	20%	0%
	令和5年度		80%	0%	20%
	令和6年度		80%	0%	20%
	令和7年度（予定）		87%	13%	0%
神川町	令和3年度	3	73%	27%	0%
	令和4年度		73%	0%	27%
	令和5年度		80%	20%	0%
	令和6年度		87%	13%	0%
	令和7年度（予定）		93%	7%	0%
上里町	令和3年度	3	14%	53%	33%
	令和4年度		33%	67%	0%
	令和5年度		53%	47%	0%
	令和6年度		73%	27%	0%
	令和7年度（予定）		93%	7%	0%
群馬県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
埼玉県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

令和6年度 取組実施内容												
実施済・実施中の取組							未実施の取組					
0%10%20%30%40%50%60%							70%80%90%100%					
実施済 67%							実施中 33%					
①洪水浸水想定区域内で地域防災計画に載っている全ての要配慮者利用施設の管理者に避難確保計画を作成させる 【次年度の実施予定】 継続して実施する												
②避難訓練の実施を促進 【次年度の実施予定】 継続して実施する												
③対象施設数、計画提出済み施設数、避難訓練実施施設数を把握 ※ R 3.2 現在、全285施設のうち254施設（約90%）が提出済み 【次年度の実施予定】 継続して実施する												
0%10%20%30%40%50%60%70%							80%90%100%					
実施済 87%							実施中 13%					
①市地域防災計画に記載された要配慮者利用施設を対象とした避難確保計画の作成に係る説明会の開催												
②避難確保計画未作成の施設管理者等に対し、電話連絡を実施												
③避難訓練の実施を促進 【次年度の実施予定】 継続して実施する												
0%10%20%30%40%50%60%							70%80%90%100%					
実施済 80%							未実施 20%					
①洪水浸水想定区域内で地域防災計画に載っている全ての要配慮者利用施設の管理者に避難確保計画を作成させる							②避難訓練の実施を促進 【次年度の実施予定】 継続して実施する					
③対象施設数、計画提出済み施設数、避難訓練実施施設数を把握												
0%10%20%30%40%50%60%70%							80%90%100%					
実施済 87%							実施中 13%					
①埼玉県洪水浸水想定区域図の公表により、要配慮者利用施設が1件対象となったため、管理者に避難確保計画を作成させる												
②避難訓練の実施を促進 【次年度の実施予定】 継続して実施する												
③対象施設数、計画提出済み施設数、避難訓練実施施設数を把握 ※ R 2 年度現在、全1施設のうち1施設（100%）が提出済み ※避難訓練実施率は100%（1施設）												
0%10%20%30%40%50%60%70%							80%90%100%					
実施済 73%							実施中 27%					
①洪水浸水想定区域内で地域防災計画に載っている全ての要配慮者利用施設の管理者に避難確保計画を作成させる 【次年度の実施予定】 継続して実施する												
②避難訓練の実施を促進 【次年度の実施予定】 継続して実施する												
③対象施設数、計画提出済み施設数、避難訓練実施施設数を把握 ※ R 2.1 0.3 1 現在、全42施設のうち14施設（約33%）が提出済み 【次年度の実施予定】 継続して実施する												
0%10%20%30%40%50%60%70%							80%90%100%					
実施済 80%							実施中 20%					
①作成が進んでいない市町に働きかけ推進 【次年度の実施予定】 継続して実施する												
0%10%20%30%40%50%60%70%							80%90%100%					
実施済 80%							実施中 20%					
①市町村及び要配慮者利用施設の所有者等に策定の呼びかけ 【次年度の実施予定】 継続して実施する												

取組番号	取組項目
16	浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設等への情報伝達体制の確保

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

協議会全体	取組 総 数	実施済	実施中	未実施	令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ										令和7年度			
		%	%	%	■：実施済 ■：実施中 ■：未実施													
令和3年度	11	10%	37%	53%	令和3年度 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 実施済 10% 実施中 37% 未実施 53%													
令和4年度		30%	33%	37%	実施済 30% 実施中 33% 未実施 37%													
令和5年度		42%	28%	30%	実施済 42% 実施中 28% 未実施 30%													
令和6年度		54%	16%	30%	実施済 54% 実施中 16% 未実施 30%													
令和7年度（予定）		70%	20%	10%	実施済 70% 実施中 20% 未実施 10%													

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		30%	20%	50%
	令和6年度		40%	10%	50%
	令和7年度（予定）		50%	0%	50%
藤 岡 市	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		70%	30%	0%
	令和5年度		80%	20%	0%
	令和6年度		90%	10%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉 村 町	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		30%	20%	50%
	令和6年度		40%	10%	50%
	令和7年度（予定）		60%	40%	0%
神 川 町	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		30%	20%	50%
	令和6年度		40%	10%	50%
	令和7年度（予定）		60%	40%	0%
上 里 町	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		20%	47%	33%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

令和6年度 取組実施内容		実施済・実施中の取組	未実施の取組
高 崎 市	①要配慮者利用施設（福祉施設、幼稚園、保育所、介護施設）への連絡網の確認・更新 【次年度の実施予定】 継続して実施する	0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 実施済 40% 実施中 10% 未実施 50%	②情報伝達訓練 【取組を実施する上での課題】 対象となる要配慮者利用施設数が多いことと、施設側の業務時間内に訓練を行うことが困難
	②避難確保計画の作成を誘導		
藤 岡 市	①HP等にて、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を周知 【次年度の実施予定】 継続して実施する	0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 実施済 90% 実施中 10%	
	②情報伝達訓練 【次年度の実施予定】 継続して実施する		
玉 村 町	①要配慮者利用施設（福祉施設、幼稚園、保育所、介護施設）への連絡体制の確認・更新 【次年度の実施予定】 継続して実施する	0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 実施済 40% 実施中 10% 未実施 50%	②情報伝達訓練 【次年度の実施予定】 継続して実施する
	②情報伝達訓練 【次年度の実施予定】 継続して実施する		
神 川 町	①要配慮者利用施設（福祉施設、幼稚園、保育所、介護施設）への連絡体制の確認・更新 【次年度の実施予定】 継続して実施する	0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 実施済 40% 実施中 10% 未実施 50%	②情報伝達訓練 【次年度の実施予定】 継続して実施する
	②情報伝達訓練 【次年度の実施予定】 継続して実施する		
上 里 町	①要配慮者利用施設（福祉施設、幼稚園、保育所、介護施設）への連絡体制の確認・更新 【次年度の実施予定】 継続して実施する	0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 実施済 60% 実施中 40%	
	②庁舎内情報共有体制の確認と更新 【次年度の実施予定】 継続して実施する		
上 里 町	③情報伝達訓練 【次年度の実施予定】 継続して実施する		

取組番号	取組項目
17	洪水時におけるホットライン


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

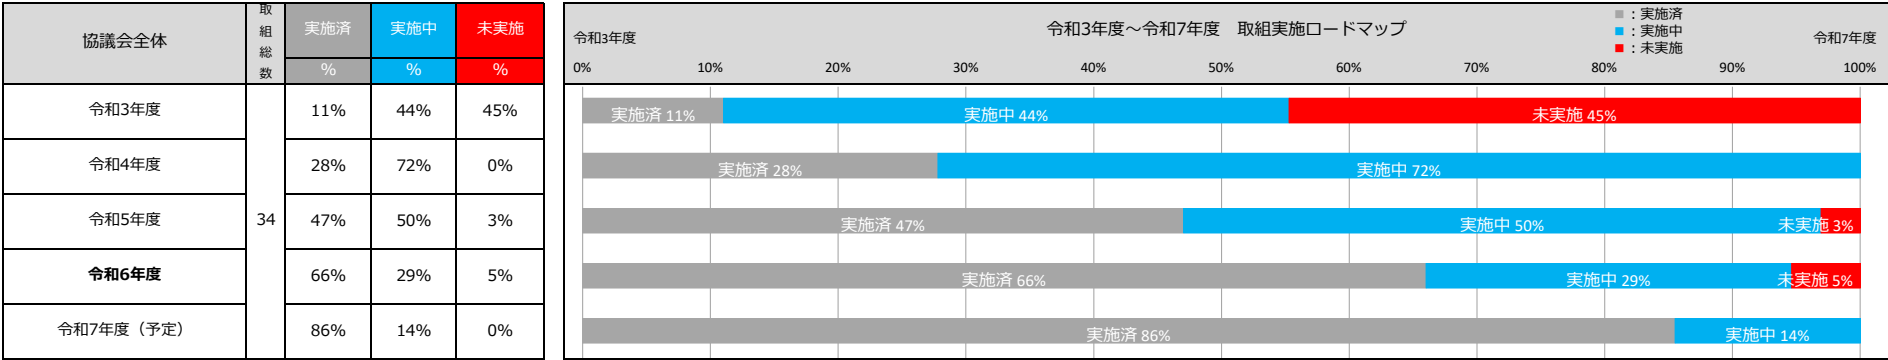

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高崎市	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		27%	73%	0%
	令和5年度		47%	53%	0%
	令和6年度		67%	33%	0%
	令和7年度（予定）		87%	13%	0%
藤岡市	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		30%	70%	0%
	令和5年度		50%	50%	0%
	令和6年度		70%	30%	0%
	令和7年度（予定）		90%	10%	0%
玉村町	令和3年度	3	14%	53%	33%
	令和4年度		33%	67%	0%
	令和5年度		53%	47%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		93%	7%	0%
神川町	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		27%	73%	0%
	令和5年度		47%	53%	0%
	令和6年度		67%	33%	0%
	令和7年度（予定）		87%	13%	0%
上里町	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		27%	73%	0%
	令和5年度		47%	53%	0%
	令和6年度		67%	33%	0%
	令和7年度（予定）		87%	13%	0%
群馬県	令和3年度	3	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
埼玉県	令和3年度	3	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

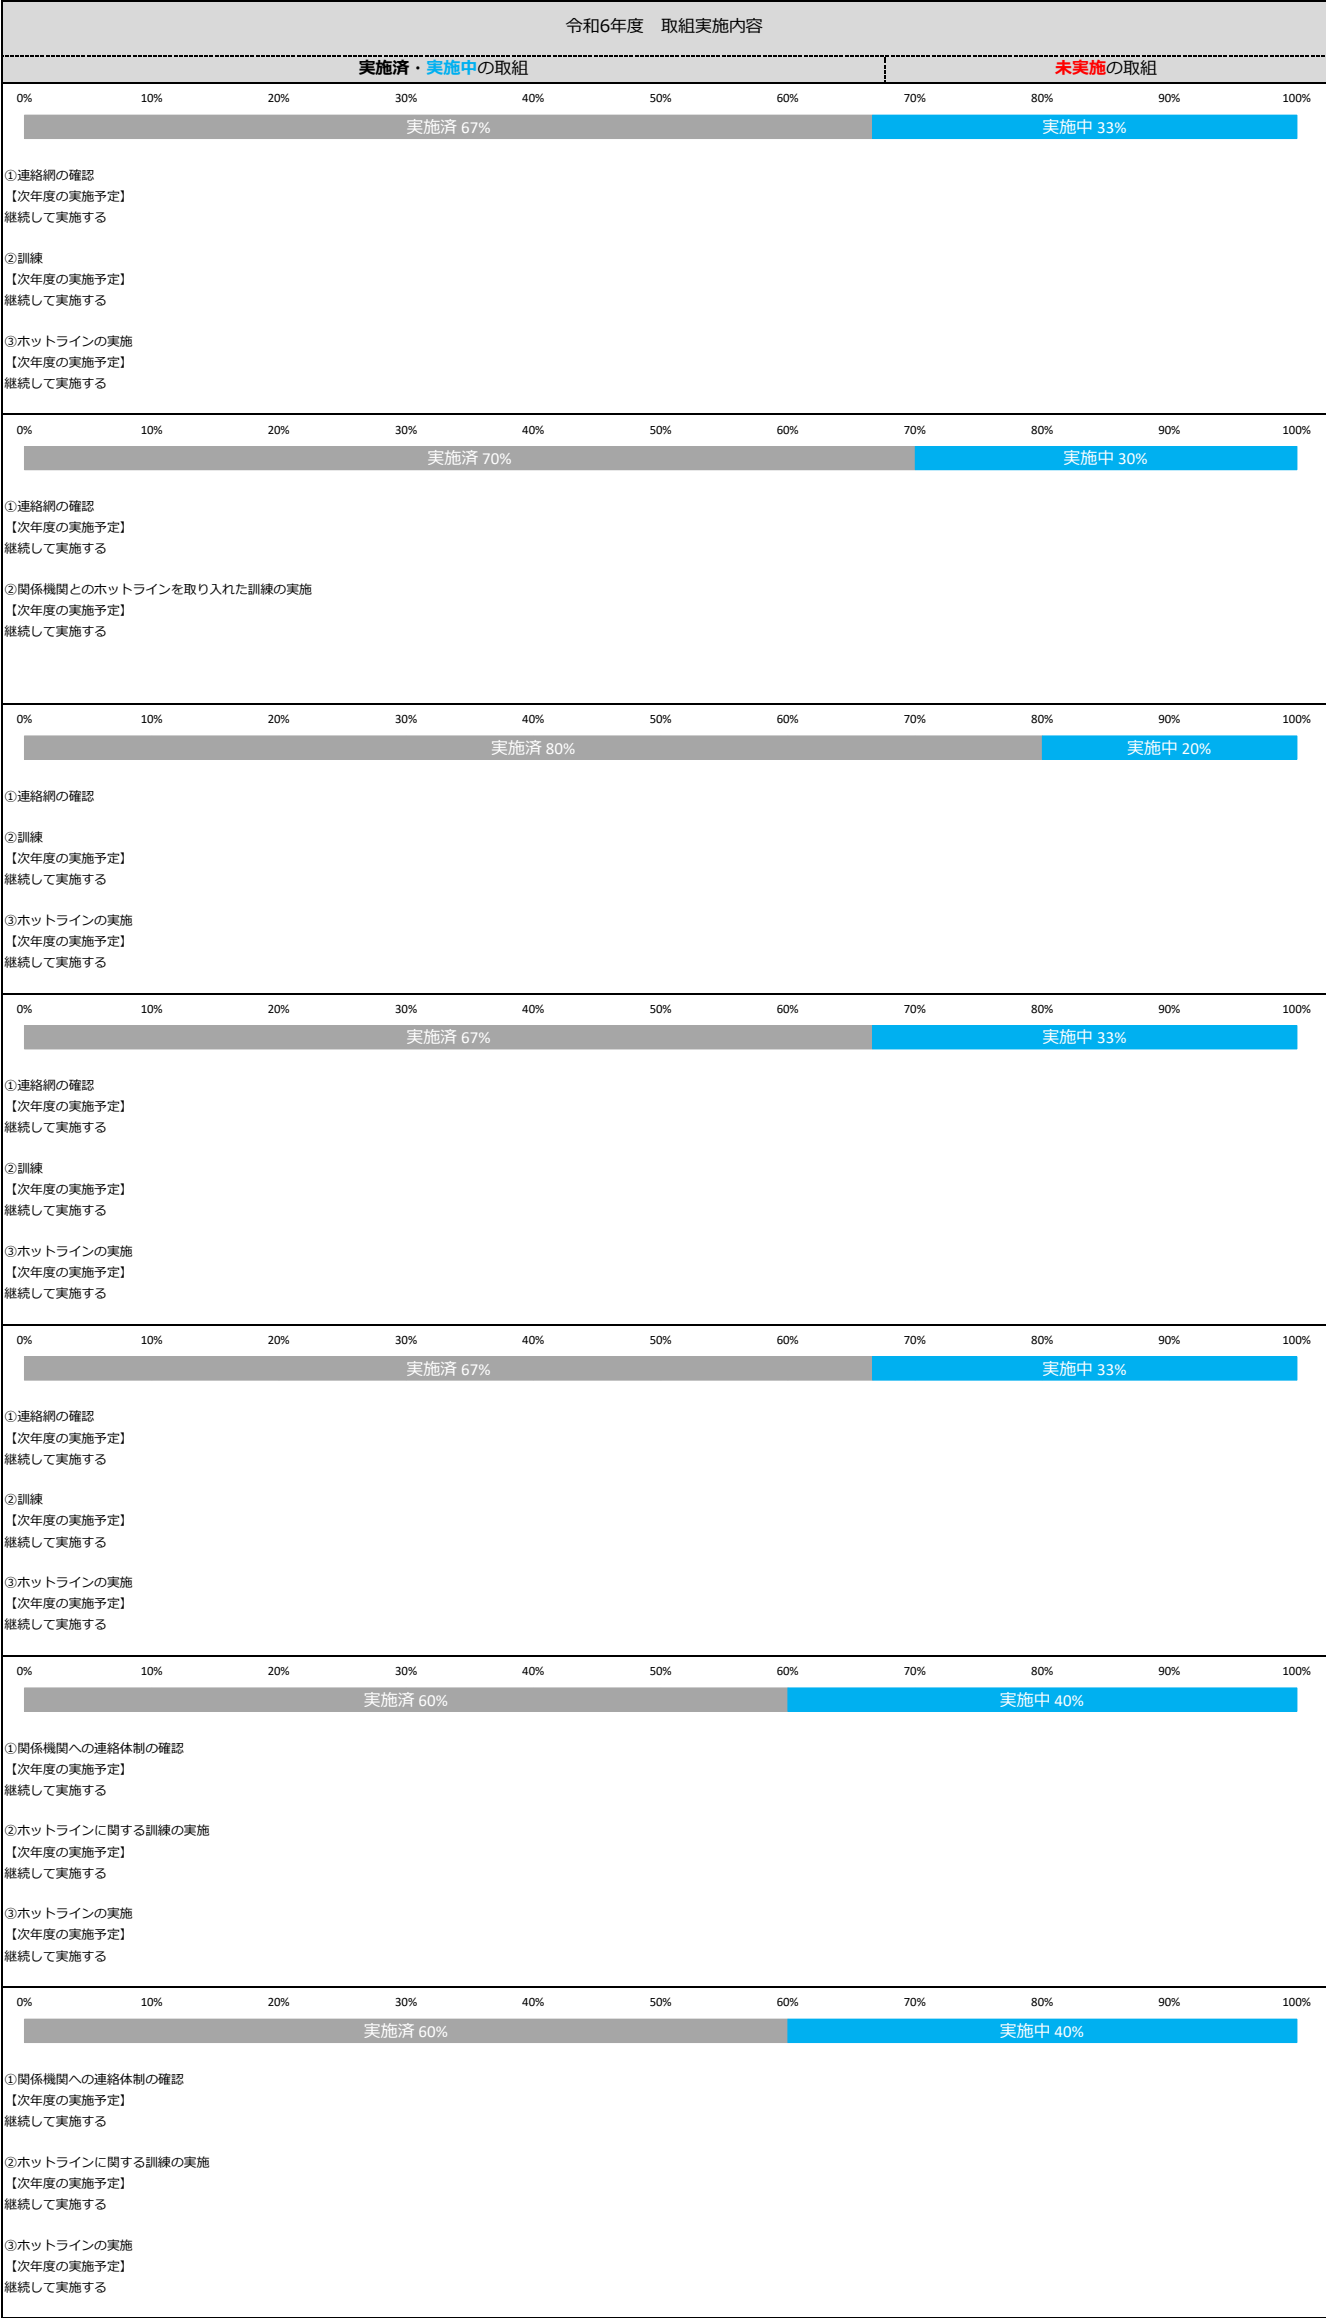

取組番号	取組項目
17	洪水時におけるホットライン

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

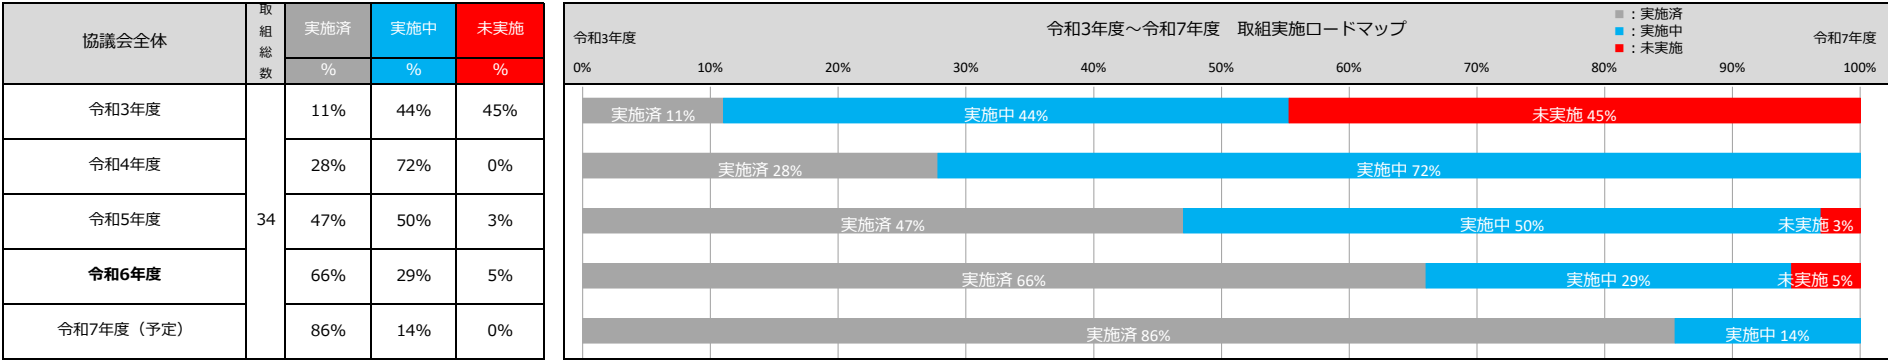

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
下久保ダム管理所	令和3年度	3	14%	53%	33%
	令和4年度		33%	67%	0%
	令和5年度		53%	47%	0%
	令和6年度		73%	27%	0%
	令和7年度（予定）		93%	7%	0%
前橋地方気象台	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		30%	70%	0%
	令和5年度		50%	50%	0%
	令和6年度		70%	30%	0%
	令和7年度（予定）		90%	10%	0%
熊谷地方気象台	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		30%	70%	0%
	令和5年度		50%	50%	0%
	令和6年度		70%	30%	0%
	令和7年度（予定）		90%	10%	0%
J R 高崎支社	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上信電鉄	令和3年度	2	0%	0%	100%
	令和4年度		20%	80%	0%
	令和5年度		30%	30%	40%
	令和6年度		30%	0%	70%
	令和7年度（予定）		50%	50%	0%
国道事務所 高崎河川	令和3年度	4	5%	20%	75%
	令和4年度		25%	75%	0%
	令和5年度		45%	55%	0%
	令和6年度		65%	35%	0%
	令和7年度（予定）		85%	15%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）



取組番号	取組項目
18	市町のまちづくり担当部局等に対し、水害リスク情報を提供

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

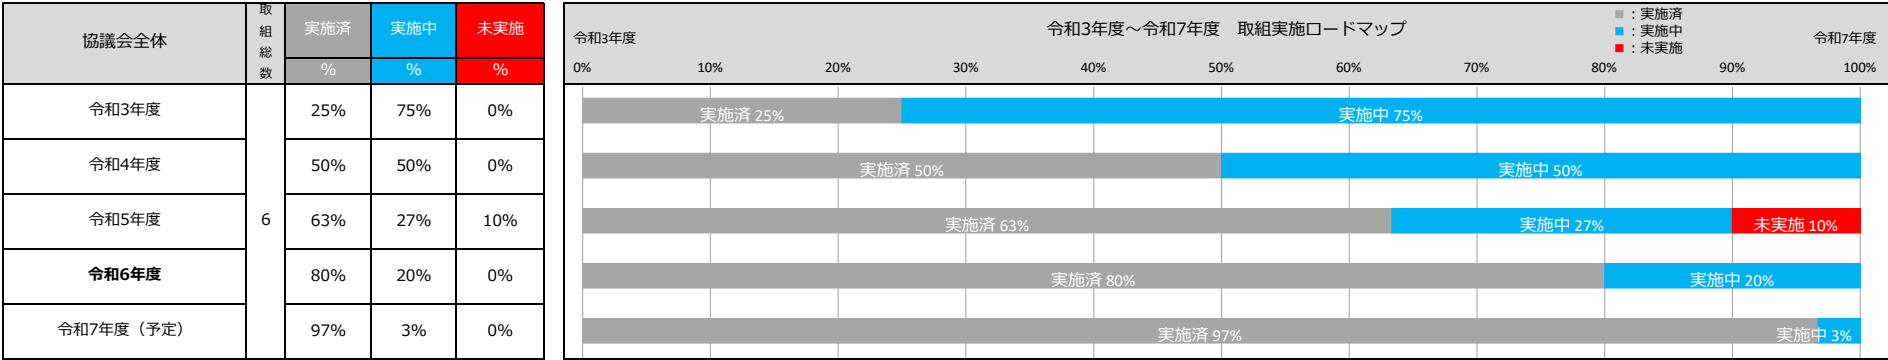

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
藤 岡 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉 村 町	令和3年度	1	50%	50%	0%
	令和4年度		100%	0%	0%
	令和5年度		100%	0%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
神 川 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上 里 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
国 道 事 務 所 高 崎 河 川	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		40%	0%	60%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）



取組番号	取組項目
19	不動産関連事業者に対し、不動産関係団体の研修会等で水害リスク情報を提供


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

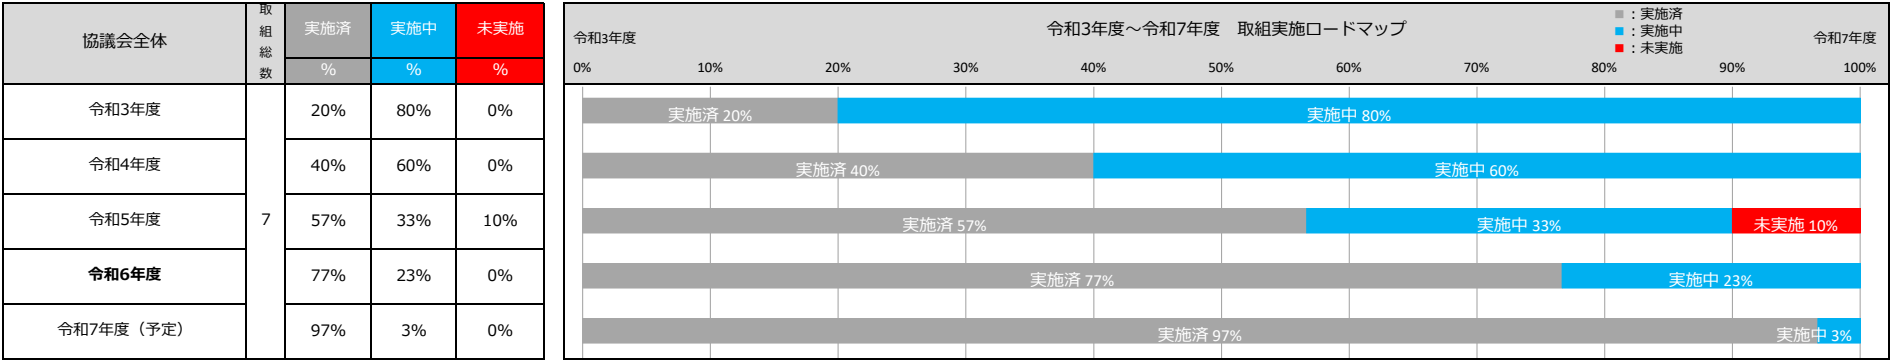

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関	取組 総 数	実施済	実施中	未実施
		%	%	%
高 崎 市	令和3年度	20%	80%	0%
	令和4年度	40%	60%	0%
	令和5年度	60%	40%	0%
	令和6年度	80%	20%	0%
	令和7年度（予定）	100%	0%	0%
藤 岡 市	令和3年度	20%	80%	0%
	令和4年度	40%	60%	0%
	令和5年度	60%	40%	0%
	令和6年度	80%	20%	0%
	令和7年度（予定）	100%	0%	0%
玉 村 町	令和3年度	20%	80%	0%
	令和4年度	40%	60%	0%
	令和5年度	60%	40%	0%
	令和6年度	80%	20%	0%
	令和7年度（予定）	100%	0%	0%
神 川 町	令和3年度	20%	80%	0%
	令和4年度	40%	60%	0%
	令和5年度	60%	40%	0%
	令和6年度	80%	20%	0%
	令和7年度（予定）	100%	0%	0%
上 里 町	令和3年度	20%	80%	0%
	令和4年度	40%	60%	0%
	令和5年度	60%	40%	0%
	令和6年度	80%	20%	0%
	令和7年度（予定）	100%	0%	0%
国 道 事 務 所	令和3年度	20%	80%	0%
	令和4年度	40%	60%	0%
	令和5年度	40%	0%	60%
	令和6年度	60%	40%	0%
	令和7年度（予定）	80%	20%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

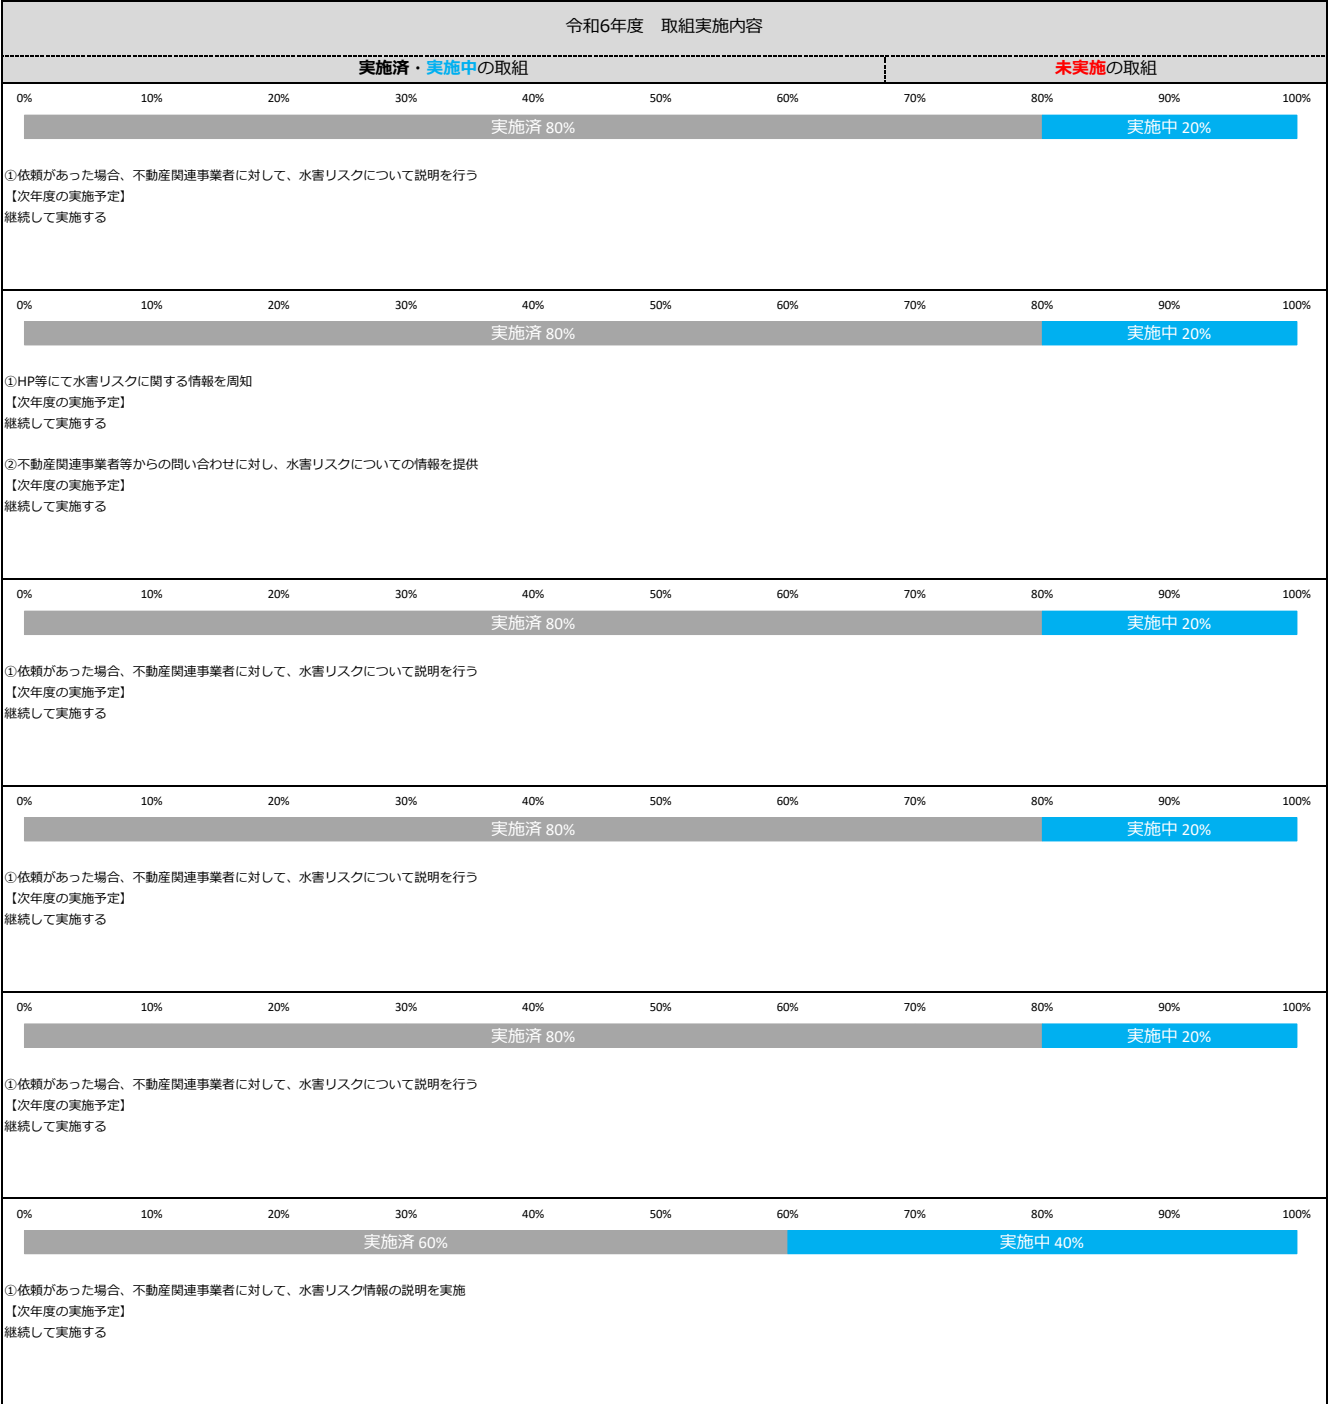

取組番号	取組項目
20	市町・自主防災組織等による要配慮者の避難支援体制の推進


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

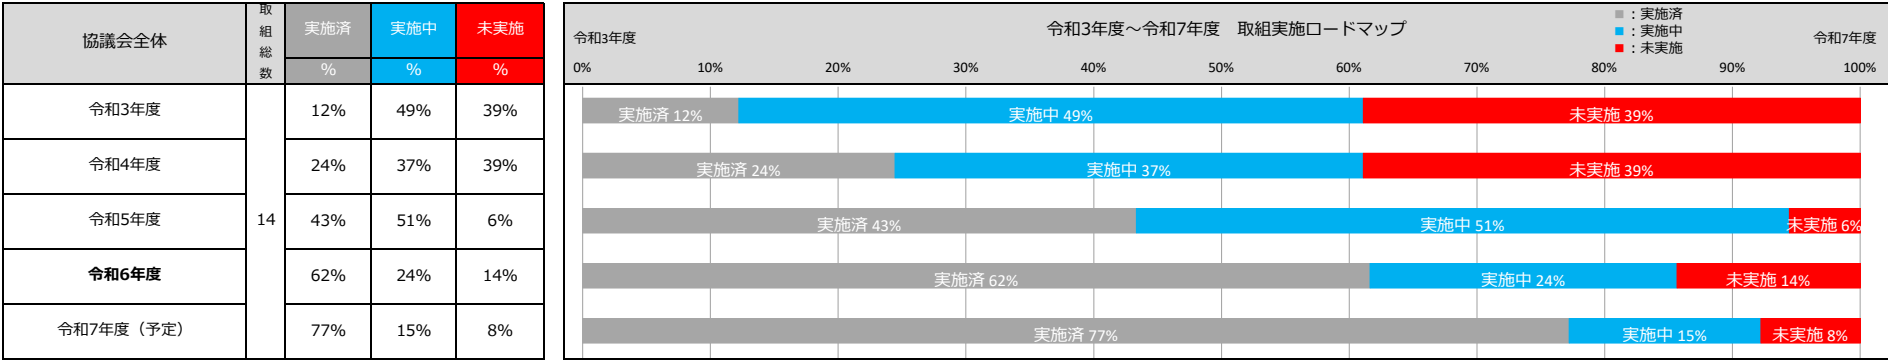

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高崎市	令和3年度	3	14%	53%	33%
	令和4年度		27%	40%	33%
	令和5年度		40%	27%	33%
	令和6年度		53%	0%	47%
	令和7年度（予定）		53%	0%	47%
藤岡市	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
玉村町	令和3年度	4	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		65%	35%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
神川町	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		50%	10%	40%
	令和7年度（予定）		70%	30%	0%
上里町	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
埼玉県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

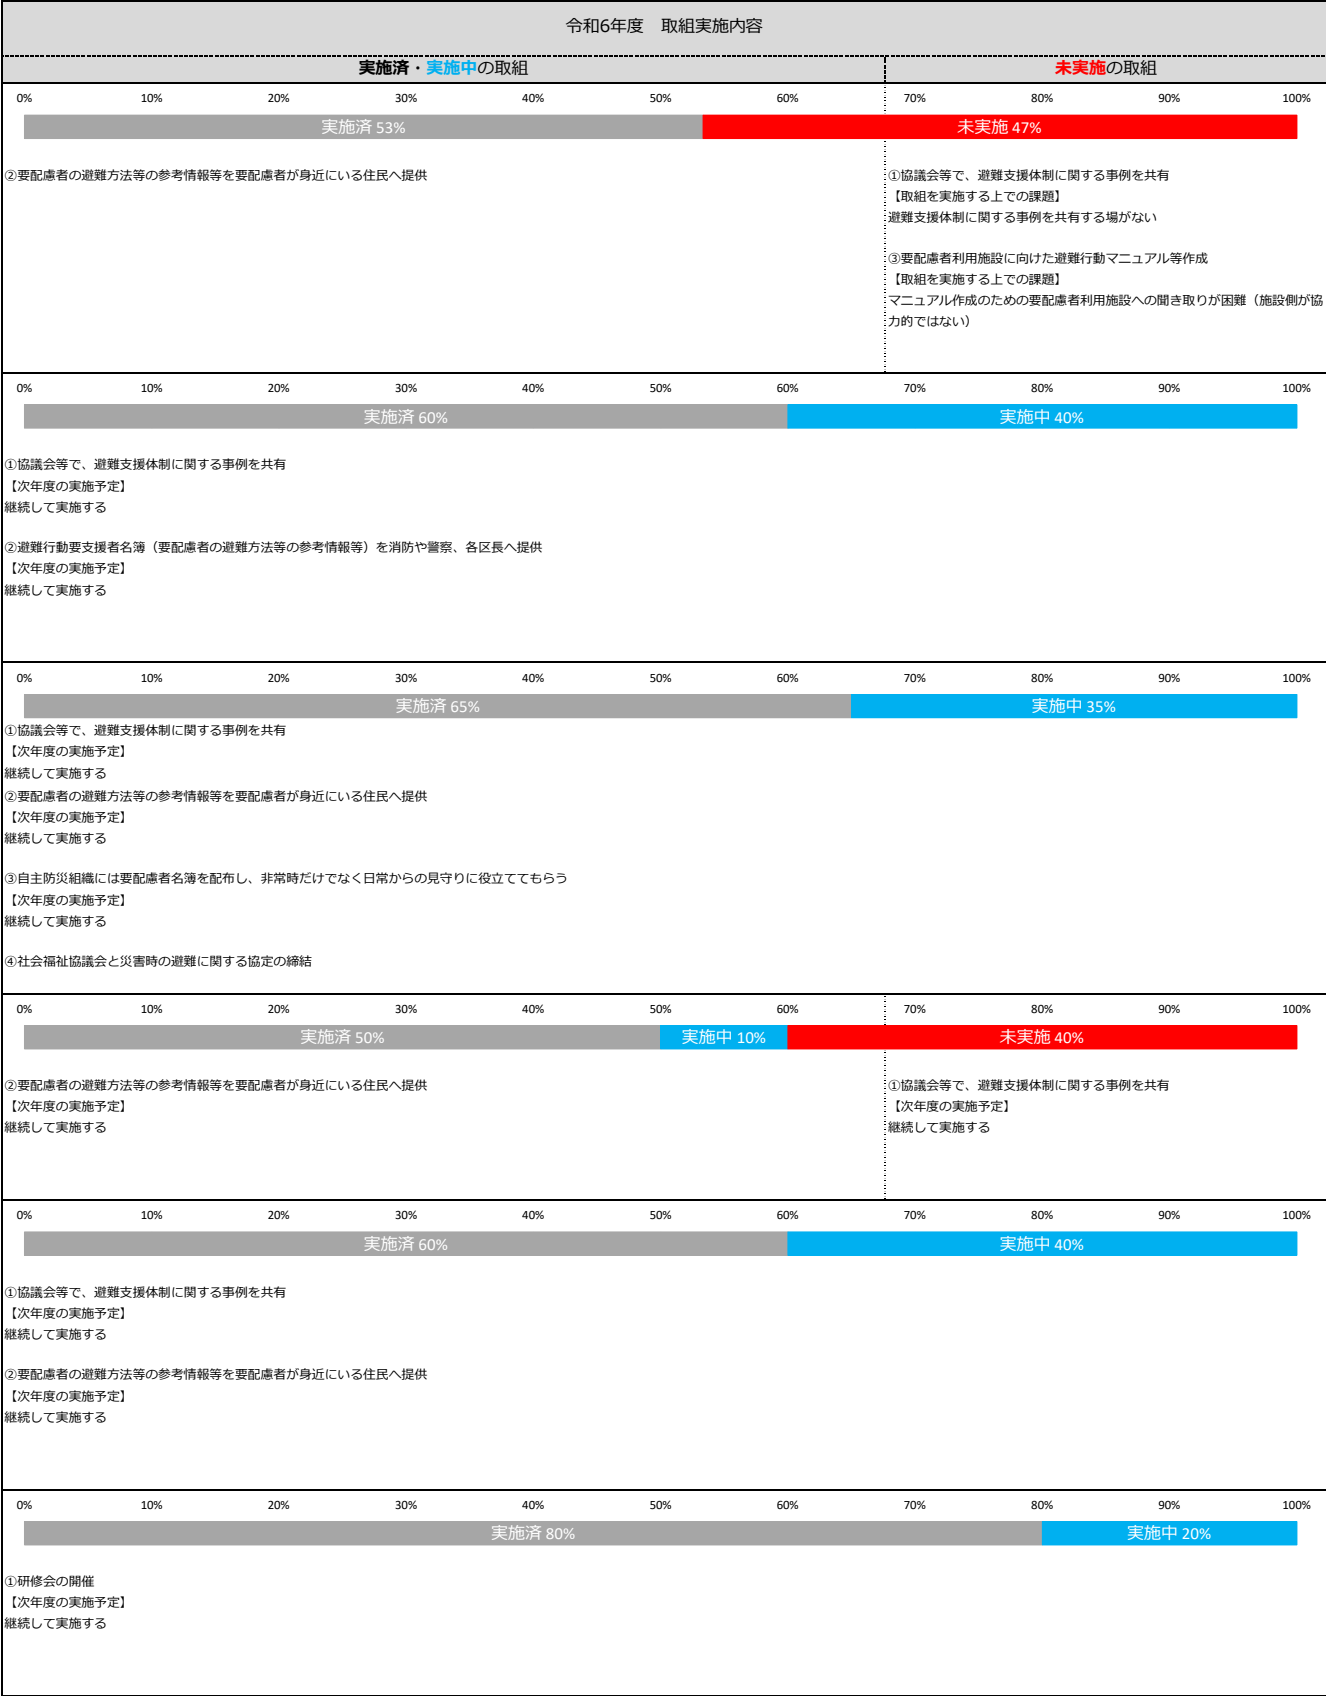

取組番号	取組項目
21	避難場所（避難所）改善検討


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

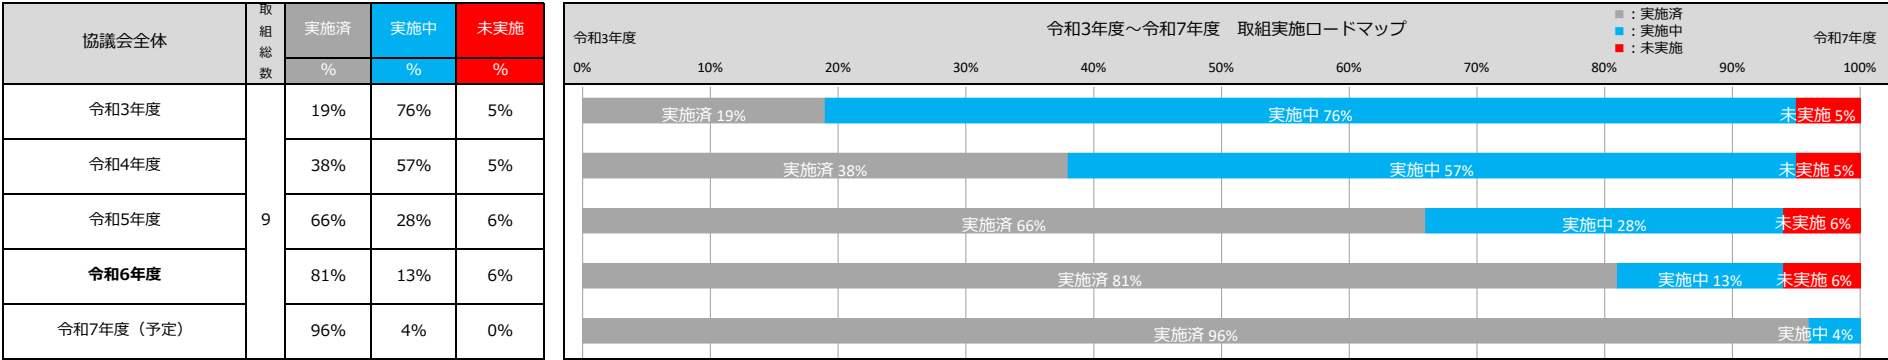

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
藤 岡 市	令和3年度	4	15%	60%	25%
	令和4年度		30%	45%	25%
	令和5年度		80%	20%	0%
	令和6年度		95%	5%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉 村 町	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		70%	0%	30%
	令和6年度		70%	0%	30%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
神 川 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上 里 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

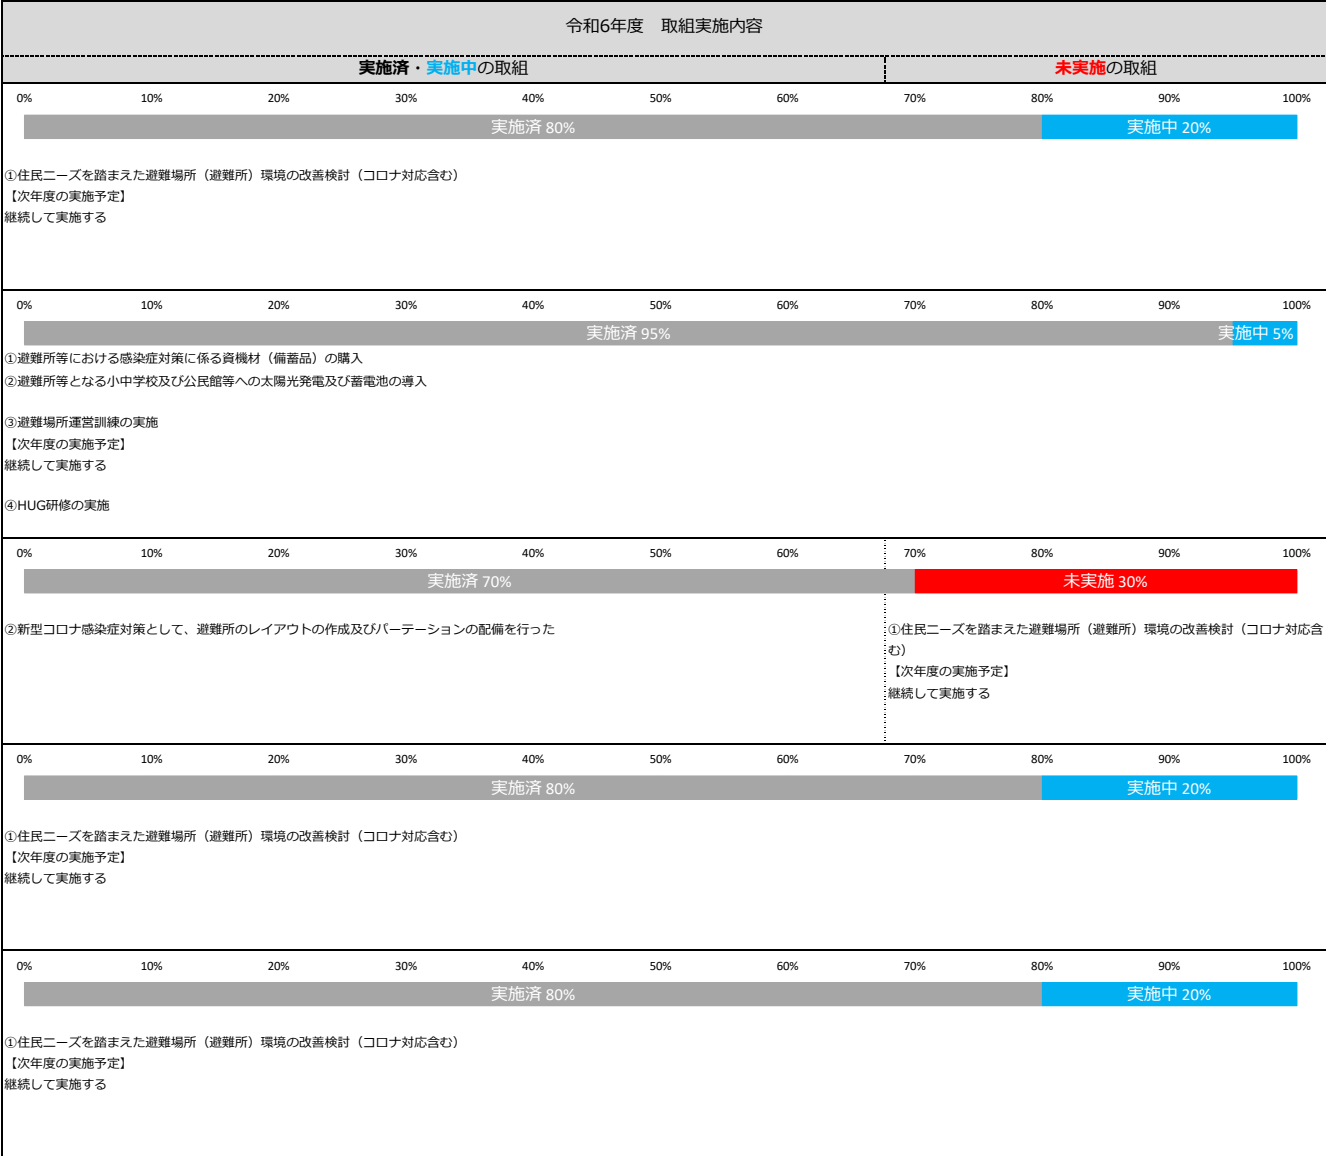

取組番号	取組項目
22	想定し得る最大規模降雨による洪水浸水想定区域に基づく、洪水ハザードマップの普及・啓発

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

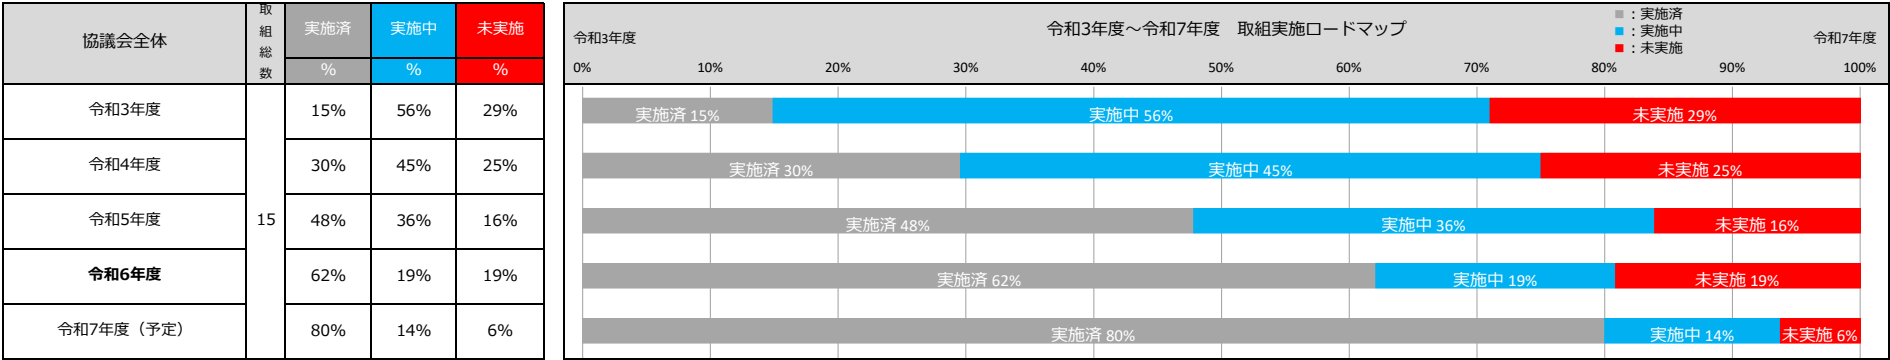

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		30%	20%	50%
	令和6年度		40%	10%	50%
	令和7年度（予定）		50%	0%	50%
藤 岡 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉 村 町	令和3年度	3	8%	25%	67%
	令和4年度		17%	17%	66%
	令和5年度		47%	53%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		73%	27%	0%
神 川 町	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		20%	47%	33%
	令和5年度		34%	33%	33%
	令和6年度		47%	20%	33%
	令和7年度（予定）		67%	33%	0%
上 里 町	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
群 馬 県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
埼 玉 県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
国 道 事 務 所	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		30%	20%	50%
	令和6年度		30%	0%	70%
	令和7年度（予定）		50%	50%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）



取組番号	取組項目
23	気象庁で提供する防災気象情報活用に向けた普及・啓発

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

協議会全体	取組 総 数	実施済	実施中	未実施	令和3年度	令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ														令和7年度
		%	%	%		0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%				
令和3年度	2	20%	80%	0%																
令和4年度		40%	60%	0%																
令和5年度		60%	40%	0%																
令和6年度		80%	20%	0%																
令和7年度（予定）		100%	0%	0%																

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
前橋地方気象台	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
熊谷地方気象台	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%


●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

令和6年度 取組実施内容		実施済・実施中の取組	未実施の取組
前橋地方気象台	令和6年度	80%	20%
	令和7年度（予定）	100%	0%
熊谷地方気象台	令和6年度	80%	20%
	令和7年度（予定）	100%	0%

①気象庁が提供する防災気象情報の周知（「早期注意情報（警報級の可能性）」、「危険度を色分けした時系列」、「大雨・洪水警報の危険度分布」等）
【次年度の実施予定】
継続して実施する

取組番号	取組項目
24	地域の自主的な避難につながる避難訓練等の実施


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

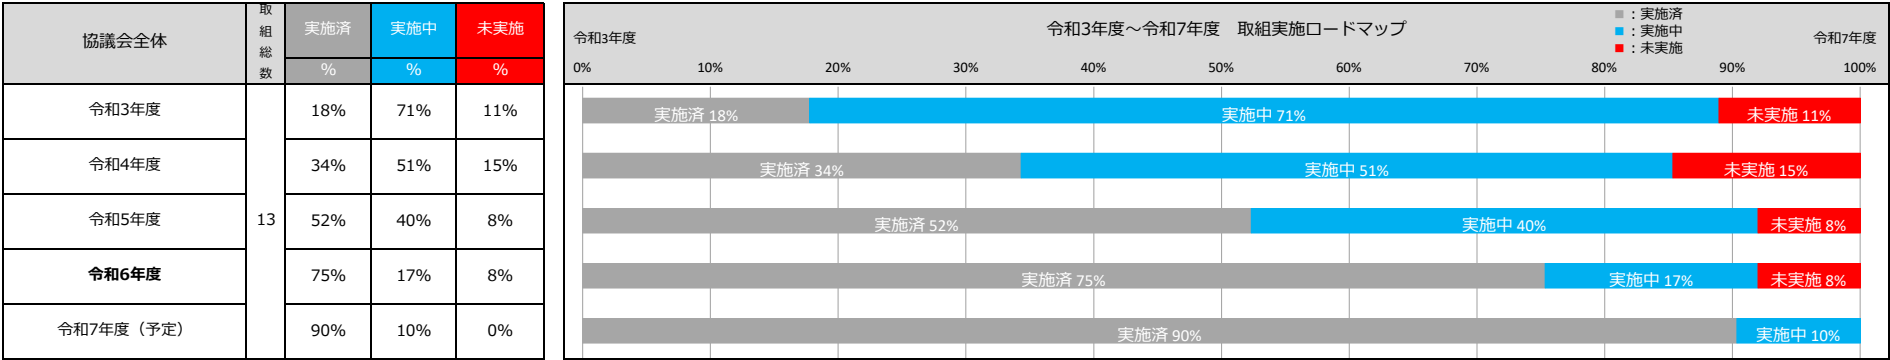

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
藤 岡 市	令和3年度	4	15%	60%	25%
	令和4年度		35%	65%	0%
	令和5年度		55%	45%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		95%	5%	0%
玉 村 町	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
神 川 町	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		30%	30%	40%
	令和5年度		40%	20%	40%
	令和6年度		50%	10%	40%
	令和7年度（予定）		70%	30%	0%
上 里 町	令和3年度	3	14%	53%	33%
	令和4年度		27%	40%	33%
	令和5年度		47%	53%	0%
	令和6年度		67%	33%	0%
	令和7年度（予定）		87%	13%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

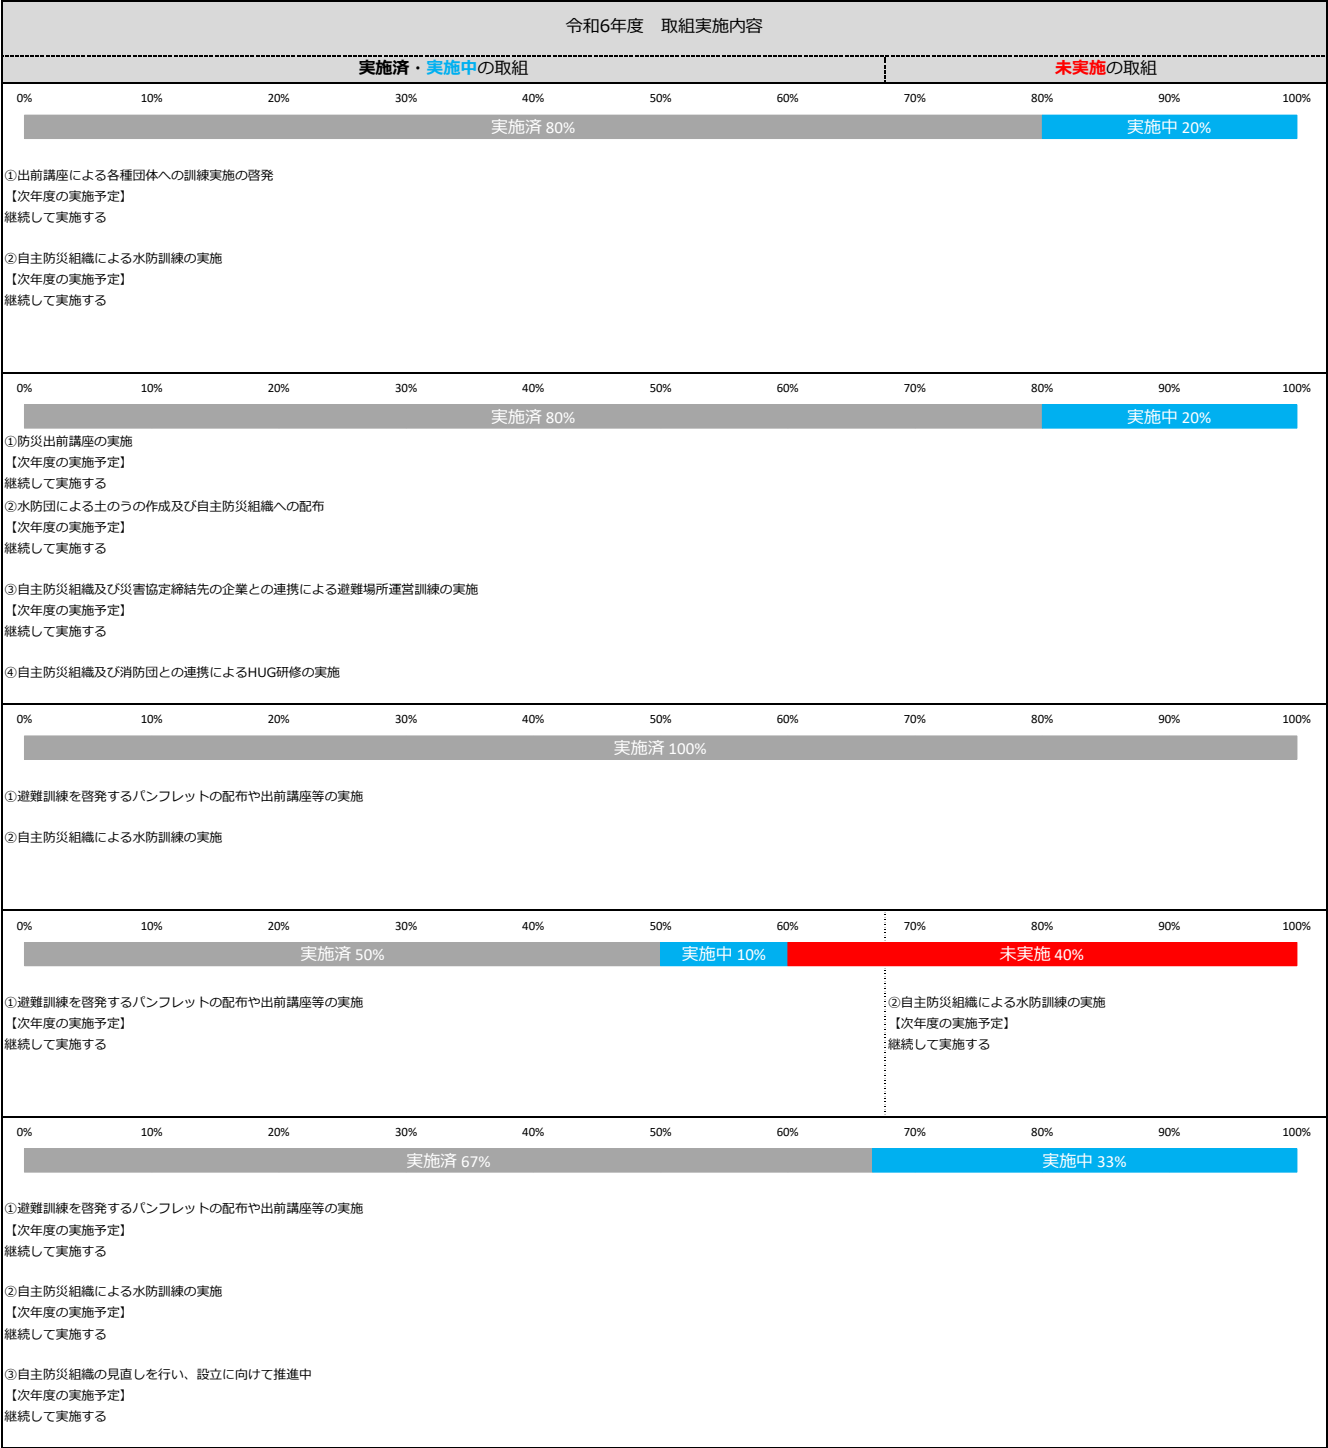

取組番号	取組項目
25	自主防災組織の維持と避難誘導者の担い手の指定・育成

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

協議会全体	取組 総 数	実施済	実施中	未実施	令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ										令和7年度			
		%	%	%														
令和3年度	14	15%	60%	25%														
令和4年度		32%	53%	15%														
令和5年度		52%	48%	0%														
令和6年度		76%	22%	2%														
令和7年度（予定）		94%	6%	0%														

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高崎市	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
藤岡市	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉村町	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		20%	47%	33%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		87%	0%	13%
	令和7年度（予定）		93%	7%	0%
神川町	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上里町	令和3年度	3	14%	53%	33%
	令和4年度		20%	20%	60%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
群馬県	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		30%	70%	0%
	令和5年度		50%	50%	0%
	令和6年度		70%	30%	0%
	令和7年度（予定）		90%	10%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

令和6年度 取組実施内容												
実施済・実施中の取組							未実施の取組					
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%												
実施済 80%							実施中 20%					
①自主防災組織率向上や避難誘導者育成のための出前講座の実施 ※自主防災組織率：約80％ 【次年度の実施予定】 継続して実施する ②自主防災組織への支援（結成時：20万円上限の補助、訓練時：10万円上限の補助） 【次年度の実施予定】 継続して実施する												
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%												
実施済 80%							実施中 20%					
①自主防災組織員の知識向上や避難誘導者育成のための出前講座の実施 ※自主防災組織率：100％（全79行政区） 【次年度の実施予定】 継続して実施する ②自主防災組織への支援（資器材購入費として、最大5万円（補助率2分の1）） 【次年度の実施予定】 継続して実施する												
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%												
実施済 87%							未実施 13%					
①自主防災組織率向上や避難誘導者育成のための出前講座の実施 ※自主防災組織率（R 2年度）：100％（全25地区）令和3年度より新たに行政区（南福島）が発足するので、自主防災組織の組織を支援する ②自主防災組織への支援（訓練経費に対する補助金支給）							③群馬県と連携し、防災士を増やす取り組みを実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する					
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%												
実施済 80%							実施中 20%					
①自主防災組織率向上や避難誘導者育成のための出前講座の実施 ※自主防災組織率は14％（8団体、世帯数の占める割合） 【次年度の実施予定】 継続して実施する ②自主防災組織への支援（活動補助金や、資機材購入の補助） 【次年度の実施予定】 継続して実施する												
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%												
実施済 60%							実施中 40%					
①自主防災組織率向上や避難誘導者育成のための出前講座の実施 ※自主防災組織率：16％（5組織／31行政区） 【次年度の実施予定】 継続して実施する ②自主防災組織への支援（立ち上げ支援、水防資機材の補助） 【次年度の実施予定】 継続して実施する ③自主防災組織の防災リーダーの指定、育成 【次年度の実施予定】 継続して実施する												
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%												
実施済 70%							実施中 30%					
①自主防災組織のリーダーとして活躍できる人材の育成・発掘を目的に県民防災塾、「ぐんま地域防災アドバイザー」の拡充及び育成を図るため、「防災士」を養成する「ぐんま地域防災アドバイザー防災士養成講座」を開催 ※自主防災組織率：91.7％（R 2.4 現在） 【次年度の実施予定】 継続して実施する ②水防団の人数、年齢構成を把握 【次年度の実施予定】 継続して実施する												

取組番号	取組項目
26	防災知識の向上のための住民等への説明会・出前講座等の開催


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

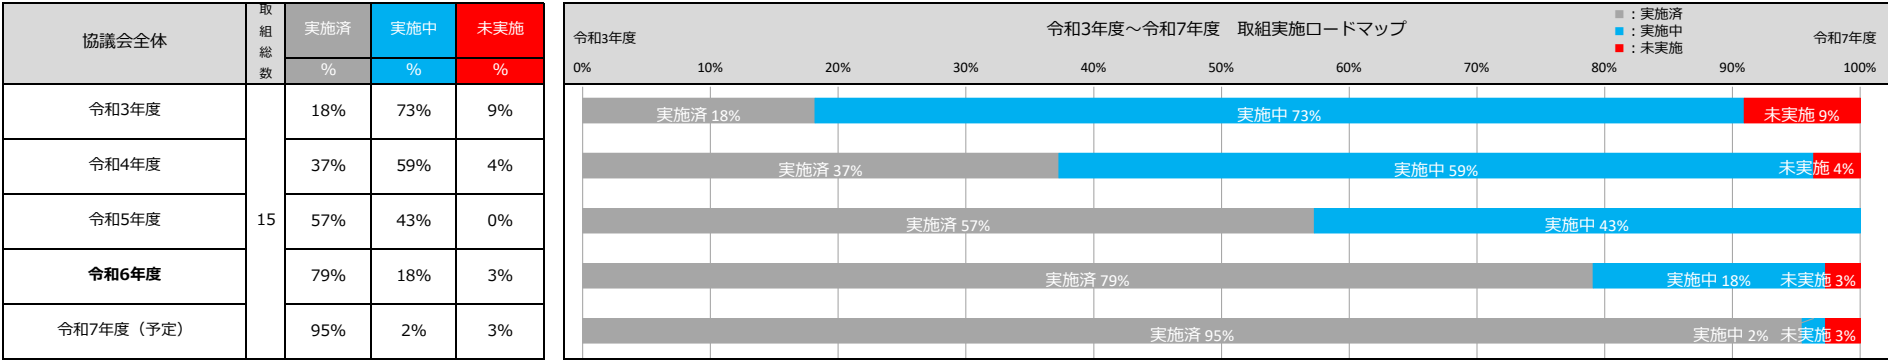

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		30%	30%	40%
	令和5年度		50%	50%	0%
	令和6年度		60%	10%	30%
	令和7年度（予定）		70%	0%	30%
藤 岡 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉 村 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
神 川 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上 里 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
群 馬 県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
埼 玉 県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
下 久 保 ダ ム 管 理 所	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

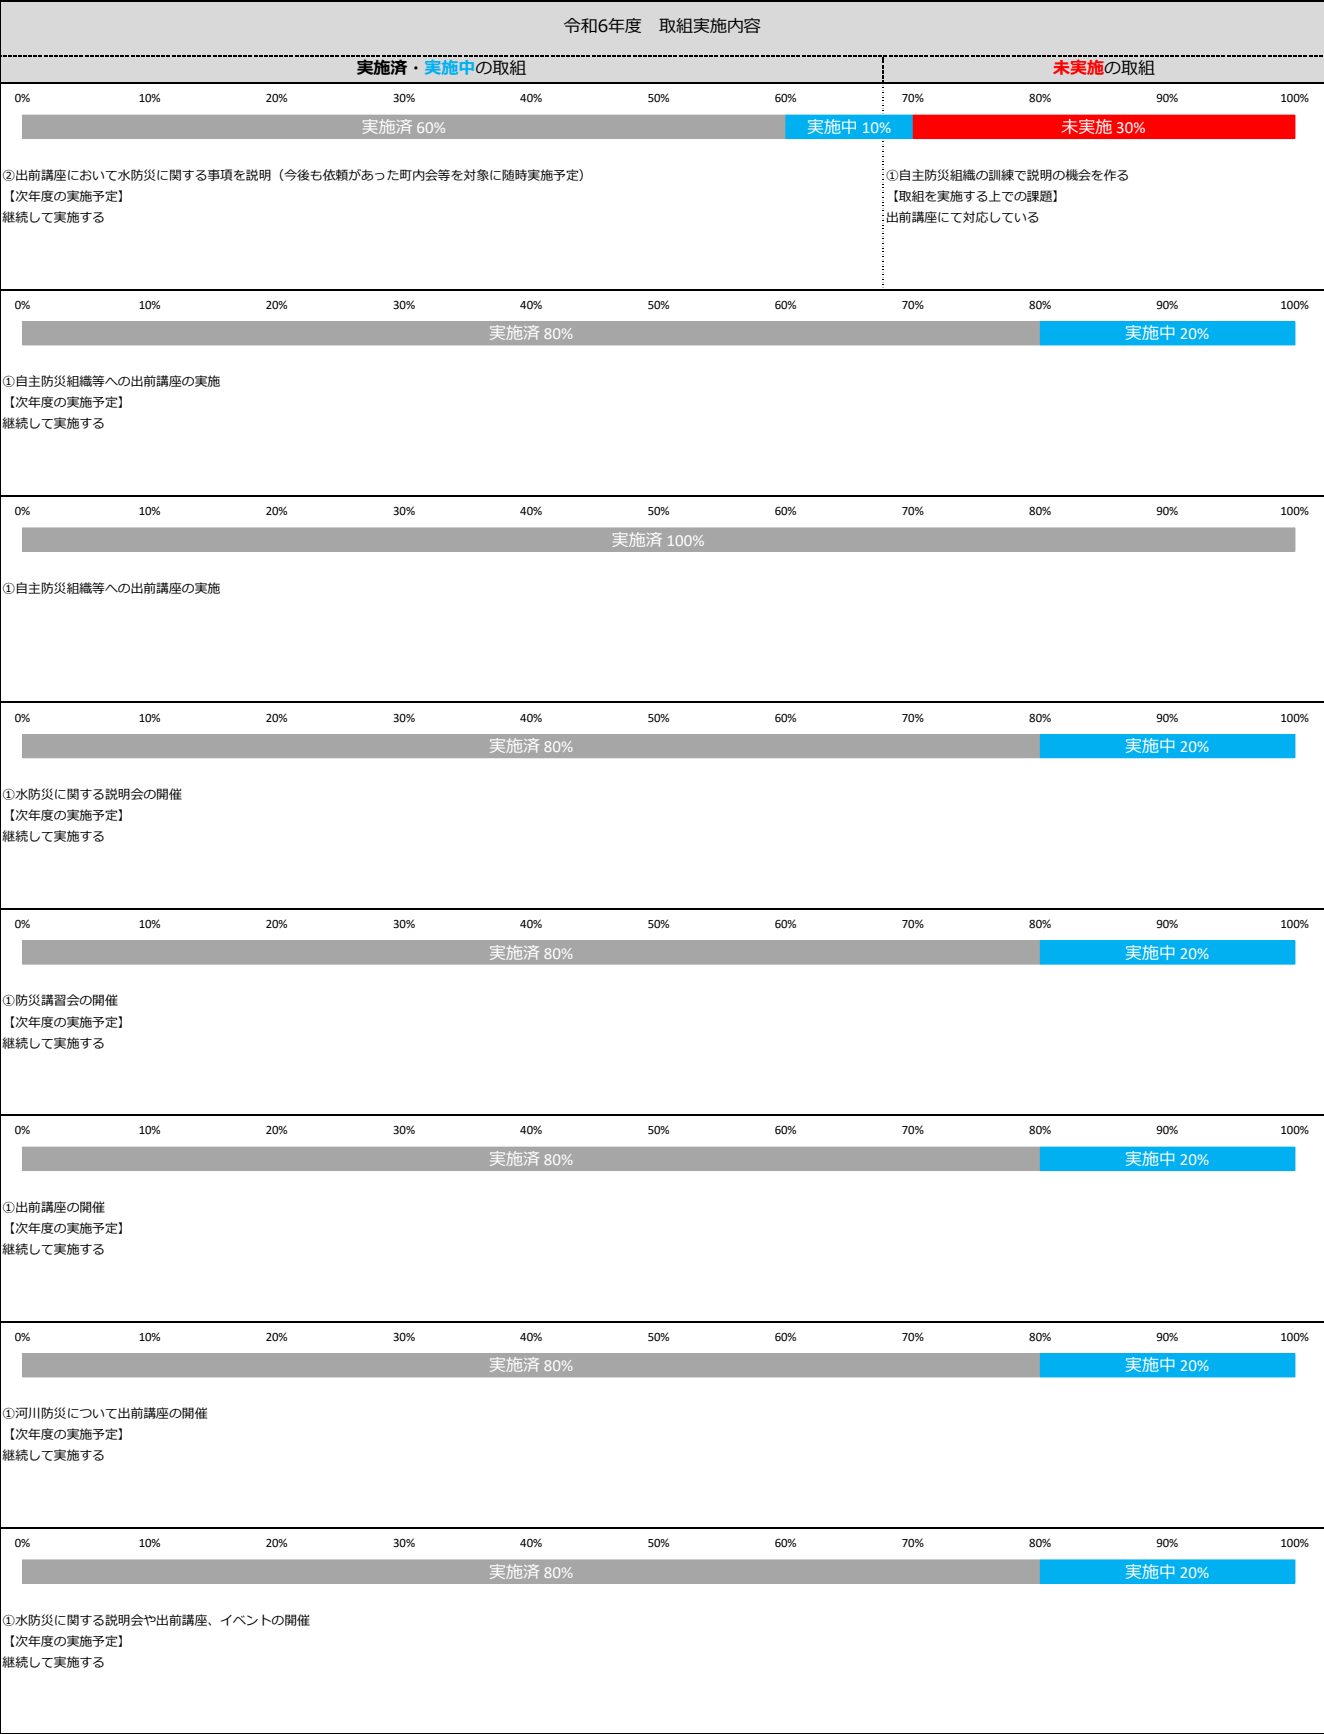

取組番号	取組項目
26	防災知識の向上のための住民等への説明会・出前講座等の開催

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

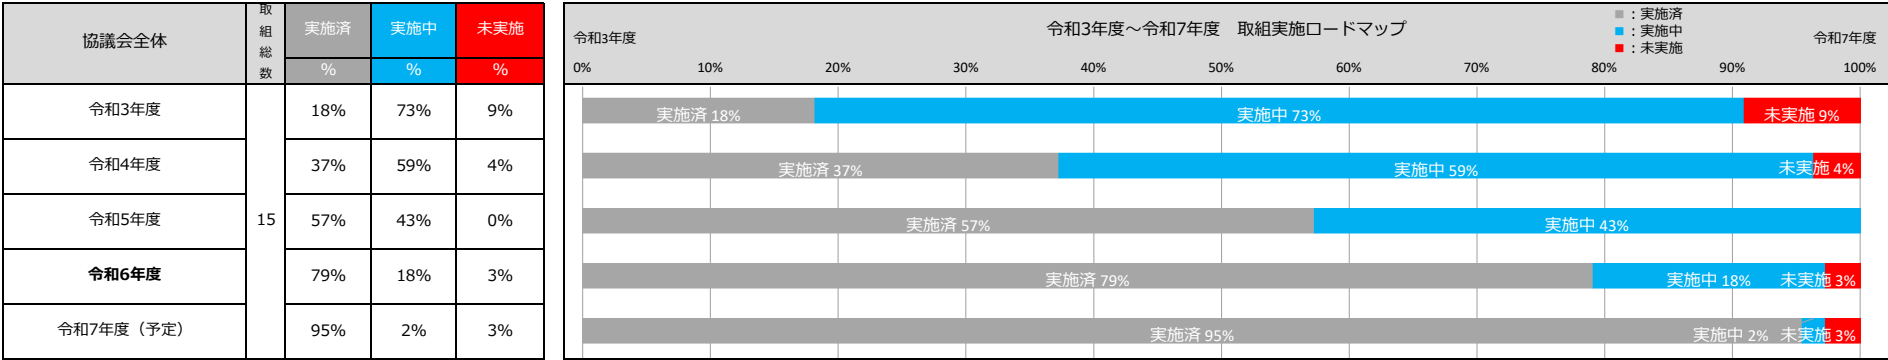

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
前橋 地方 気 象 台	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		30%	70%	0%
	令和5年度		50%	50%	0%
	令和6年度		70%	30%	0%
	令和7年度（予定）		90%	10%	0%
熊谷 地方 気 象 台	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
国 道 事 務 所 高 崎 河 川	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		30%	70%	0%
	令和5年度		50%	50%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		90%	10%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）



取組番号	取組項目
27	浸水想定区域内の小中学校等における水防災教育の実施

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

協議会全体	取組 総 数	実施済	実施中	未実施	令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ										令和7年度
		%	%	%											
令和3年度	19	11%	44%	45%											
令和4年度		26%	50%	24%											
令和5年度		38%	32%	30%											
令和6年度		56%	27%	17%											
令和7年度（予定）		74%	23%	3%											

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		40%	0%	60%
	令和6年度		50%	20%	30%
	令和7年度（予定）		60%	10%	30%
藤 岡 市	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
玉 村 町	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		13%	20%	67%
	令和5年度		13%	0%	87%
	令和6年度		33%	0%	67%
	令和7年度（予定）		47%	53%	0%
神 川 町	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	40%	40%
	令和5年度		30%	30%	40%
	令和6年度		40%	20%	40%
	令和7年度（予定）		60%	40%	0%
上 里 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
群 馬 県	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		30%	70%	0%
	令和5年度		50%	50%	0%
	令和6年度		70%	30%	0%
	令和7年度（予定）		90%	10%	0%
埼 玉 県	令和3年度	2	0%	0%	100%
	令和4年度		10%	40%	50%
	令和5年度		30%	70%	0%
	令和6年度		50%	50%	0%
	令和7年度（予定）		70%	30%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

令和6年度 取組実施内容		実施済・実施中の取組	未実施の取組
②小学校等における水防災の授業等の実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する	①教育委員会と協議 【取組を実施する上での課題】 先生方の防災意識と対象施設数の多さ	0%	100%
		実施済 50%	実施中 20% 未実施 30%
①防災教育として教育委員会で実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する	②小中学校等における水防災の授業等の実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する	0%	100%
		実施済 60%	実施中 40%
③小学生を対象とした避難所体験を実施	①教育委員会と協議 【次年度の実施予定】 継続して実施する ②小学校等における水防災の授業等の実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する	0%	100%
		実施済 33%	未実施 67%
②小学校等における水防災の授業等の実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する	①教育委員会と協議 【次年度の実施予定】 継続して実施する	0%	100%
		実施済 40%	実施中 20% 未実施 40%
①小中学校等における水防災の授業等の実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する		0%	100%
		実施済 80%	実施中 20%
①県教育委員会と連携し防災教育の推進方法を検討 【次年度の実施予定】 継続して実施する	②要望に応じて「出前なんでも講座」として小中学校で授業を実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する	0%	100%
		実施済 70%	実施中 30%
①江戸川河川事務所が作成した学習指導計画等を埼玉県減災対策協議会において共有 【次年度の実施予定】 継続して実施する	②出前講座を小中学校で実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する	0%	100%
		実施済 50%	実施中 50%

取組番号	取組項目
27	浸水想定区域内の小中学校等における水防災教育の実施


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

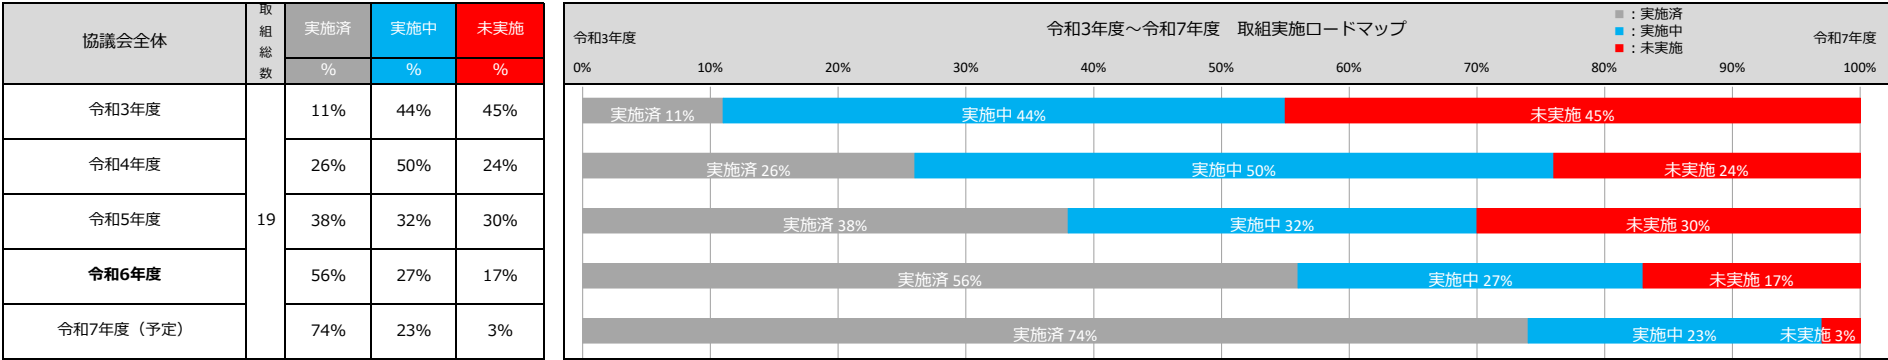

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関	取組 総 数	実施済	実施中	未実施
		%	%	%
前橋地方気象台	令和3年度	0%	0%	100%
	令和4年度	20%	80%	0%
	令和5年度	20%	0%	80%
	令和6年度	40%	60%	0%
	令和7年度（予定）	60%	40%	0%
熊谷地方気象台	令和3年度	20%	80%	0%
	令和4年度	40%	60%	0%
	令和5年度	60%	40%	0%
	令和6年度	80%	20%	0%
	令和7年度（予定）	100%	0%	0%
国道事務所 高崎河川	令和3年度	14%	53%	33%
	令和4年度	27%	40%	33%
	令和5年度	40%	27%	33%
	令和6年度	54%	13%	33%
	令和7年度（予定）	73%	27%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

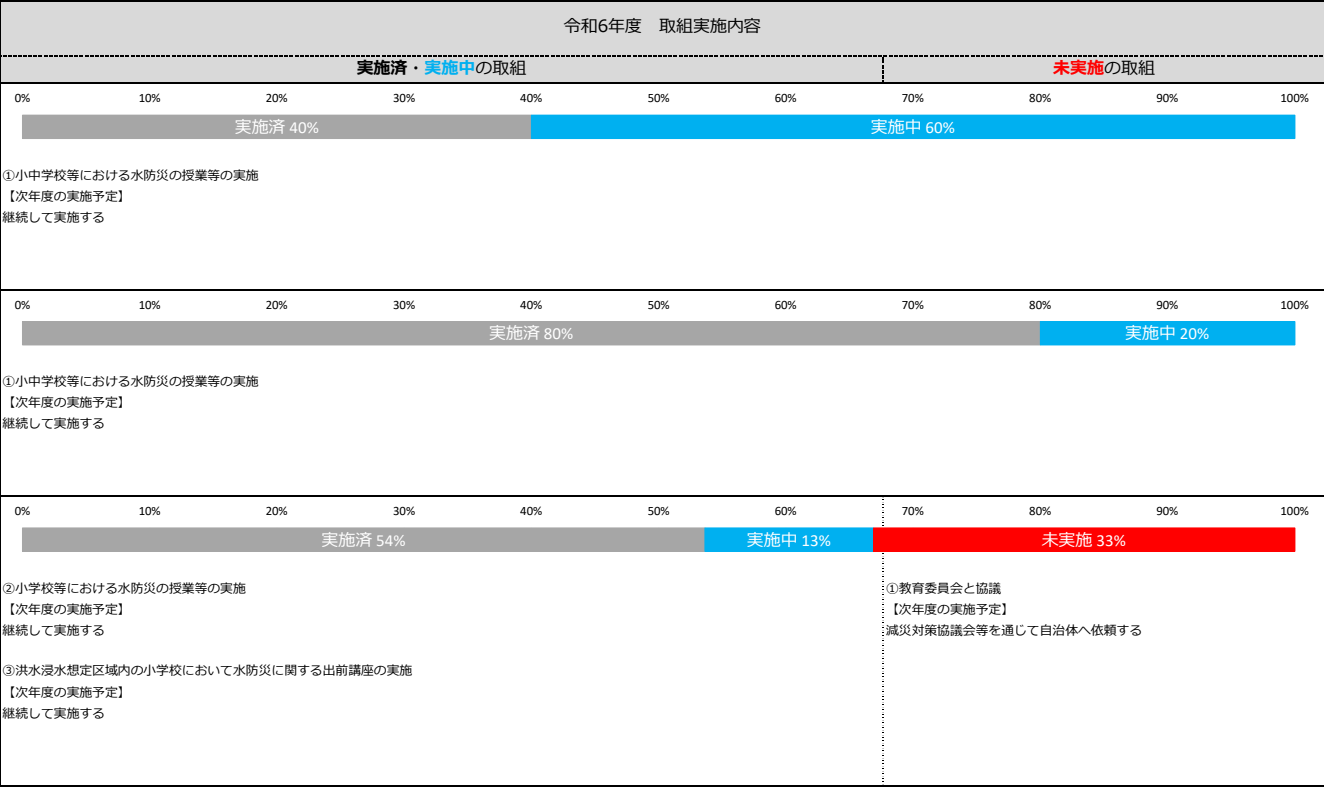

取組番号	取組項目
28	関係自治体等の公共施設及び公共交通機関施設等への防災関連情報の掲示やパンフレットの設置


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

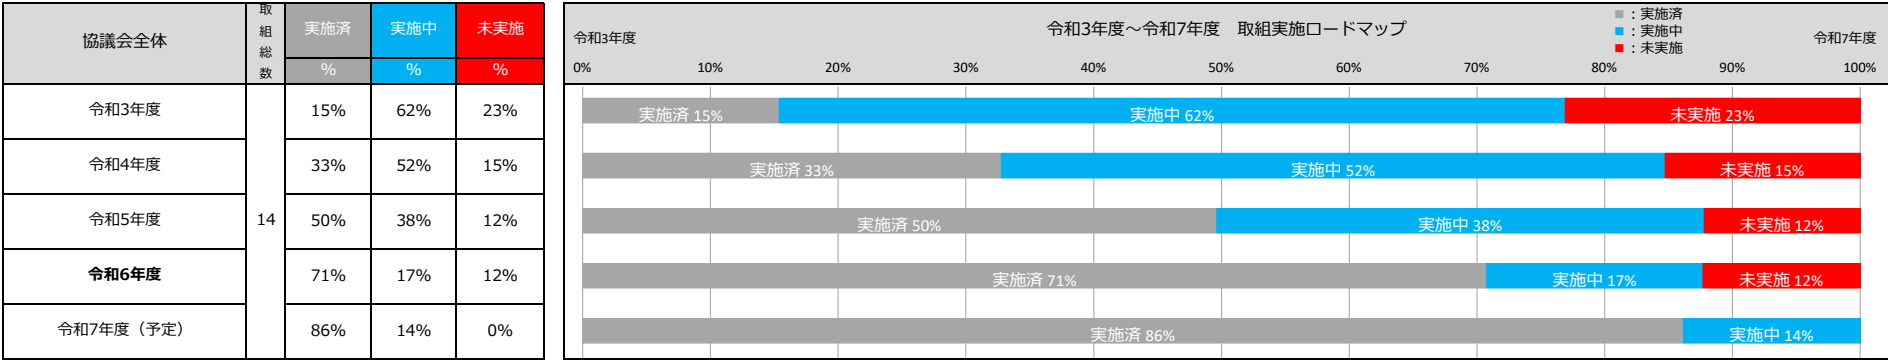

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
藤 岡 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉 村 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
神 川 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上 里 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
群 馬 県	令和3年度	1	0%	0%	100%
	令和4年度		20%	80%	0%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
埼 玉 県	令和3年度	1	0%	0%	100%
	令和4年度		0%	0%	100%
	令和5年度		20%	80%	0%
	令和6年度		40%	60%	0%
	令和7年度（予定）		60%	40%	0%
下 久 保 ダ ム 管 理 所	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
前 橋 地 方 気 象 台	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
熊 谷 地 方 気 象 台	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

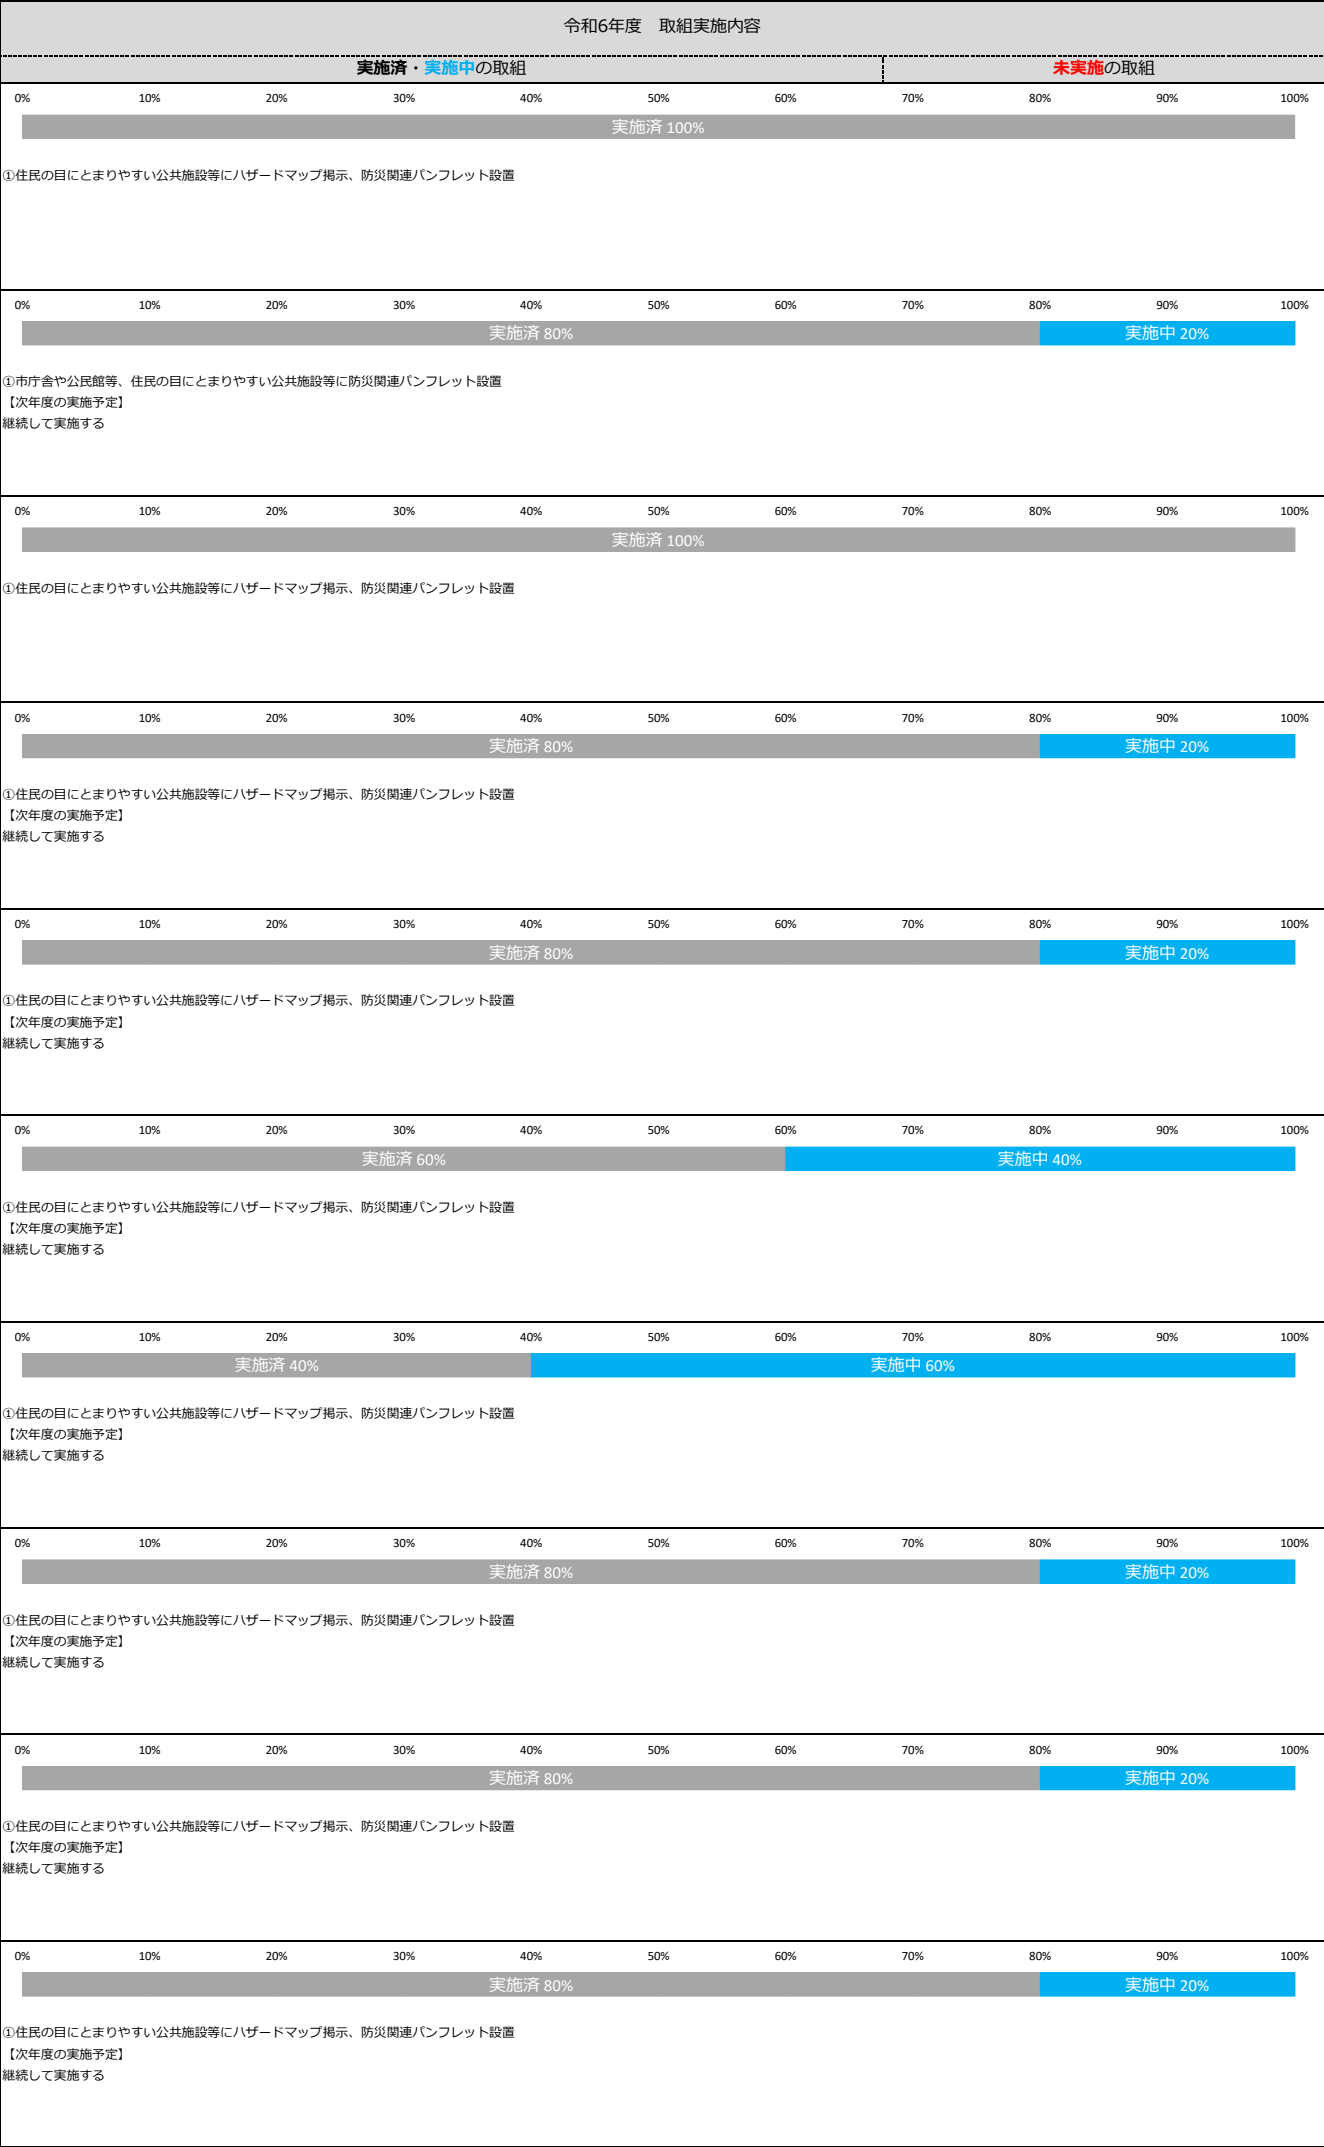

取組番号	取組項目
28	関係自治体等の公共施設及び公共交通機関施設等への防災関連情報の掲示やパンフレットの設置


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

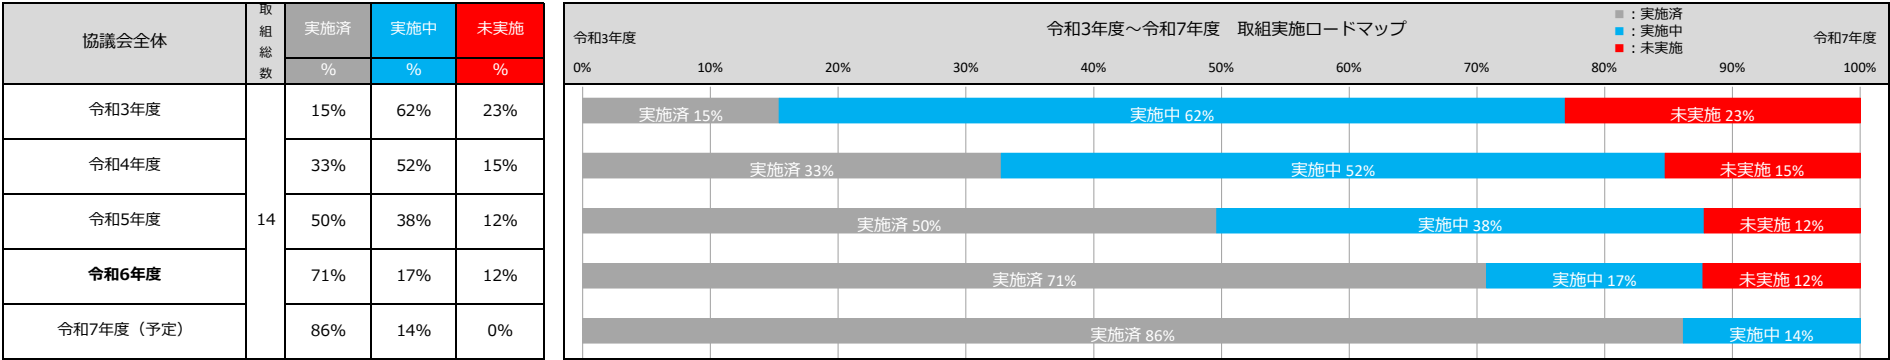

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
J R 高 崎 支 社	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		40%	0%	60%
	令和6年度		40%	0%	60%
	令和7年度（予定）		60%	40%	0%
上 信 電 鉄	令和3年度	1	0%	0%	100%
	令和4年度		0%	0%	100%
	令和5年度		0%	0%	100%
	令和6年度		0%	0%	100%
	令和7年度（予定）		20%	80%	0%
国 道 事 務 所	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

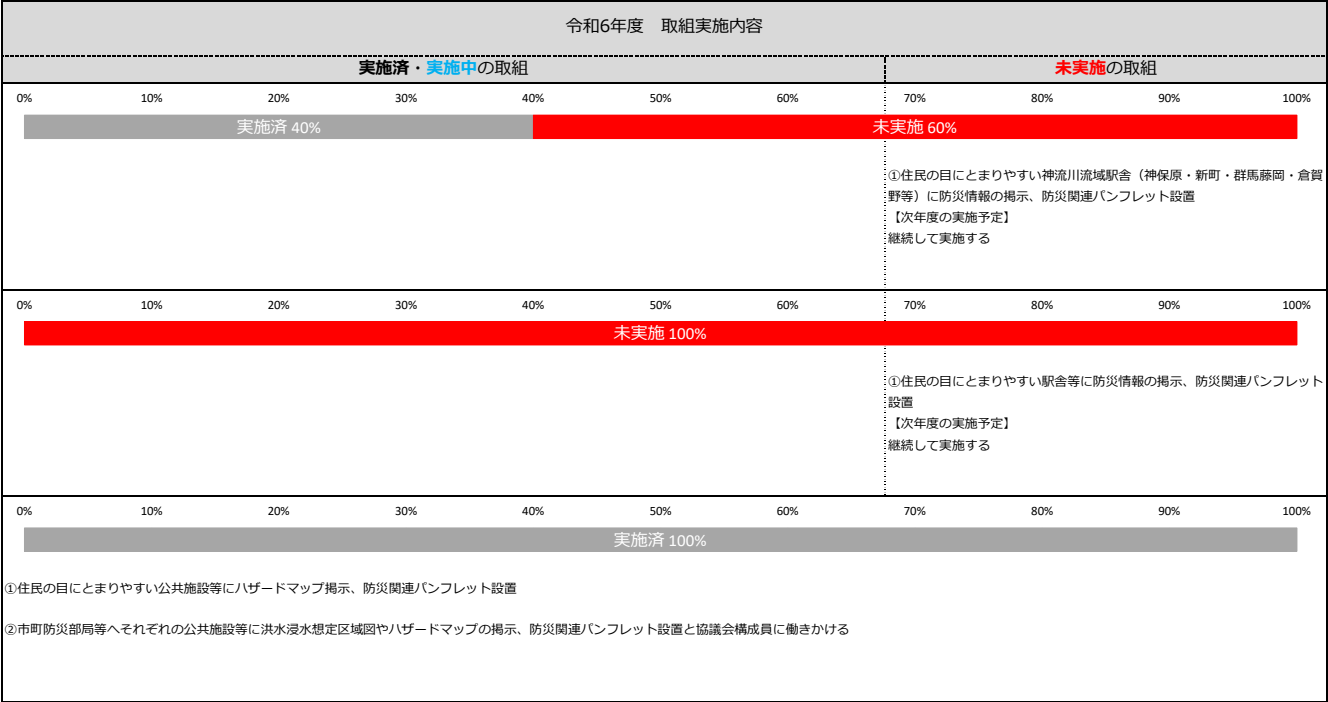

取組番号	取組項目
29	浸水想定区域内の水害リスクのある住民等に対するマイ・タイムライン（避難行動計画）の作成・普及啓発


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

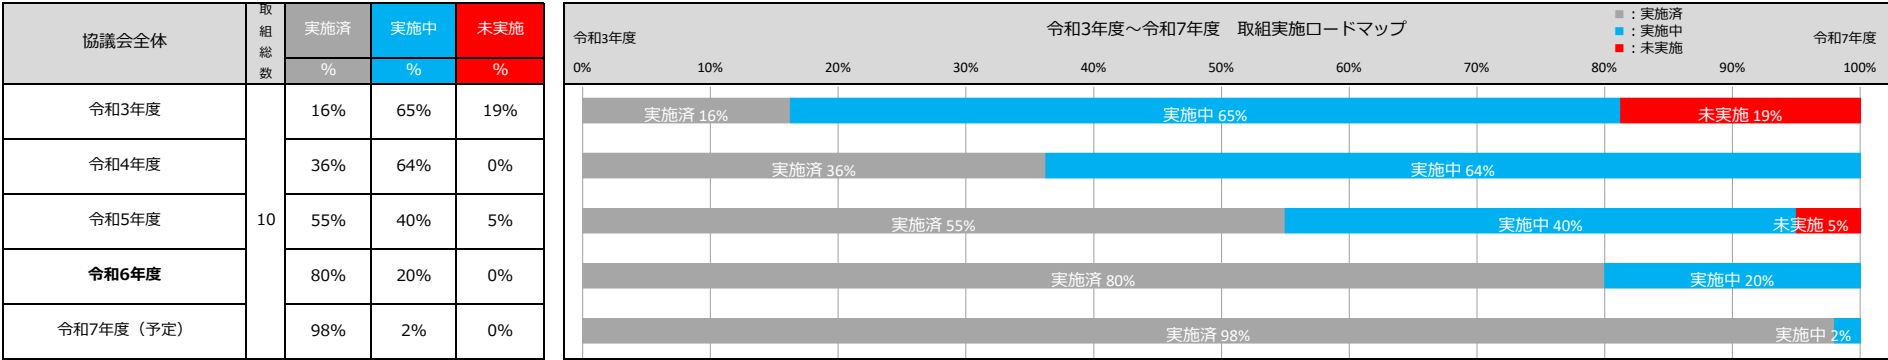

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
藤 岡 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉 村 町	令和3年度	1	0%	0%	100%
	令和4年度		20%	80%	0%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
神 川 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上 里 町	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
群 馬 県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
埼 玉 県	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		30%	70%	0%
	令和5年度		40%	20%	40%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
国 道 事 務 所	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

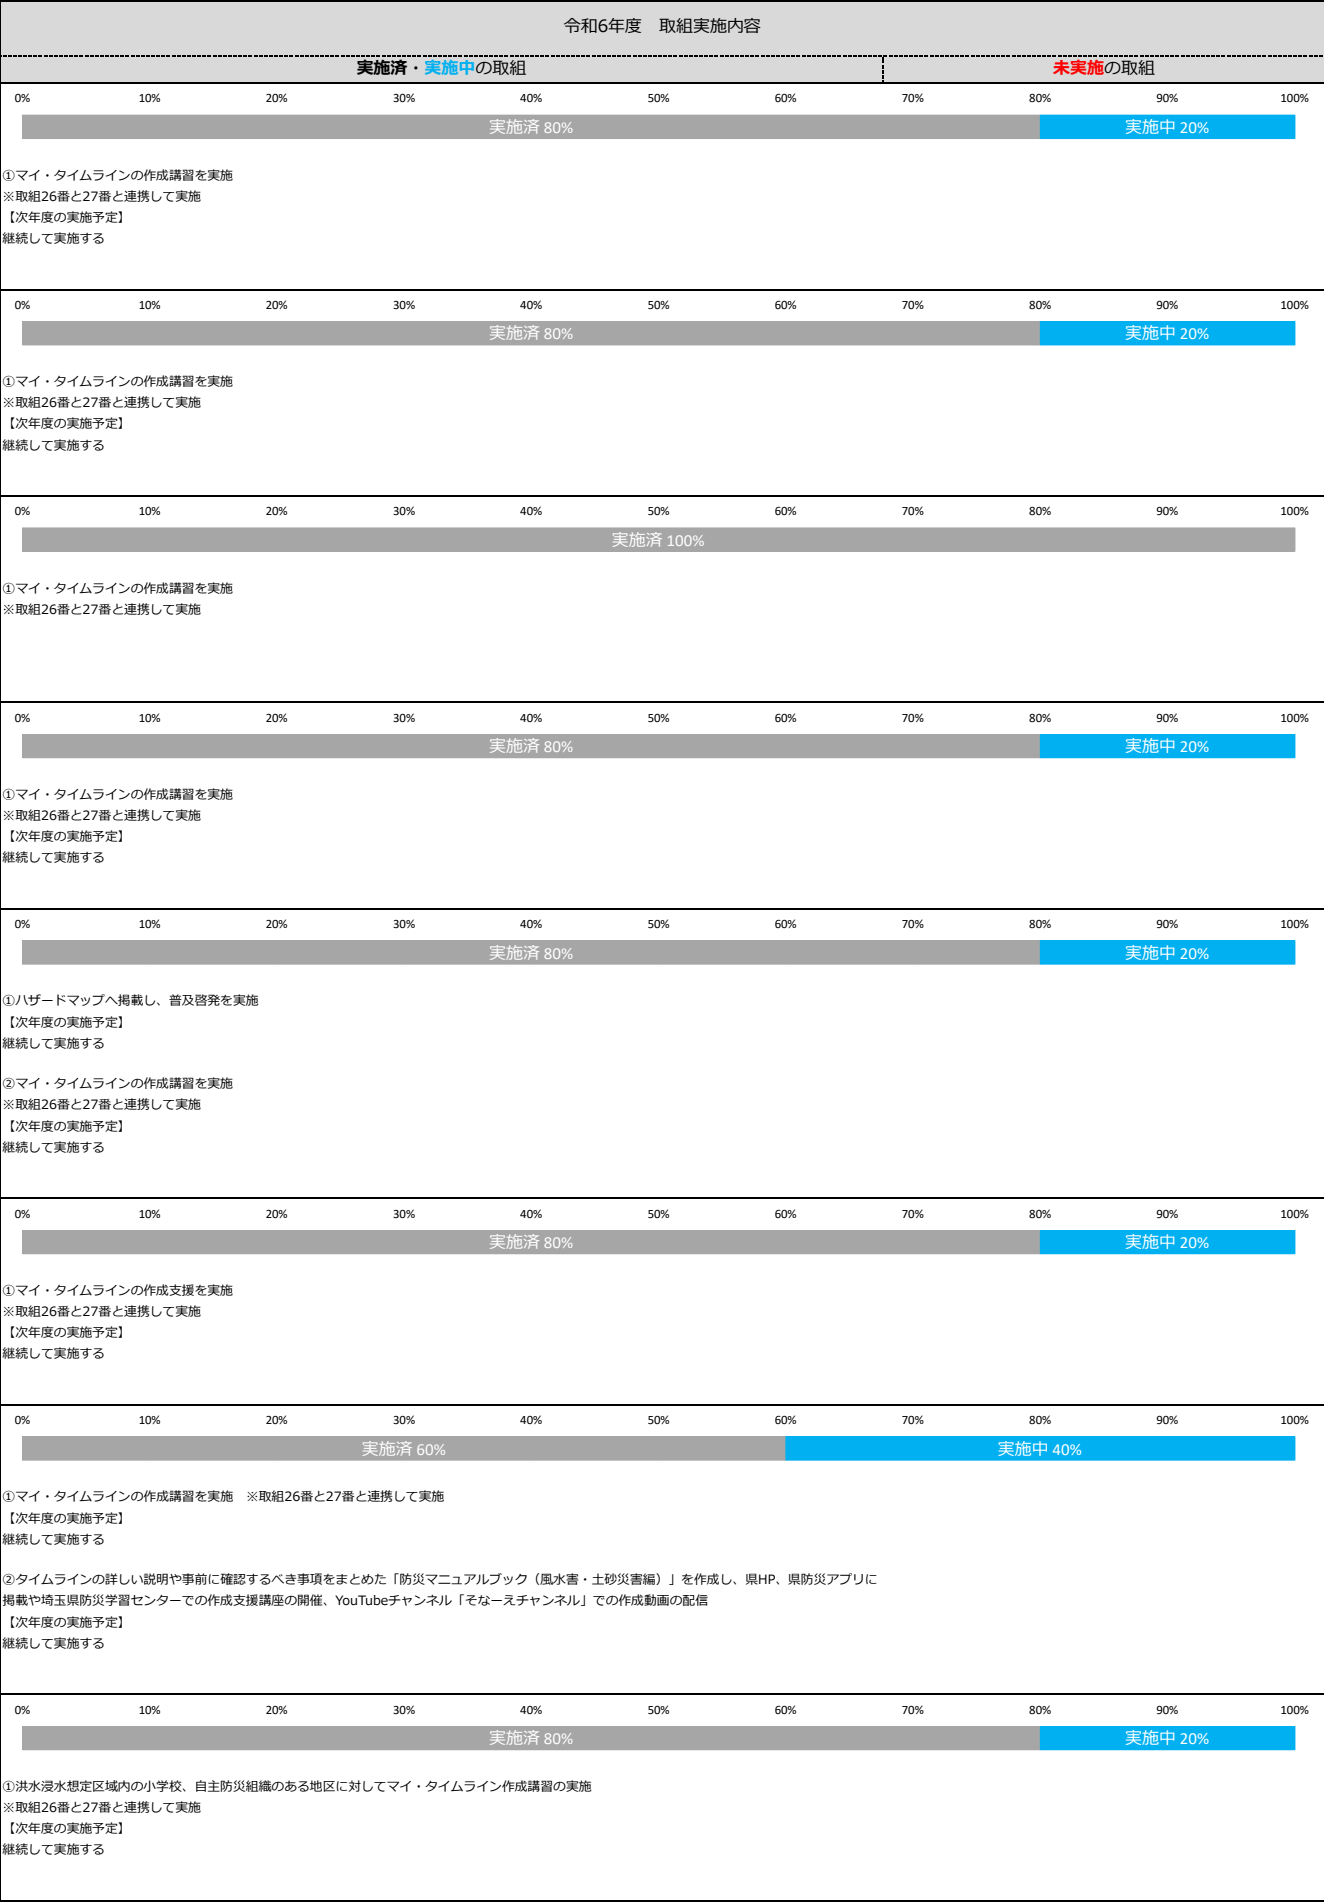

取組番号	取組項目
30	災害リスクの現地表示の促進


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

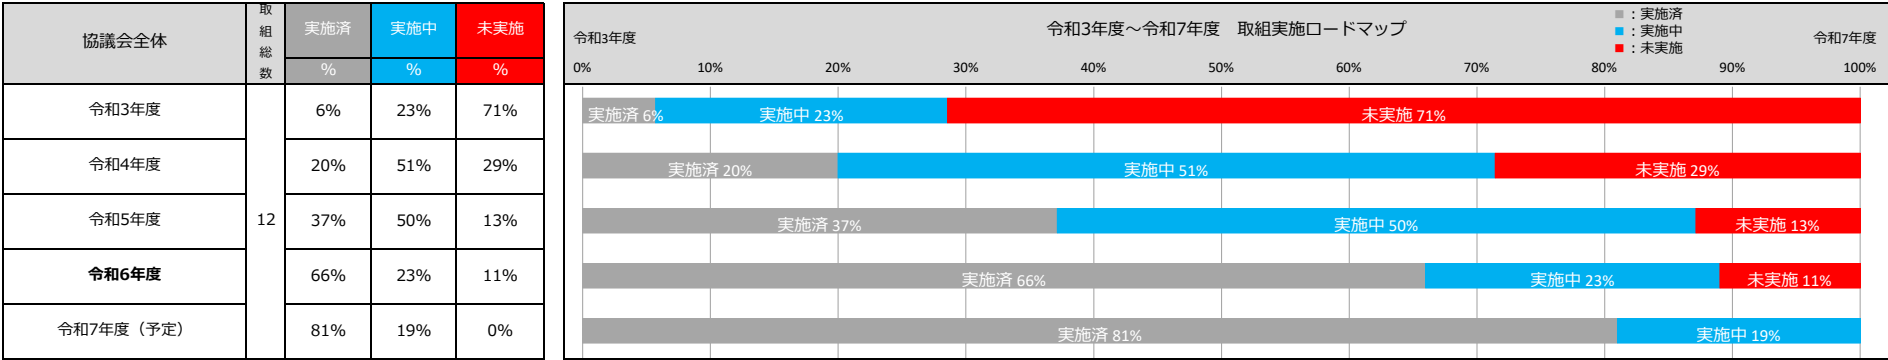

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高崎市	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		30%	70%	0%
	令和5年度		40%	20%	40%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
藤岡市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉村町	令和3年度	2	0%	0%	100%
	令和4年度		10%	40%	50%
	令和5年度		20%	30%	50%
	令和6年度		20%	0%	80%
	令和7年度（予定）		40%	60%	0%
神川町	令和3年度	2	0%	0%	100%
	令和4年度		0%	0%	100%
	令和5年度		20%	80%	0%
	令和6年度		70%	30%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
上里町	令和3年度	2	0%	0%	100%
	令和4年度		10%	40%	50%
	令和5年度		30%	70%	0%
	令和6年度		100%	0%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	50%
群馬県	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		30%	70%	0%
	令和5年度		50%	50%	0%
	令和6年度		70%	30%	0%
	令和7年度（予定）		90%	10%	0%
埼玉県	令和3年度	1	0%	0%	100%
	令和4年度		20%	80%	0%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

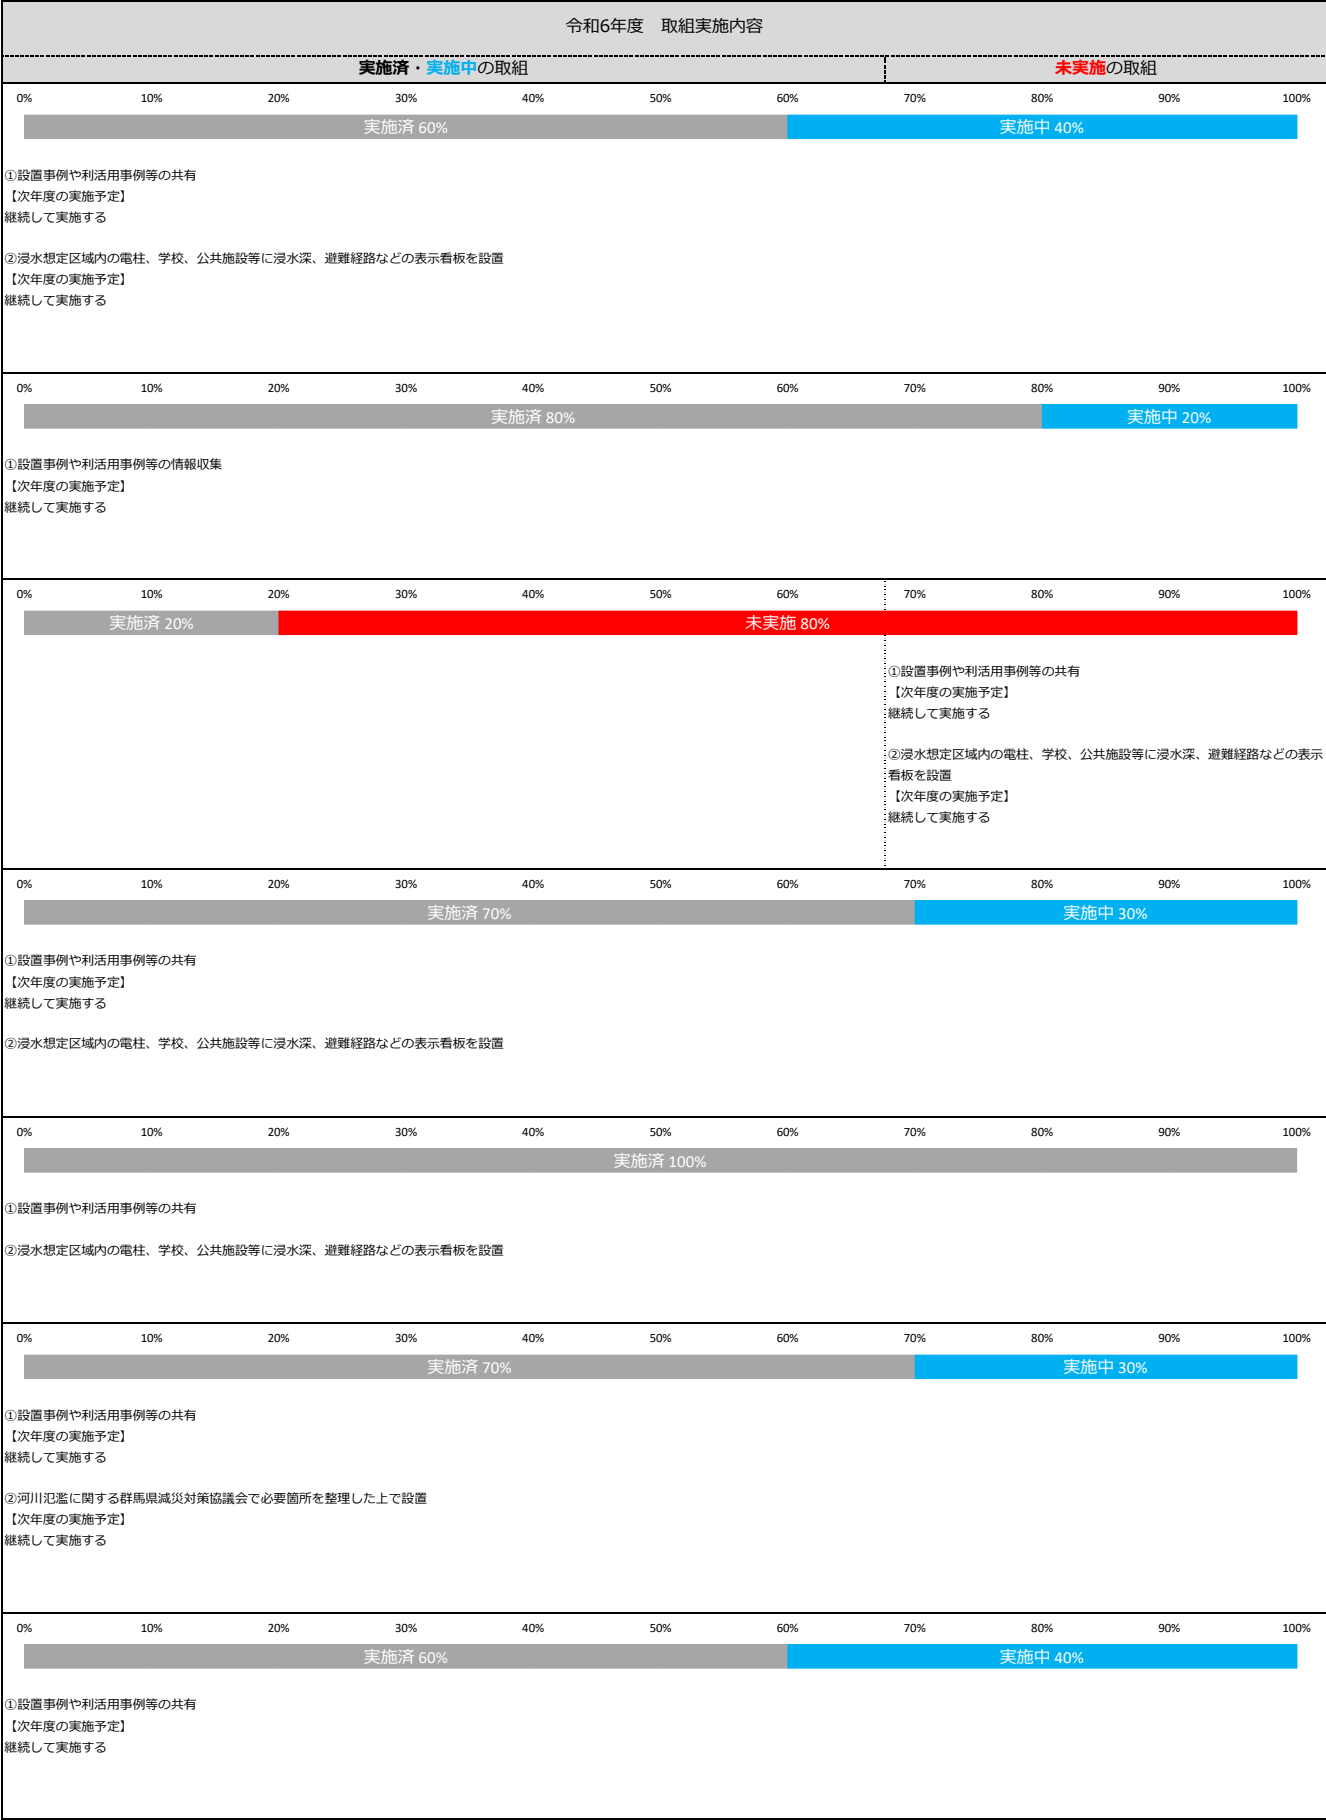

取組番号	取組項目
31	自治体、地域住民、水防団等と洪水に対してリスクが高い区間（重要水防箇所等）の共同点検を実施

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

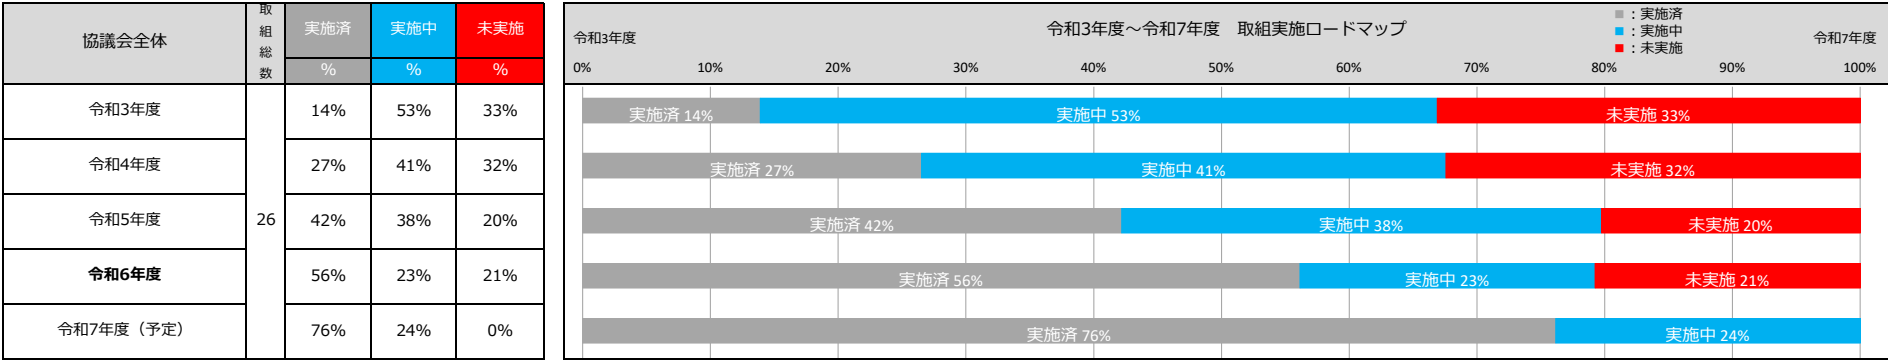

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高崎市	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		13%	20%	67%
	令和5年度		33%	67%	0%
	令和6年度		53%	47%	0%
	令和7年度（予定）		73%	27%	0%
藤岡市	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		13%	20%	67%
	令和5年度		33%	67%	0%
	令和6年度		53%	47%	0%
	令和7年度（予定）		73%	27%	0%
玉村町	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		27%	73%	0%
	令和5年度		47%	53%	0%
	令和6年度		53%	7%	40%
	令和7年度（予定）		73%	27%	0%
神川町	令和3年度	3	14%	53%	33%
	令和4年度		27%	40%	33%
	令和5年度		40%	27%	33%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
上里町	令和3年度	4	10%	40%	50%
	令和4年度		25%	50%	25%
	令和5年度		45%	55%	0%
	令和6年度		60%	30%	10%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
群馬県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
埼玉県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）



取組番号	取組項目
31	自治体、地域住民、水防団等と洪水に対してリスクが高い区間（重要水防箇所等）の共同点検を実施


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

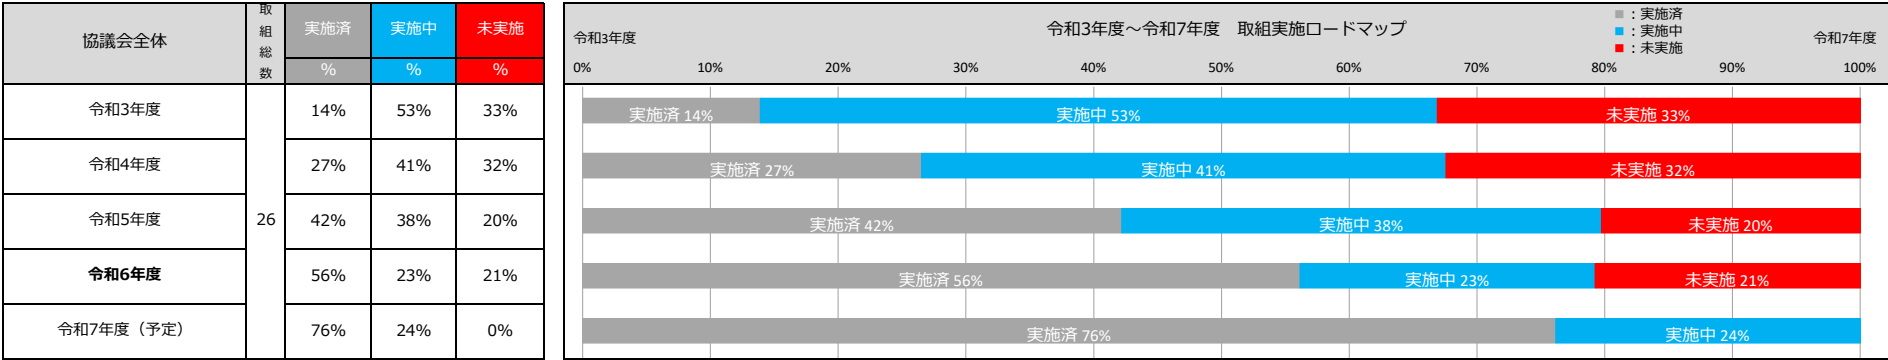

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
下久保ダム管理所	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
前橋地方気象台	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
熊谷地方気象台	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		20%	0%	80%
	令和5年度		20%	0%	80%
	令和6年度		20%	0%	80%
	令和7年度（予定）		40%	60%	0%
ＪＲ高崎支社	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		60%	0%	40%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
上信電鉄	令和3年度	1	0%	0%	100%
	令和4年度		0%	0%	100%
	令和5年度		0%	0%	100%
	令和6年度		0%	0%	100%
	令和7年度（予定）		20%	80%	0%
国道事務所 高崎河川	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		30%	20%	50%
	令和6年度		50%	50%	0%
	令和7年度（予定）		70%	30%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

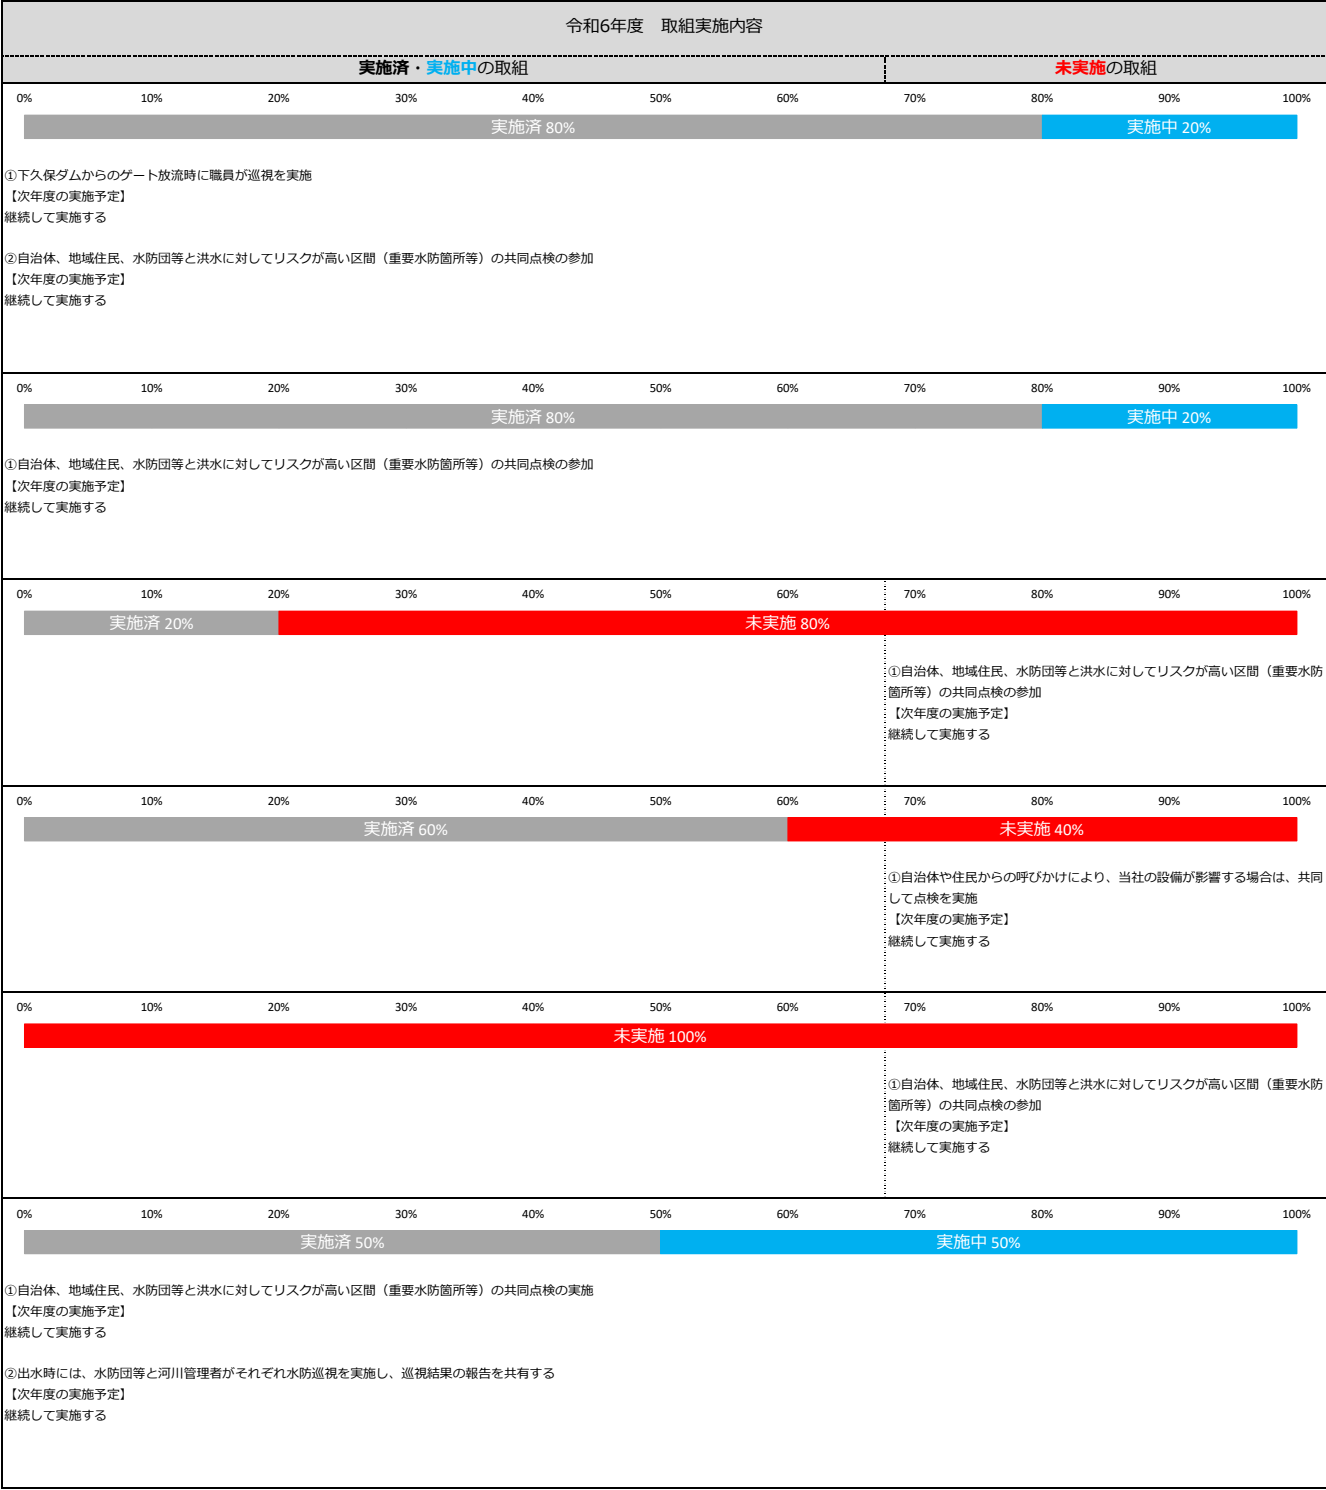

取組番号	取組項目
32	水防団等への連絡体制の確認と伝達訓練の実施


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

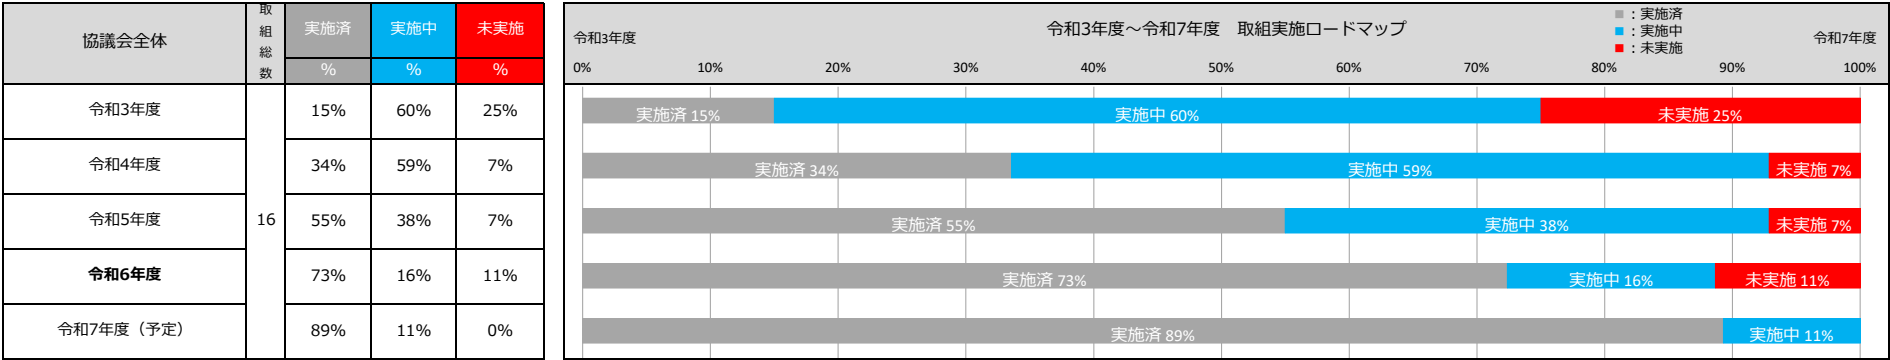

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		30%	20%	50%
	令和6年度		40%	10%	50%
	令和7年度（予定）		60%	40%	0%
藤 岡 市	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉 村 町	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		30%	70%	0%
	令和5年度		50%	50%	0%
	令和6年度		70%	0%	30%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
神 川 町	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上 里 町	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
群 馬 県	令和3年度	4	5%	20%	75%
	令和4年度		25%	75%	0%
	令和5年度		45%	55%	0%
	令和6年度		65%	35%	0%
	令和7年度（予定）		85%	15%	0%
埼 玉 県	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		80%	20%	0%
	令和6年度		90%	10%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

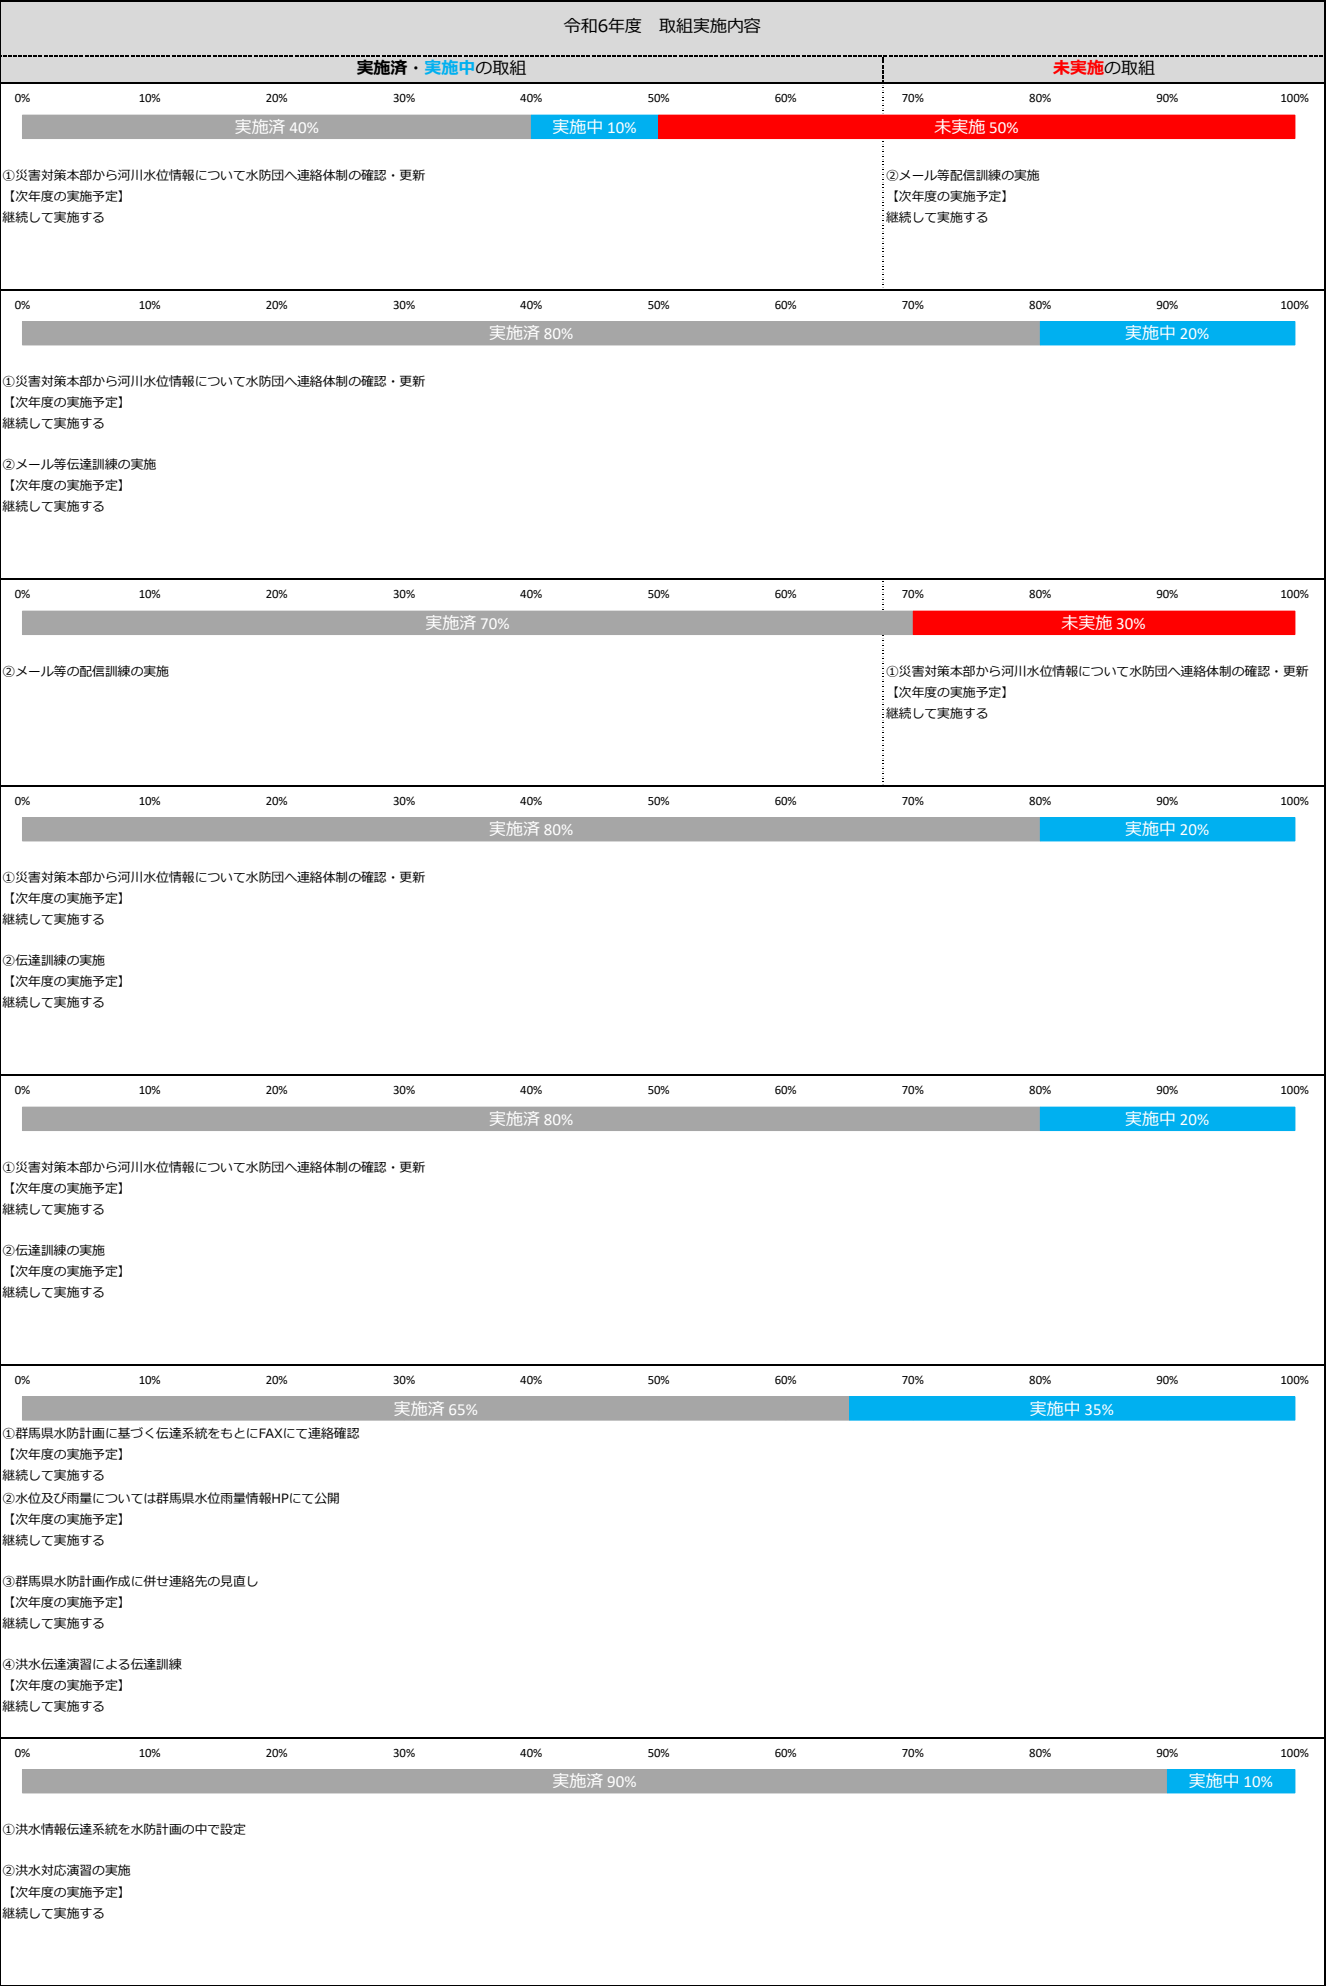

取組番号	取組項目
33	関係機関と連携した水防技術の継承等のための水防訓練の実施

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

協議会全体	取組 総 数	実施済	実施中	未実施	令和3年度	令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ										令和7年度	
		%	%	%		0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
令和3年度	14	18%	72%	10%		実施済 18% 実施中 72% 未実施 10%											
令和4年度		33%	46%	21%		実施済 33% 実施中 46% 未実施 21%											
令和5年度		50%	39%	11%		実施済 50% 実施中 39% 未実施 11%											
令和6年度		68%	26%	6%		実施済 68% 実施中 26% 未実施 6%											
令和7年度（予定）		88%	12%	0%		実施済 88% 実施中 12%											

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
藤 岡 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
玉 村 町	令和3年度	1	0%	0%	100%
	令和4年度		20%	80%	0%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		40%	0%	60%
	令和7年度（予定）		60%	40%	0%
神 川 町	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
上 里 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
群 馬 県	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
埼 玉 県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

令和6年度 取組実施内容														
実施済・実施中の取組									未実施の取組					
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%				
実施済 80%									実施中 20%					
①市防災訓練に併せて水防技術の継承等のための水防訓練の実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する														
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%				
実施済 80%									実施中 20%					
①市防災訓練に併せて水防技術の継承等のための水防訓練の実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する														
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%				
実施済 40%							未実施 60%							
③各地区の防災訓練に併せて水防技術の継承等のための水防訓練の実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する														
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%				
実施済 80%									実施中 20%					
①神流川沿岸水害予防組合主催の水防訓練の実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する														
②関係機関と連携して水防工法の普及や水防訓練の実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する														
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%				
実施済 80%									実施中 20%					
①坂東上流水害予防組合及び神流川水害予防組合主催の水防訓練 【次年度の実施予定】 継続して実施する														
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%				
実施済 80%									実施中 20%					
①利根川水系連合総合演習 【次年度の実施予定】 継続して実施する														
②水防技術講習会 【次年度の実施予定】 国土交通省と共同で水防技術講習会を開催														
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%				
実施済 80%									実施中 20%					
①関係機関と連携した水防技術の継承等のための水防訓練の実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する														

取組番号	取組項目
33	関係機関と連携した水防技術の継承等のための水防訓練の実施


●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

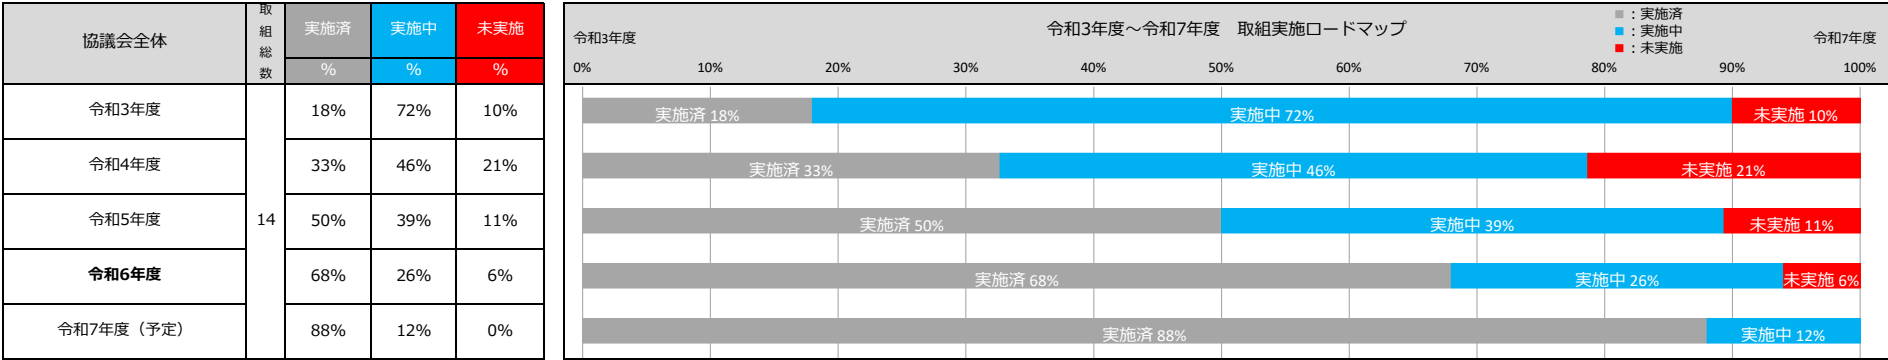

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
前橋地方気象台	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		20%	0%	80%
	令和5年度		20%	0%	80%
	令和6年度		40%	60%	0%
	令和7年度（予定）		60%	40%	0%
熊谷地方気象台	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		20%	0%	80%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
国道事務所 高崎河川	令和3年度	3	20%	80%	0%
	令和4年度		27%	20%	53%
	令和5年度		40%	33%	27%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

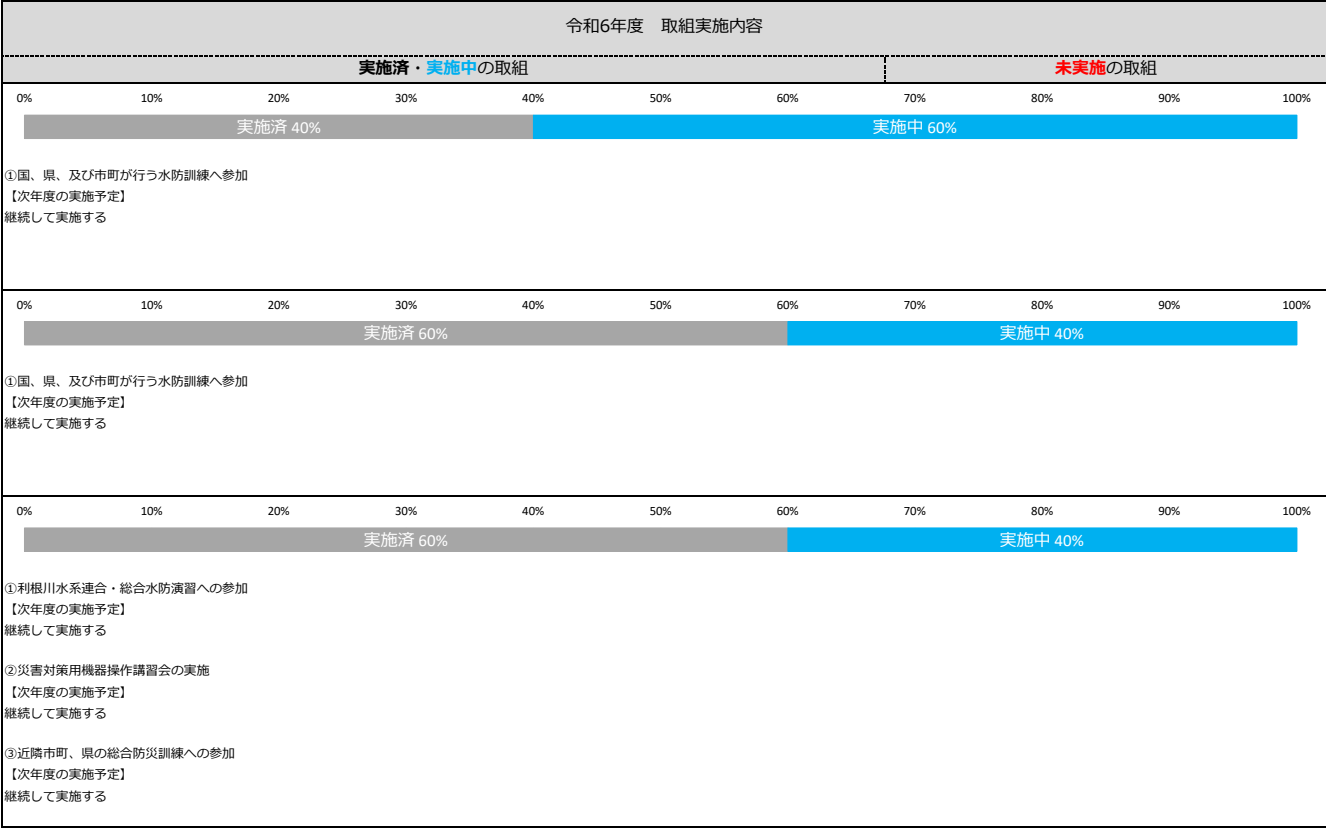

取組番号	取組項目
34	水防団員の実働者（担い手）の確保

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

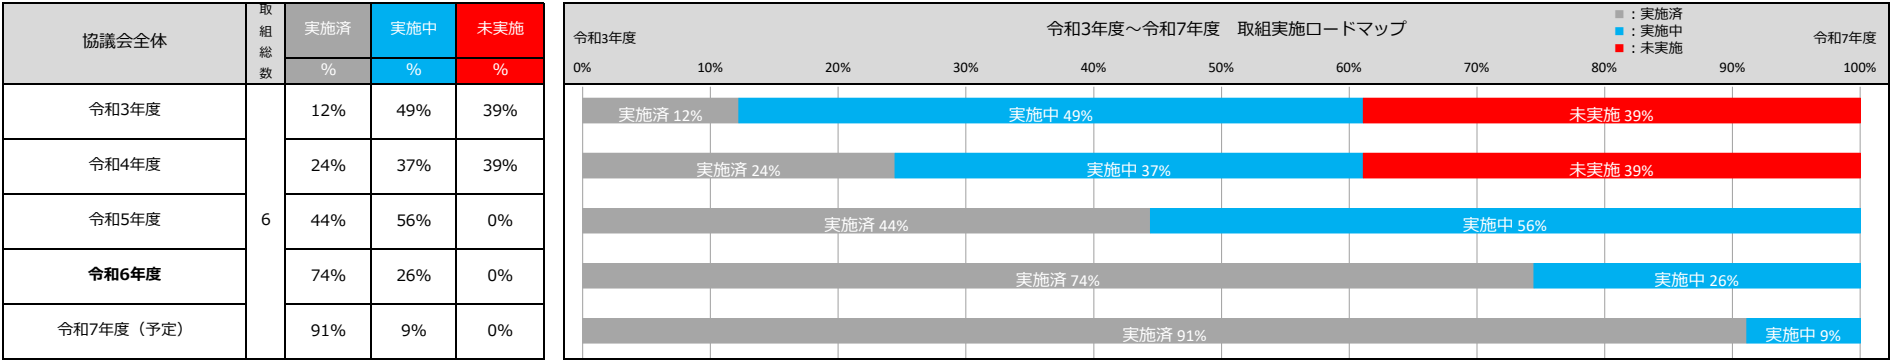

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
玉 村 町	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		90%	10%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
神 川 町	令和3年度	3	7%	27%	66%
	令和4年度		13%	20%	67%
	令和5年度		33%	67%	0%
	令和6年度		53%	47%	0%
	令和7年度（予定）		73%	27%	0%
上 里 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）



取組番号	取組項目
35	排水作業準備計画（案）に基づく関係機関と連携した緊急排水活動の実働訓練の実施

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

協議会全体	取組総数	実施済	実施中	未実施
		%	%	%
令和3年度	5	18%	70%	12%
令和4年度		35%	53%	12%
令和5年度		50%	30%	20%
令和6年度		68%	25%	7%
令和7年度（予定）		88%	12%	0%

令和3年度 令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ 令和7年度

実施済
 実施中
 未実施

年度	実施済 (%)	実施中 (%)	未実施 (%)
令和3年度	18%	70%	12%
令和4年度	35%	53%	12%
令和5年度	50%	30%	20%
令和6年度	68%	25%	7%
令和7年度（予定）	88%	12%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）


各機関		取組 組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
藤 岡 市	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
群 馬 県	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		80%	20%	0%
	令和7年度（予定）		100%	0%	0%
国 道 事 務 所 高 崎 河 川	令和3年度	2	10%	40%	50%
	令和4年度		20%	30%	50%
	令和5年度		20%	0%	80%
	令和6年度		30%	40%	30%
	令和7年度（予定）		50%	50%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

令和6年度 取組実施内容										
実施済・実施中の取組							未実施の取組			
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
実施済 80%							実施中 20%			
①排水作業準備計画（案）に基づくポンプ車等による排水実働訓練への参加 【次年度の実施予定】 継続して実施する										
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
実施済 80%							実施中 20%			
①排水作業準備計画（案）に基づくポンプ車等による排水実働訓練への参加 【次年度の実施予定】 継続して実施する										
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
実施済 80%							実施中 20%			
①排水作業準備計画（案）に基づくポンプ車等による排水実働訓練への参加 【次年度の実施予定】 継続して実施する										
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
実施済 30%			実施中 40%				未実施 30%			
②排水作業時の改善点等を検証して計画に反映 【次年度の実施予定】 継続して実施する							③排水作業準備計画（案）に基づくポンプ車等による排水実働訓練の実施 【次年度の実施予定】 継続して実施する			

取組番号	取組項目
36	排水作業準備計画（案）に基づく排水樋管の管理者（操作委託者）による樋管操作訓練の実施

●減災対策協議会全体の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

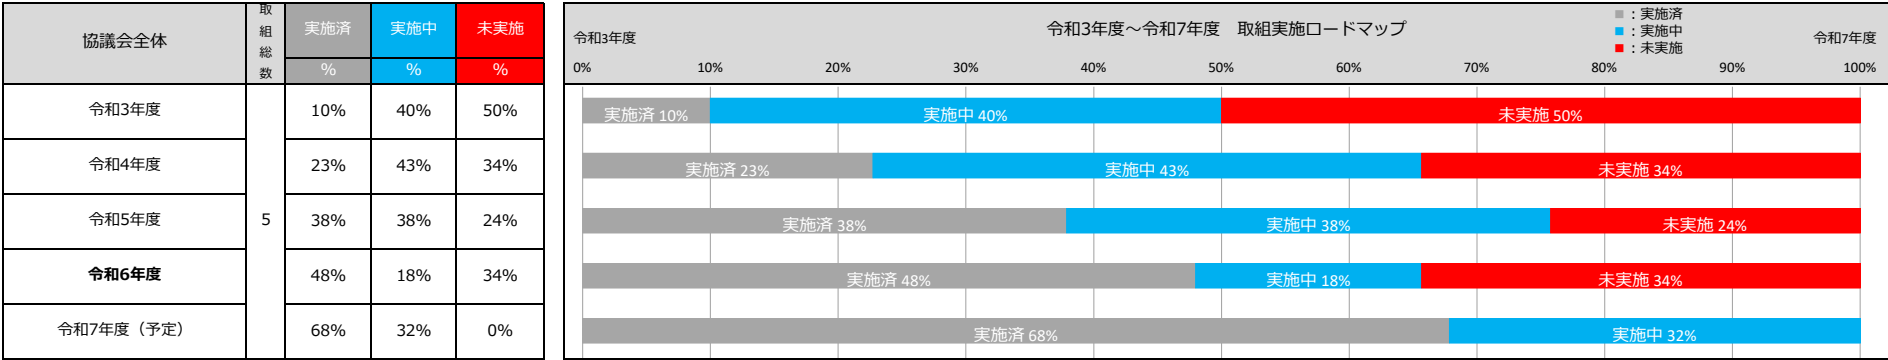

●各機関の取組進捗状況（令和3年度～令和7年度）

各機関		取組 総 数	実施済	実施中	未実施
			%	%	%
高 崎 市	令和3年度	1	0%	0%	100%
	令和4年度		0%	0%	100%
	令和5年度		0%	0%	100%
	令和6年度		0%	0%	100%
	令和7年度（予定）		20%	80%	0%
藤 岡 市	令和3年度	1	0%	0%	100%
	令和4年度		20%	80%	0%
	令和5年度		40%	60%	0%
	令和6年度		60%	40%	0%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
玉 村 町	令和3年度	1	20%	80%	0%
	令和4年度		40%	60%	0%
	令和5年度		60%	40%	0%
	令和6年度		60%	0%	40%
	令和7年度（予定）		80%	20%	0%
国 道 事 務 所 高 崎 河 川	令和3年度	2	20%	80%	0%
	令和4年度		30%	30%	40%
	令和5年度		50%	50%	0%
	令和6年度		70%	30%	0%
	令和7年度（予定）		90%	10%	0%

●各機関の取組進捗状況（令和6年度時点）

