

令和5年5月25日
国土交通省関東地方整備局
千葉国道事務所

工事発注手続きについて

～「R5千葉国道管内CCTV設備設置工事」他工事の発注手続きを行います～

千葉国道事務所が発注する「R5千葉国道管内CCTV設備設置工事」「R5千葉国道管内道路照明灯改修（LED）工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調・不落対策等を試行、採用しております。

今回発注する下記工事については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【対象工事】

1. R5千葉国道管内CCTV設備設置工事
2. R5千葉国道管内道路照明灯改修（LED）工事

【不調・不落対策等】

- 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)
- 1), 2), 3), 4), 6)

【不調・不落対策等】

- 1) 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- 2) 競争参加資格の緩和
- 3) 余裕期間制度（フレックス方式）
- 4) 世界的な半導体不足による工期延期等
- 5) 機器単体費の提示
- 6) 施工箇所が点在する工事の積算
- 7) 難工事指定

※詳細は次項をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、千葉県政記者会

<問い合わせ先>

関東地方整備局 千葉国道事務所



電話：043-287-0311（代表） FAX：043-285-0346

副所長（技） 茅根 壮一（ちのね そういち）（内線：205）

防災情報課長 原田 勝敏（はらだ かつとし）（内線：281）




《工事概要 1》

- (1) 工 事 名：R 5 千葉国道管内C C T V 設備設置工事
- (2) 工事場所：ちばけんいちかわしほんぎょうとく千葉県市川市本行徳地先外 8 箇所
- (3) 工 期：全体工期 契約締結の翌日から令和 6 年 3 月 2 0 日まで
余裕期間制度（フレックス方式）
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：通信設備工事
- (6) 工事内容：C C T V カメラ装置 9 台
 伝送装置 9 台
 無停電原電装置 9 台
 支柱 9 基

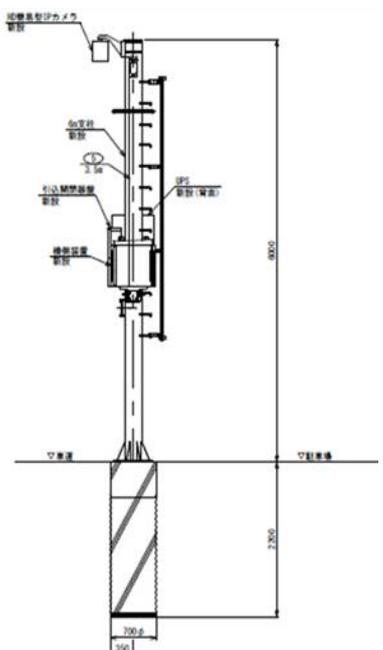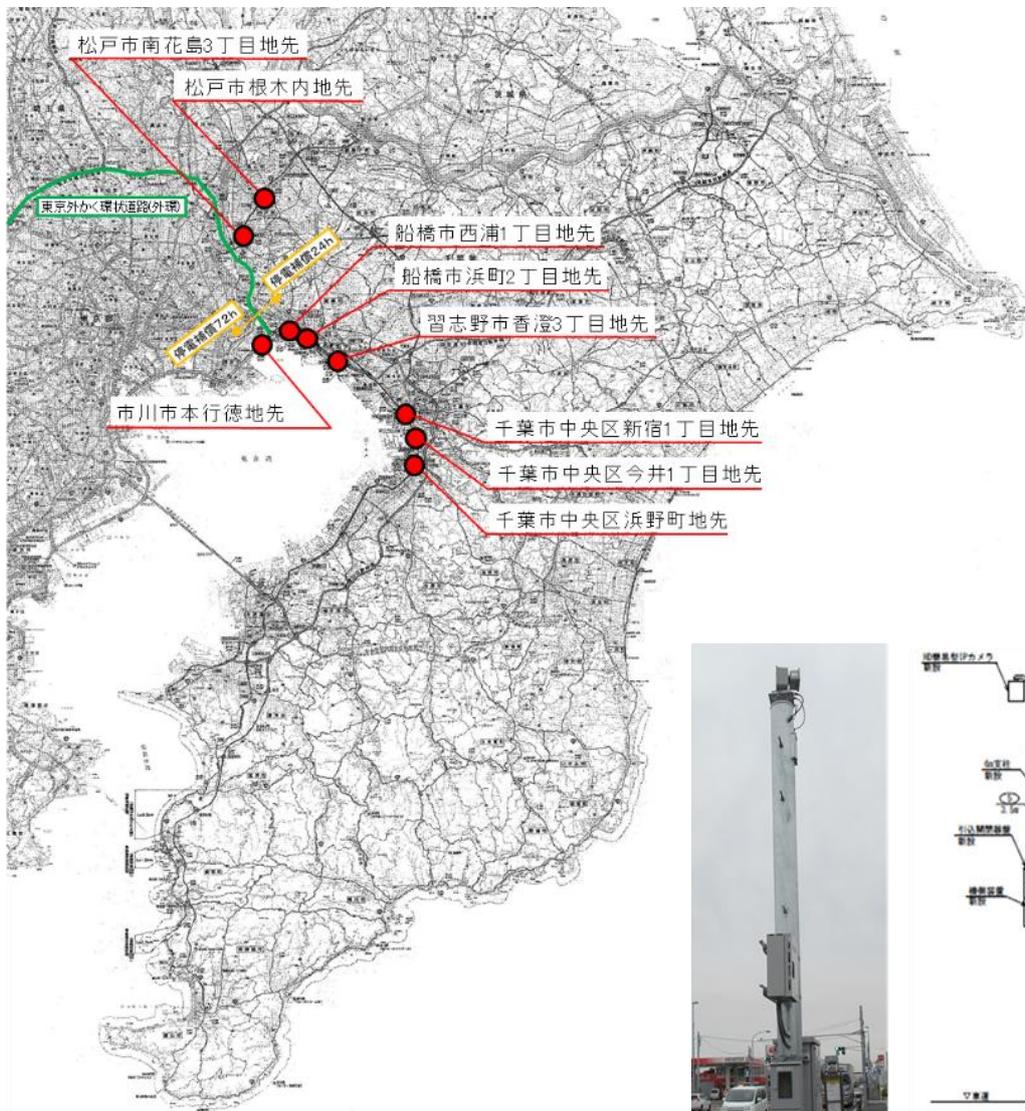

《工事概要 2》

- (1) 工 事 名：R 5 千葉国道管内道路照明灯改修（L E D）工事
- (2) 工事場所：千葉国道事務所管内
- (3) 工 期：全体工期 契約締結の翌日から令和 6 年 3 月 2 0 日まで
 余裕期間制度（フレックス方式）
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：電気設備工事
- (6) 工事内容：道路照明灯（L E D） 2 2 0 灯
 照明柱 1 0 灯

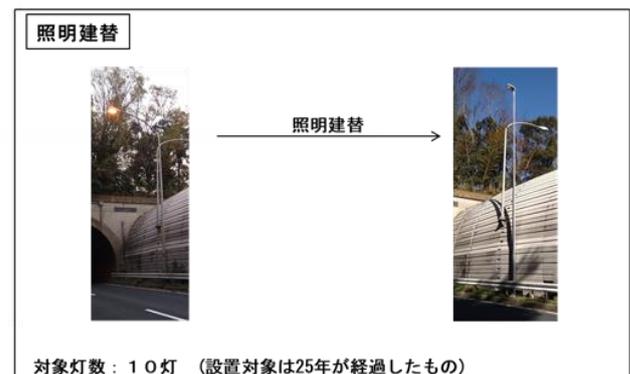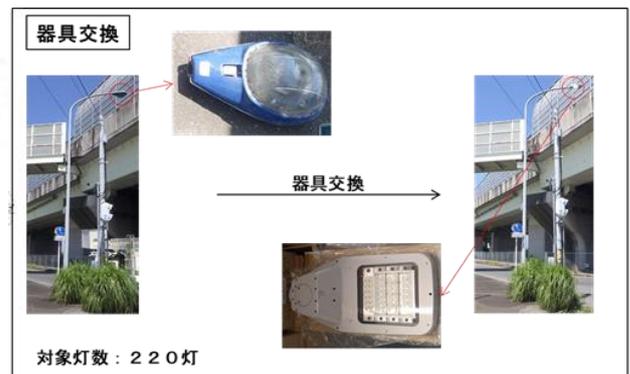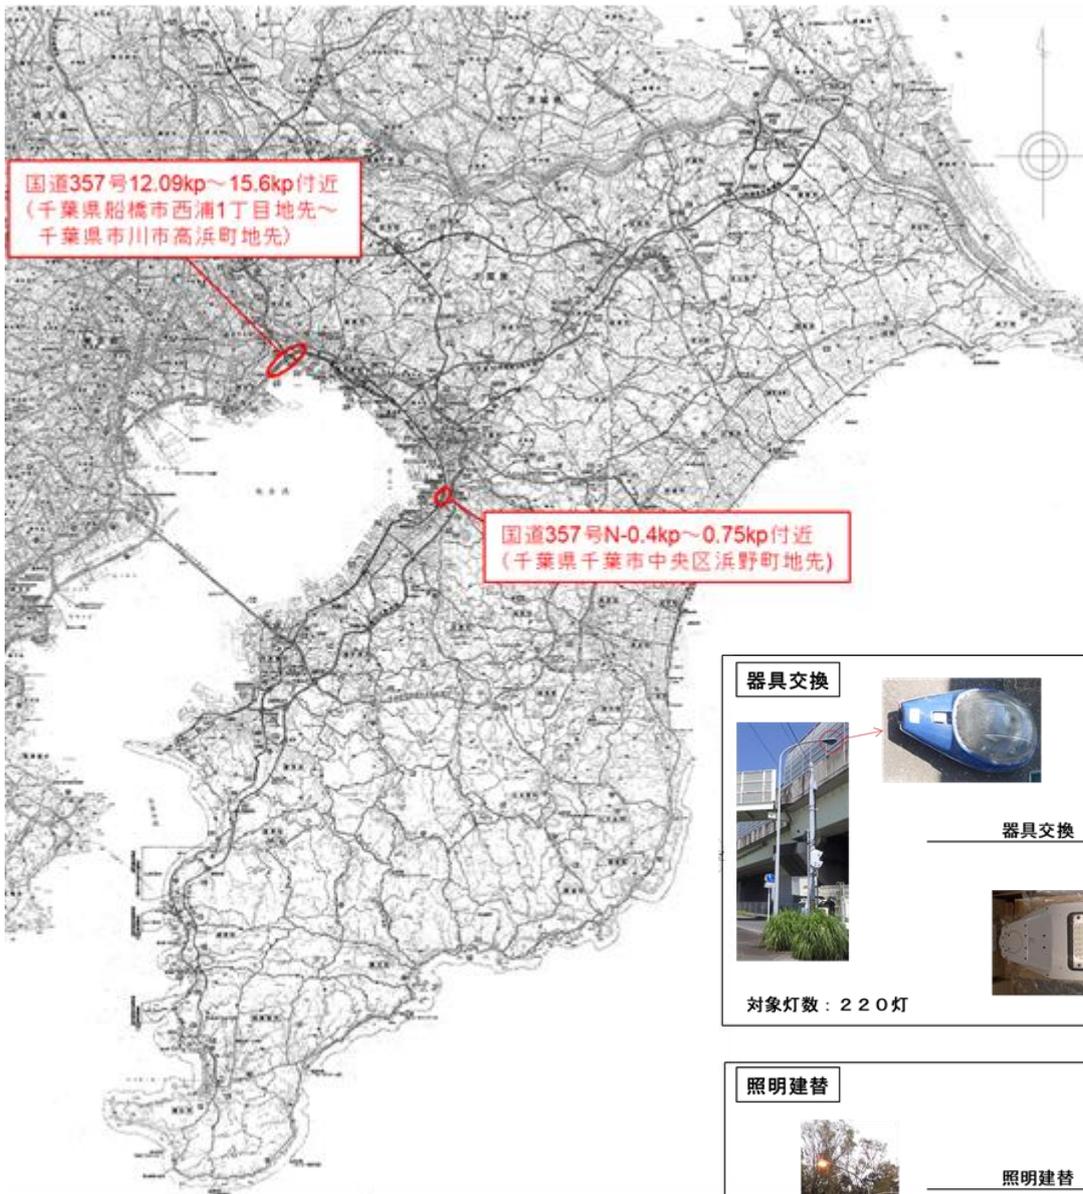

《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。）

2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績（民間工事を含む）、本発注工事に対応する工事種別の手持ちの工事量及び賃上げの実施を加算点としています。

3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

1) 地域要件の緩和

地域要件を「施工都県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から拡大し、「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業を対象とします。

2) 企業に求める施工実績の緩和

工事名：R5 千葉国道管内 CCTV 設備設置工事

交通規制を実施し CCTV 装置の製作、設置・調整を行うものであるが、交通規制の実績を求めず「屋外用カメラで光ケーブルを介して監視・操作が可能な機能を有する設備を設置した工事」のみとして緩和します。

工事名：R5 千葉国道管内道路照明灯改修（LED）工事

交通規制を実施し道路照明灯の LED 化を行うものであるが、交通規制の実績を求めず「道路照明灯（トンネル照明を除く）を設置した工事」のみとして緩和します。

3. 余裕期間制度（フレックス方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和6年3月20日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

4. 世界的な半導体不足による工期延期等

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない等、工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期の延長を実施します。

5. 機器単体費の提示

R 5 千葉国道管内 C C T V 設備設置工事は、C C T V 装置に係る機器単体費を歩掛見積参考資料に提示することを試行します。

6. 施工箇所が点在する工事の積算

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

R 5 千葉国道管内 C C T V 設備設置工事

国道 6 号

まつどしみなみはなしま
松戸市南花島 3 丁目地先、まつどしねぎうち
松戸市根木内地先

国道 3 5 7 号

ちばしちゅうおうくはまのちょう
千葉市中央区浜野町地先、ちばしちゅうおうくいまい
千葉市中央区今井 1 丁目地先、
ちばしちゅうおうくしんじゅく
千葉市中央区新宿 1 丁目地先、ならしのしかすみ
習志野市香澄 3 丁目地先、ふなばししはまち
船橋市浜町 2 丁目地先、
ふなばししにしうら
船橋市西浦 1 丁目地先、いちかわしほんぎょうとく
市川市本行徳地先

R 5 千葉国道管内道路照明灯改修 (L E D) 工事

国道 3 5 7 号

いちかわしたかはまちょう
市川市高浜町地区、ちばしちゅうおうくはまの
千葉市中央区浜野町地区

7. 難工事指定

本工事は、交通量が極めて多い現道上で、交通規制しながらの施工となり、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事指定」を採用します。「難工事」指定された工事は、完成時に 7 0 点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事 (試行)」の総合評価の評価項目において加点対象となります。

また、加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の 1 年間に元請けとして、完成・引渡し完了した施工実績が加点対象となります。

また、主任 (監理) 技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の 4 年間を評価対象となります。

《スケジュール》

- | | |
|-------------------|------------------------|
| ○入札公示、入札説明書 交付 | : 令和 5 年 5 月 2 5 日 (木) |
| ○競争参加資格確認申請書 提出期限 | : 令和 5 年 6 月 5 日 (月) |
| ○入札書・工事費内訳書 提出期限 | : 令和 5 年 7 月 6 日 (木) |
| ○開札日 | : 令和 5 年 7 月 1 1 日 (火) |

■千葉国道事務所ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/>

■公式ツイッター情報 https://twitter.com/mlit_chibakoku



ホームページ




Twitter

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

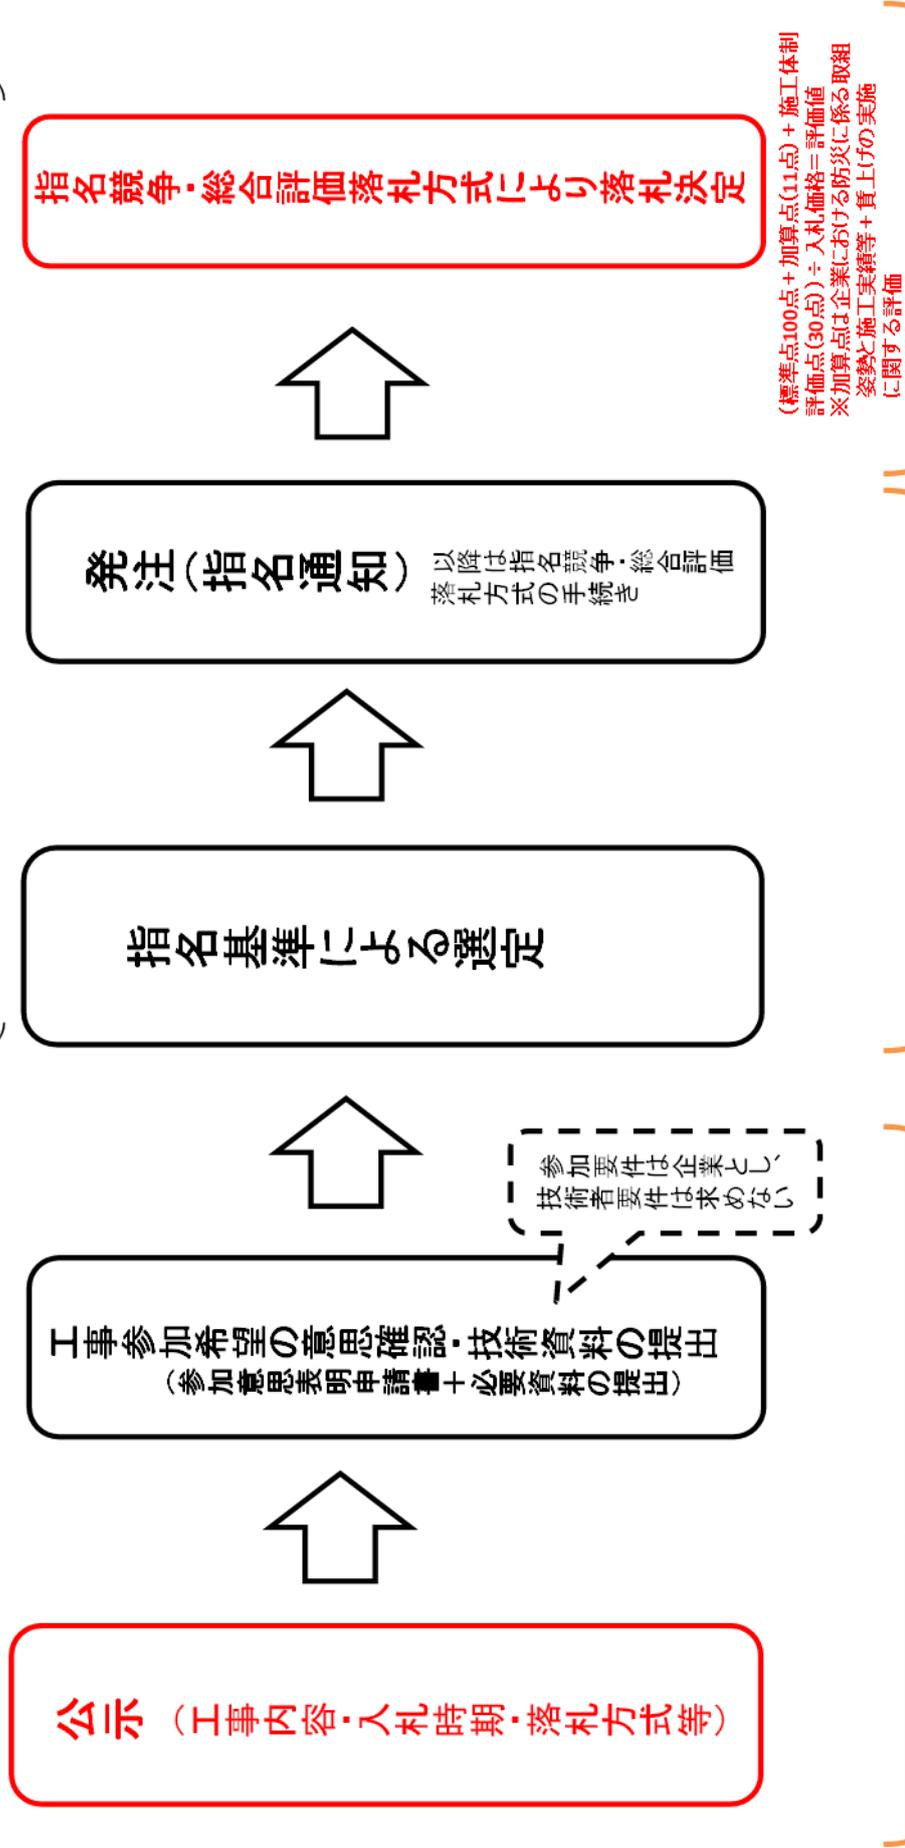

公募による企業の参加

公募結果に基づく指名

防災に係る取組姿勢と
施工実績等を評価
