

令和6年1月25日
国土交通省関東地方整備局
常陸河川国道事務所

工事発注手続きについて

～「R5 常陸管内道の駅カメラ他設置工事」の発注手続きを行います～

常陸河川国道事務所が発注する「R5 常陸管内道の駅カメラ他設置工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R5 常陸管内道の駅カメラ他設置工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 余裕期間制度（フレックス方式）
4. 世界的な半導体不足による工期等
5. 機器単体費の提示
6. 配置予定技術者の専任を要しない期間

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 茨城県政記者クラブ 栃木県政記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 常陸河川国道事務所

電話：029-240-4061（代表） FAX：029-240-4081（代表）

副所長 石崎 睦（いしざき むつみ）（内線：205）


建設専門官 赤松 剛（あかまつ つよし）（内線：406）

《工事概要》

- (1) 工 事 名：R 5 常陸管内道の駅カメラ他設置工事
- (2) 工事場所：自) 茨城県筑西市川澄地先 至) 茨城県水戸市千波町地先（国道50号）
- (3) 工 期：全体工期 契約締結の翌日から令和7年2月28日まで
余裕期間制度（フレックス方式）
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：通信設備工事
- (6) 工事内容（概要）：

監視カメラ設置	5 台
監視制御サーバ設置	1 台
カメラ支柱設置	5 基
機器据付工	1 式
配管配線工	1 式
作業土工	1 式

■工事概要図

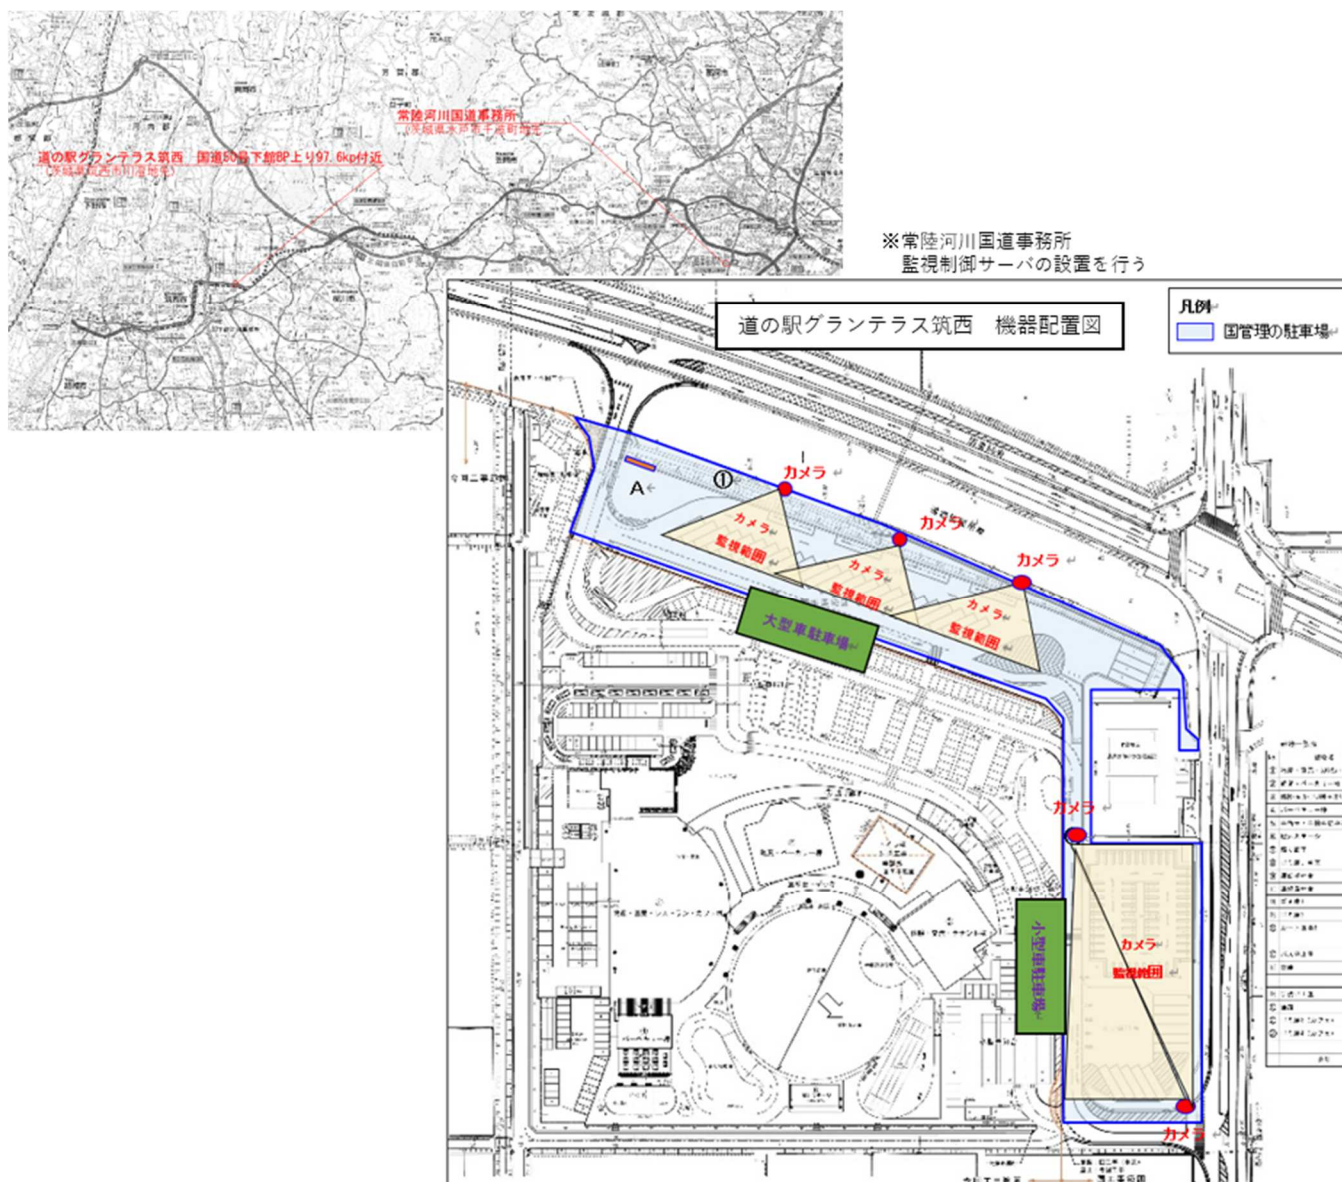

《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

- 1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。
(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)
- 2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実施を加算点としています。
- 3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「茨城県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

2) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績を「屋外型カメラ」に限定せず、「光ケーブルを介するカメラ設備を設置した工事」として緩和をします。

3. 余裕期間制度（フレックス方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和7年2月28日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

4. 世界的な半導体不足による工期等

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない場合は、協議の対象にします。

5. 機器単体費の提示

本工事は、監視カメラ及び監視制御サーバに係る機器単体費を歩掛見積参考資料に提示することを試行します。

6. 配置予定技術者の専任を要しない期間

本工事は、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任（監理）技術者の専任を要しないものです。


《スケジュール》

○入札公告、入札説明書交付	： 令和 6 年 1 月 2 5 日（木）
○技術資料等の提出期限	： 令和 6 年 2 月 6 日（火）
○入札書・工事費内訳書の提出期限	： 令和 6 年 3 月 6 日（水）
○開札日	： 令和 6 年 3 月 1 1 日（月）

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

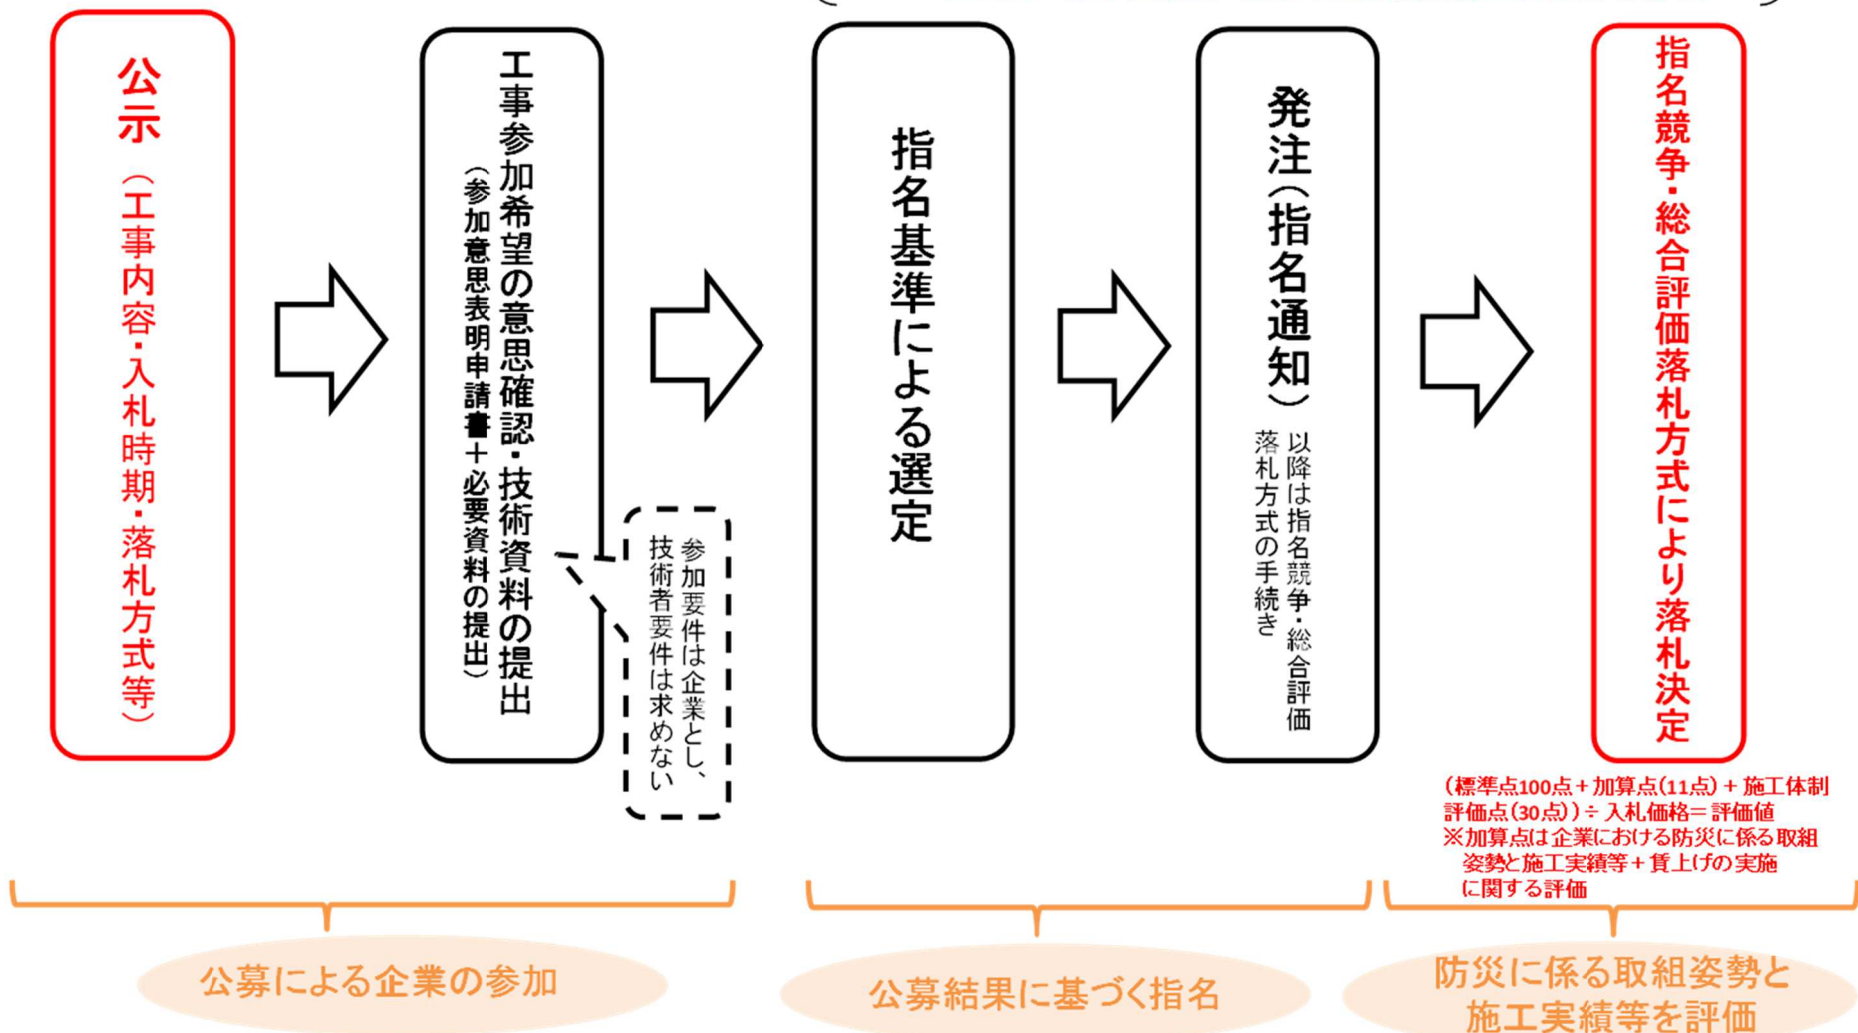

概略工事工程表
工事名：R5常陸管内道の駅カメラ他設置工事

工 種		単位	数量	令和6年												令和7年		備 考
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			
準備期間		式	1		余裕期間 ※任意で 設定可能													準備・調査 50日間
機器製作（監視カメラ・監視制御サーバ）		式	1															150日間
カメラ支柱設置工・作業土工		式	1															(1pt)
配管配線工・作業土工		式	1															(1pt)
機器据付工		式	1															(1pt)
後片付け		式	1														20日間	
条制 件約	夏季休暇・年末年始																8月上旬～8月中旬 12月下旬～1月上旬	

《余裕期間制度（フレックス）の活用について》

本工事は、受注者の円滑な工事施行体制の確保を図るため、事前に建築資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）の内で、受注者は工事の始期と終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者等の配置が不要となります。

《※1 現地での施工について》

機器製作に関わらない現地での施工について着手時期を制約するものではありません。
