

令和 7 年 1 月 16 日
国土交通省関東地方整備局
江戸川河川事務所

工事発注手続きについて

～「R 6 中川・綾瀬川河川流量観測装置設置工事」の発注手続きを行います～

江戸川河川事務所が発注する「R 6 中川・綾瀬川河川流量観測装置設置工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R 6 中川・綾瀬川河川流量観測装置設置工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 余裕期間制度（任意着手方式）
4. 世界的な半導体不足による工期延期等
5. 機器単体費の提示

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 茨城県政記者クラブ 埼玉県政記者クラブ 千葉県政記者会 東京都庁記者クラブ 神奈川県政記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 江戸川河川事務所

電話：04-7125-7311（代表） FAX：04-7123-7347


副所長（工事） 齊藤（さいとう）（内線：204）



防災対策課 課長 酒井（さかい）（内線：281）

《工事概要》

- (1) 工 事 名：R 6 中川・綾瀬川河川流量観測装置設置工事
- (2) 工事場所：千葉県野田市宮崎 1 3 4、埼玉県吉川市地先、埼玉県草加市松江地先
- (3) 工 期：工事の始期から 1 2 2 日間
(但し、令和 7 年 4 月 1 日 (火) (工事着手期限) までに工事を開始すること。)
余裕期間制度 (任意着手方式)
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式 (総合評価落札方式) 企業実績評価型
- (5) 工事種別：通信設備工事
- (6) 工事内容：
- | | |
|------------------|------|
| C C T V カメラ設置工 | 2 箇所 |
| 風向風速計設置工 | 2 箇所 |
| 近赤外線 L E D 照明設置工 | 1 式 |
| 流速・流量計測処理装置設置工 | 1 式 |
| 機器設置工 | 1 式 |


■工事概要図

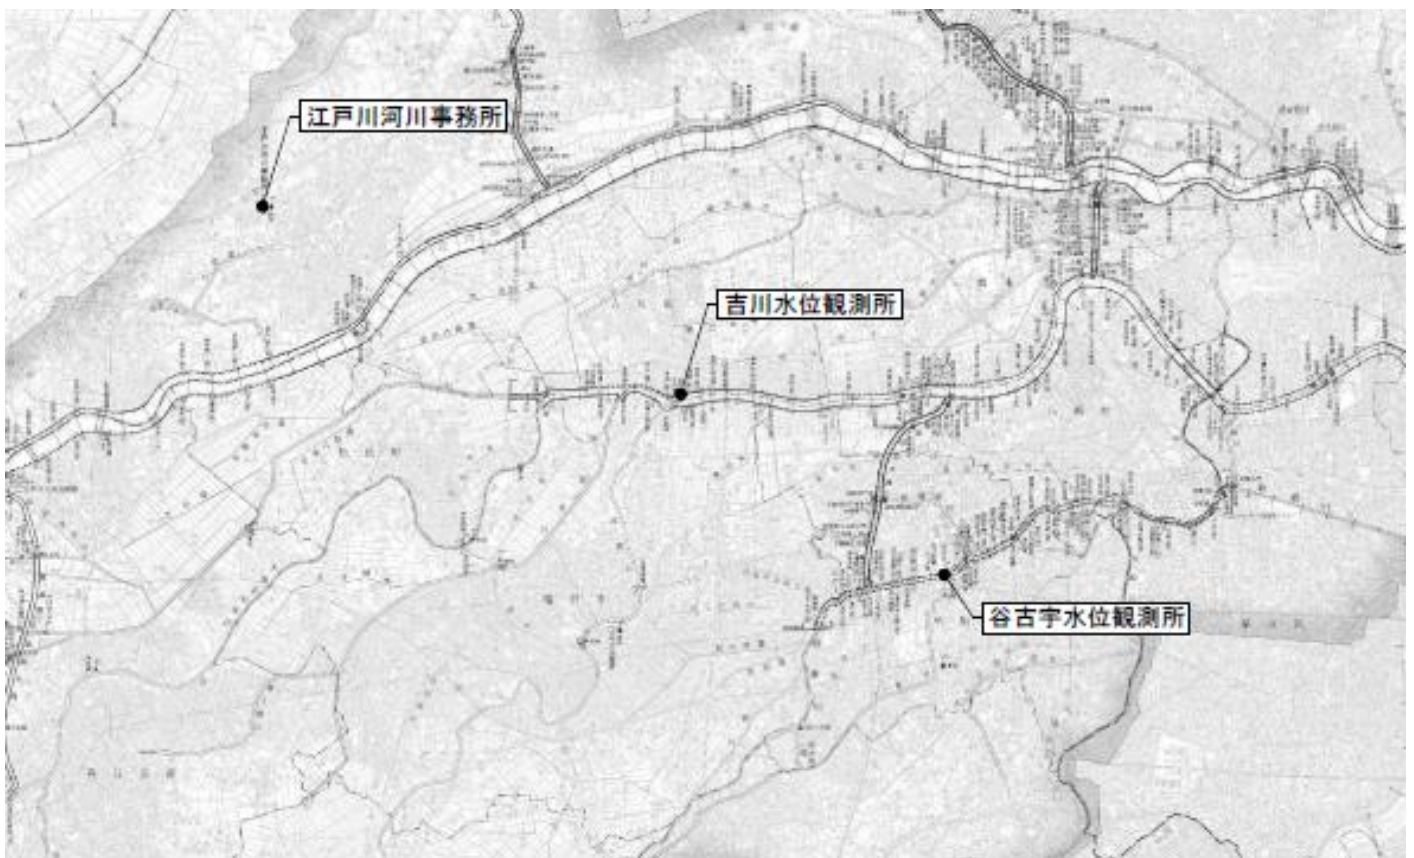

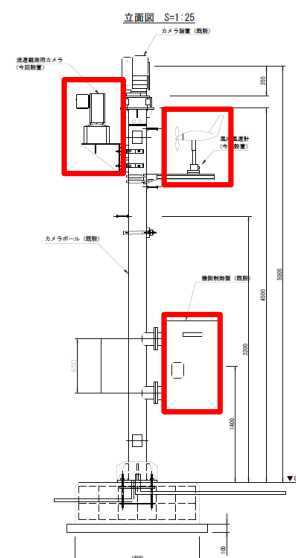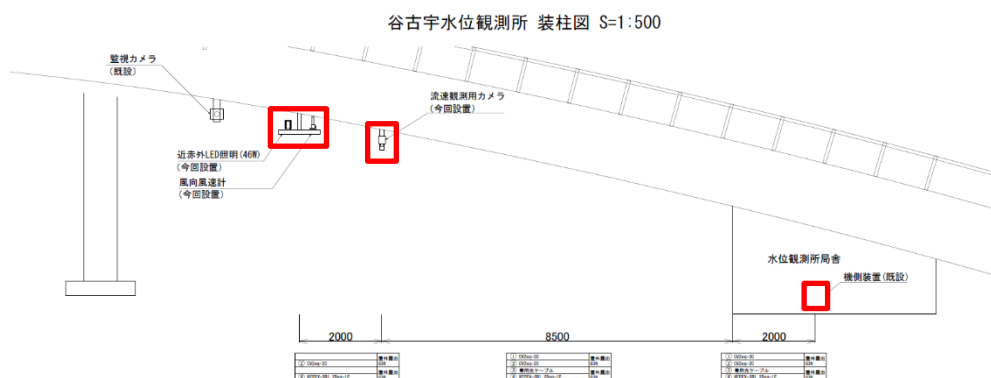

綾瀬川左岸栄地先付近（谷古宇水位観測所）

吉川左岸平沼地先(吉川水位観測所)

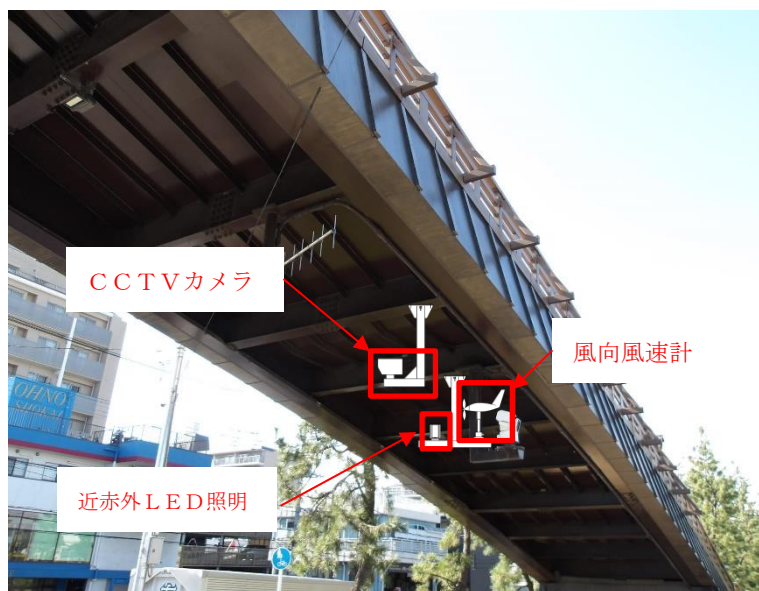

《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数見込まれ、技術的難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

- 1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。
(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)
- 2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施を加算点としています。

3) 過去の工事实績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的要件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「埼玉県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

3. 余裕期間制度（任意着手方式）

本工事は、受注者の円滑な工事実施体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備ができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和7年4月1日までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

4. 世界的な半導体不足による工期延期等

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない等、工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期の延長を実施します。

5. 機器単体費の提示

本工事は、CCTVカメラ装置、風向風速計及び流速・流量計測処理装置に係る機器単体費を歩掛見積参考資料に提示することを試行します。

《スケジュール》

○入札公示、入札説明書交付	：令和7年1月16日（木）
○技術資料等の提出期限	：令和7年1月27日（月）
○入札書、工事費内訳書の提出期限	：令和7年3月3日（月）
○開札日	：令和7年3月6日（木）

概略工事工程表

工事名：R6中川・綾瀬川河川流量観測装置設置工事

工 種	単位	数 量												備考
			1	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
準備・調査	式	1												準備・調査 30日間
機器製作(通信設備製作)	式	1												60日間
機器設置工	式	1												(1pt)
後片付け	式	1												20日間
制 約 条 件	関係機関協議	—												
	住民合意	—												
	用地確保	—												
	法定手続き	—												
	支障物件の移設	—												
	お盆	—												・8月中旬
	出水期間	—												・6月上旬～11月下旬

工期：工事の始期から122日間（但し、令和7年4月1日までに工事を開始すること。）

《関係機関協議》

工事着手にあたっての関係機関協議について、施工計画書を基とした協議資料作成は受注者が行い、協議は発注者が主体となって実施します。

《余裕期間制度(任意着手方式)の活用について》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができ、受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ 総合評価落札方式・企業実績評価型
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

