

令和7年1月20日
国土交通省関東地方整備局
富士川砂防事務所

工事発注手続きについて

～「R6 広河内(ひろこうち)工事用道路工事」の発注手続きを行います～

富士川砂防事務所が発注する「R6 広河内(ひろこうち)工事用道路工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R6 広河内(ひろこうち)工事用道路工事」については、以下の不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策】

1. 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更
2. 余裕期間制度（任意着手方式）
3. 一般競争入札（総合評価落札方式）自治体実績チャレンジ型

※詳細は次頁以降をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、山梨県政記者クラブ、長野県庁会見場、長野市政記者クラブ、長野市政記者会

<問い合わせ先>

関東地方整備局 富士川砂防事務所

電話：055-252-7108（代表） F A X：055-252-1956


副所長（技） 榑林（くればやし）（内線：204）

工務課長 清水（しみず）（内線：311）


《工事概要》

- (1) R 6 広河内工事用道路工事
- (2) 施工場所：山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先
- (3) 全体工期：工事の始期から 609 日間
(令和 7 年 4 月 1 日(工事着手期限)までに工事を開始すること))
(余裕期間制度(任意着手方式))
- (4) 入札方式：一般競争入札（総合評価落札方式）自治体実績チャレンジ型
- (5) 工事種別：一般土木工事 C 等級
- (6) 工事内容（概要）：

道路改良工		1 式
道路土工	盛土工	約 8800m3
擁壁工	補強土壁工	約 130m
舗装工		約 1180m2
仮設工		1 式

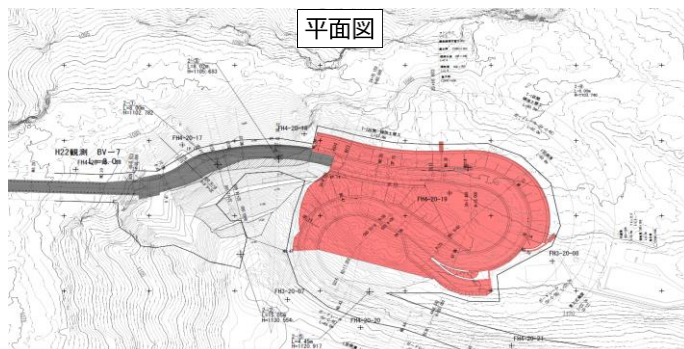

出典:国土地理院ウェブサイト
(<https://maps.gsi.go.jp/>)を加工して作成

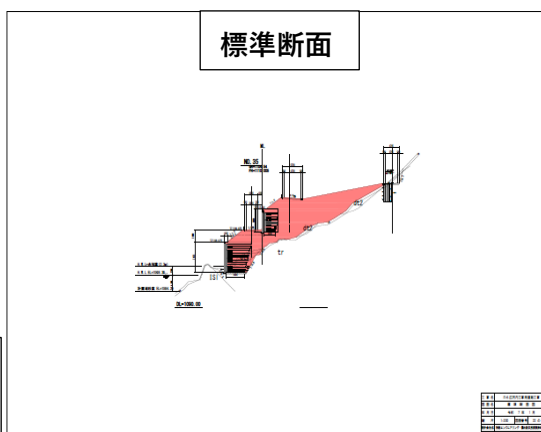

《不調不落対策》

1. 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更

「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用について、その妥当性を確認のうえ設計変更の対象とします。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

構成費目		率分に含まれる主な項目
営繕費	借上費	建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用
	宿泊費	労働者が、旅館・ホテル等に宿泊した場合に要した費用
	労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送するために要した費用
現場管理費	労務管理費	募集・解散費、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

2. 余裕期間制度（任意着手方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に受注者は工事の始期を任意に設定することができます。ただし、現場着手期限は令和 7 年 4 月 1 日までとなっています。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

3. 一般競争入札（総合評価落札方式）自治体実績チャレンジ型
地方整備局発注工事の実績が無い（少ない）企業であっても、自治体（都県政令市）の工事成績等により評価できる方式です。

総合評価の配点の特徴

自治体実績チャレンジ型

【企業の技術力】

- 1) 工事成績
 - ・都県政令市発注工事の当該工種工事における工事成績評定点（同一機関：2件）の平均点を評価
（※国成績を有している企業は、国の成績で評価する）
- 2) 優良工事等表彰
 - ・都県政令市発注工事において受彰した知事表彰等の有無を評価
- 3) 本発注工事の工事種別における新規契約の有無を評価
- 4) 地域貢献度（災害協定）
 - ・都県政令市の災害協定も発注担当事務所の災害協定と同等に評価
- 5) 地域貢献度（災害協定に基づく活動実績）
 - ・都県政令市の災害協定に基づく活動実績も発注担当事務所の活動実績と同等に評価
- 6) 地域貢献度（災害時の基礎的事業継続力の認定）を評価

【配置予定技術者の技術力】

- 1) 同種工事の工事成績
 - ・競争参加資格を満たすことを証明するために提出した都県政令市の工事成績評定点を評価
- 2) 優秀工事技術者等表彰
 - ・都県政令市発注工事において受彰した技術者表彰の有無を評価

《スケジュール》

- 入札公示、入札説明書 交付 : 令和7年 1月20日（月）
- 競争参加資格確認申請書提出期限 : 令和7年 1月30日（木）
- 入札書・工事費内訳書 提出期限 : 令和7年 2月20日（木）
- 開札日 : 令和7年 2月26日（水）

概略工事工程表		別紙-5																							
工事名：R6広河内工用道路工事																									
工 種	単位	数	令和6年度	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	備考
準備	式	1																							・50日間(うち冬期休業期10日間)
道路土工	式	1																							・掘削工(1pt)
道路土工	m3	10,240																							・路床盛土工(1pt) ・路体盛土工(1pt) ・路床盛土工(1pt) ・路体盛土工(1pt) ・路床盛土工(1pt)
擁壁土工 重力式擁壁(0-12)	m	23																							・擁壁工(構造単位)(1pt)
擁壁工 ジオテキスタイル補強土工(二重壁タイプ)	m	124																							・補強土工(二重壁)(T-1工区)(1pt) ・補強土工(二重壁)(T-2工区)(1pt)
排水構造物工	式	1																							・側溝工(1pt) ・側溝工(マンホール工)(1pt) ・側溝工(マンホール工)(1pt) ・側溝工(マンホール工)(1pt) ・側溝工(マンホール工)(1pt)
防護欄工	式	1																							・防護欄工(1pt) ・防護欄工(1pt)
舗装工	m2	1,180																							・アスファルト舗装(1pt) ・コンクリート舗装(1pt)
竣工付付	式	1																							・20日間
起算、年末年始	—	—																							・8月半 ・12月下旬～1月上旬
降雪等による 不稼働日	—	—																							・1月1日～3月31日
余裕期間	—	—																							・3月中旬～下旬

《余裕期間制度(任意)の手》の活用について
本工事は、受注者の円滑な工事実施体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に受注者は工事の始期を任意に設定することができます。ただし、現場着手期限は令和7年4月1日までとなっています。
なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。
