
若宮戸築堤工事工事見学会(第3回)

平成28年6月19日(日)

国土交通省 下館河川事務所 鎌庭出張所

渡辺建設(株) · 松浦建設(株)


■若宮戸築堤工事 堤防の概要

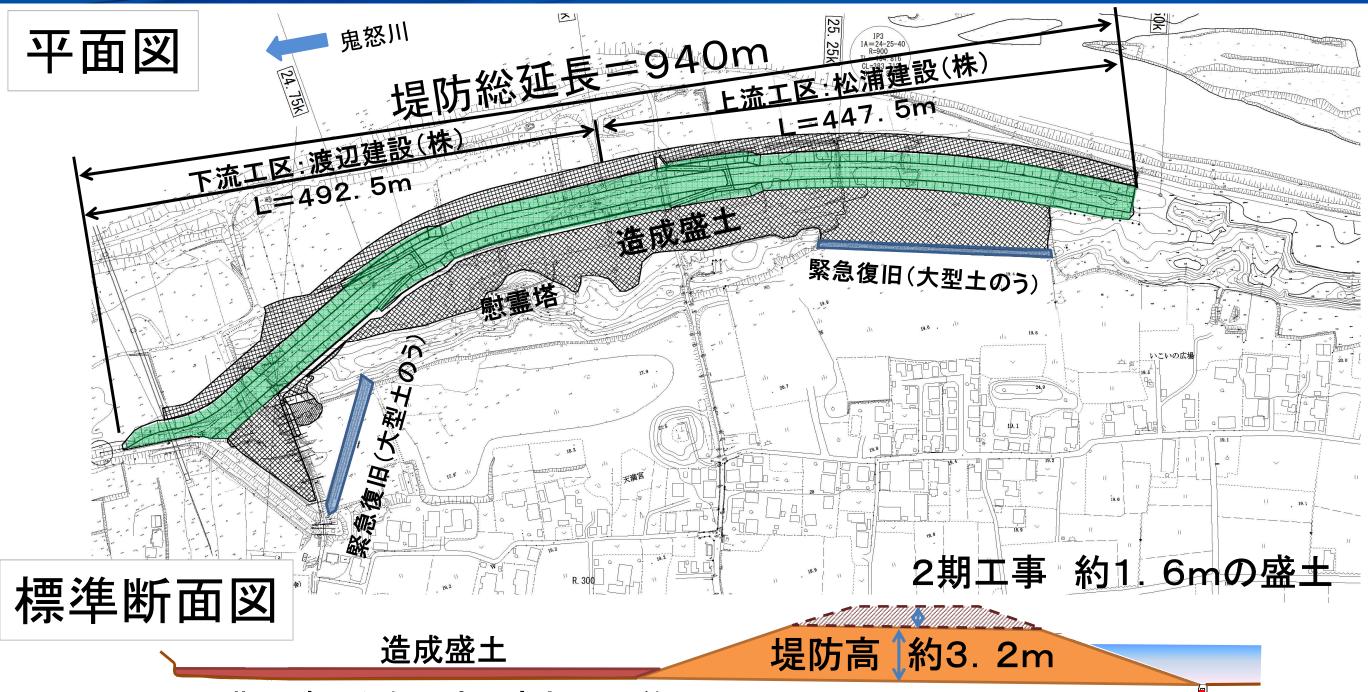

- ・1期工事で行う堤防の高さは、約3.2m
- ·堤防敷幅 約31m、 天端幅 約14.5m
- ・沈下を確認したうえで、 2期工事により、約1.6mの 盛土を行います。 最終的な天端幅は6mとなります。

鋼矢板 L=10m~12.5m

■若宮戸築堤工事 1期工事完了時 断面図(イメージ)

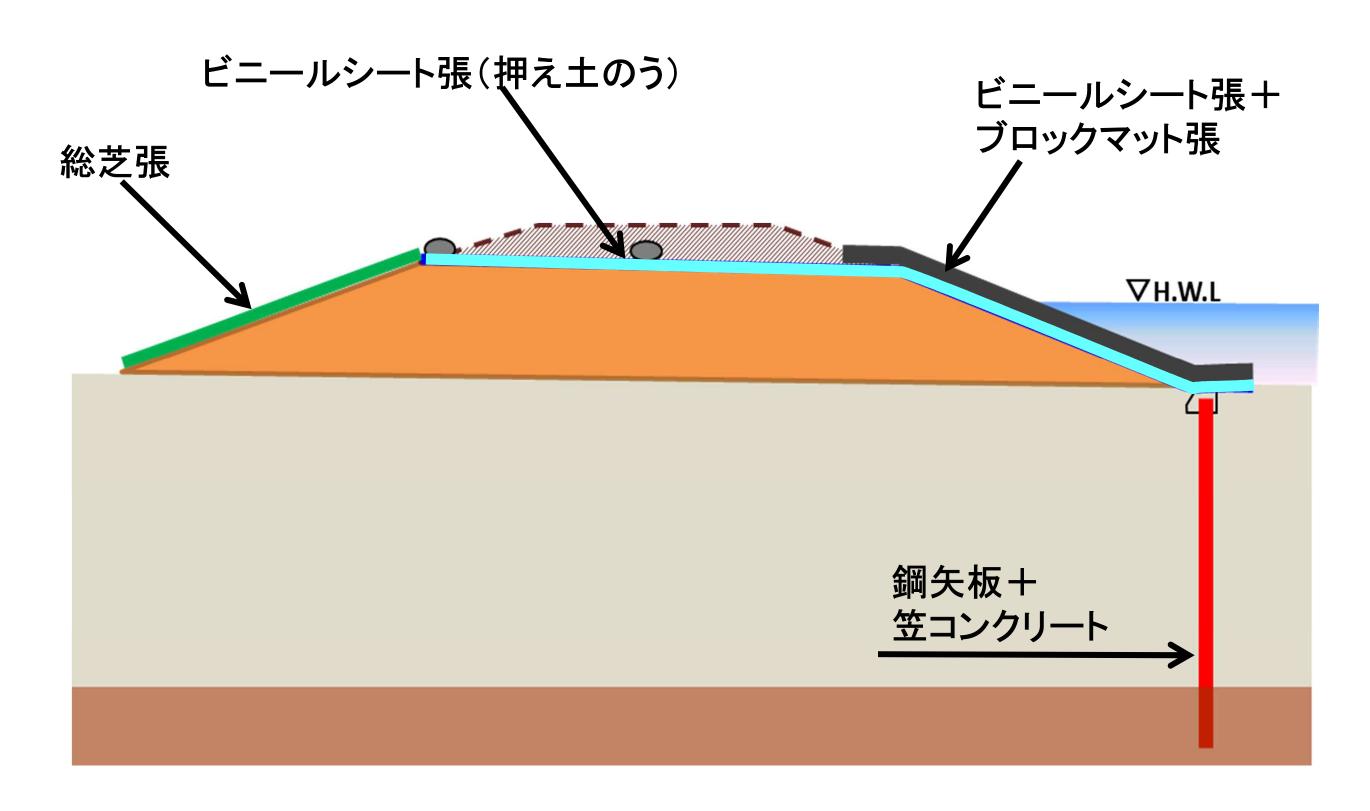

■工事の作業工程

3/28

伐採、除根

- -盛土部
- •工事用道路部



基盤整備







基盤整備

- -盛土部
- ・くぼ地埋戻し
- ・混合ヤード



- 4/28
- 築堤土作成
- •混合土材料運搬
- •築堤土混合



土砂混合機による

築堤部及び

造成盛土部の伐採





4/30

試験盛土



5/7~

築堤

- -盛土
- ・堤体養生(法面整形、芝など)



6/7~ 鋼矢板打設

- -鋼矢板打設
- ・笠コンクリート施工




大型土のう撤去

造成盛土






■築堤工事進捗状況(平成28年6月19日時点)

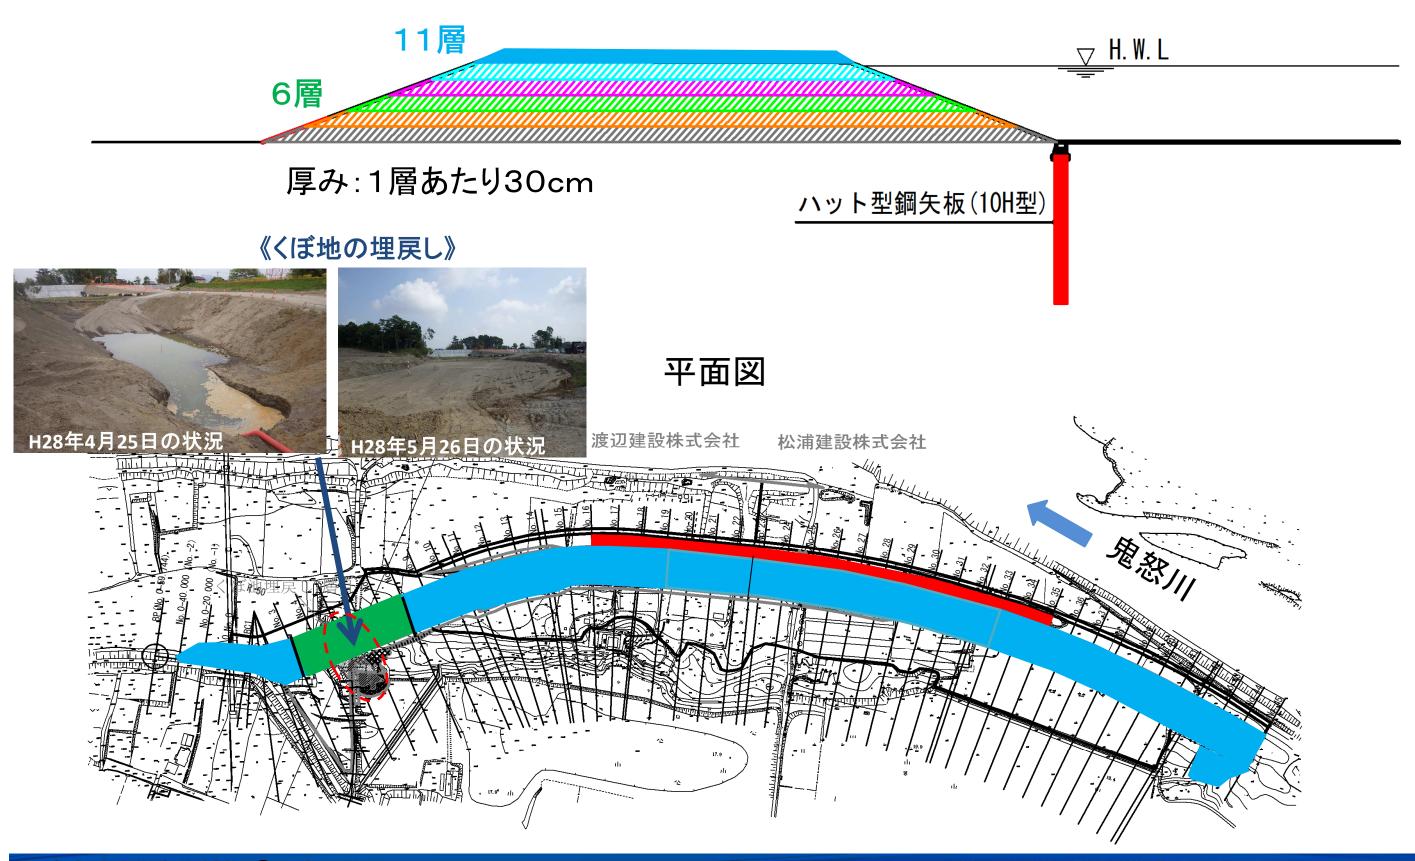

■鋼矢板の打設手順

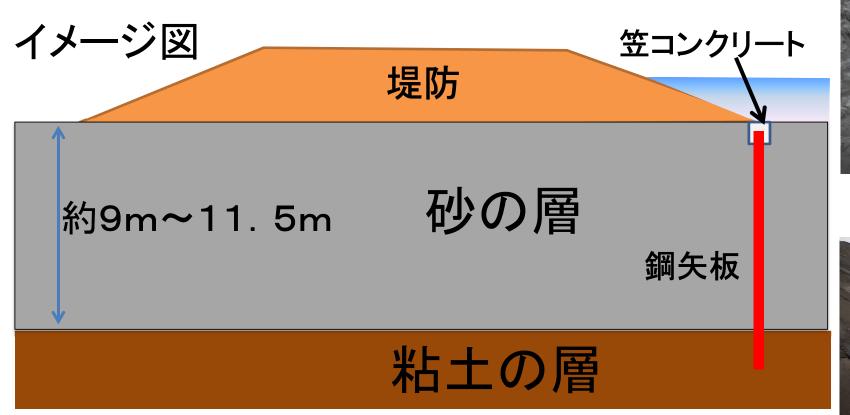








鋼矢板打設から笠コンクリート設置までの作業手順

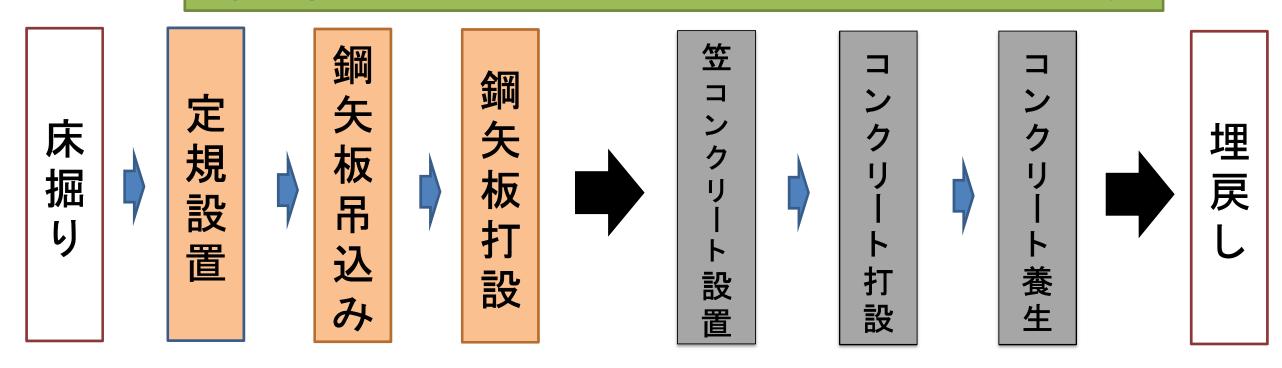


■従来工法との比較(鋼矢板 と 笠コンクリート)

■鋼矢板の打設について《鋼矢板施工延長》:約905m

■笠コンクリートの設置 《笠コンクリート施工延長》:約905m

【従来:U型 鋼矢板】 幅40cm

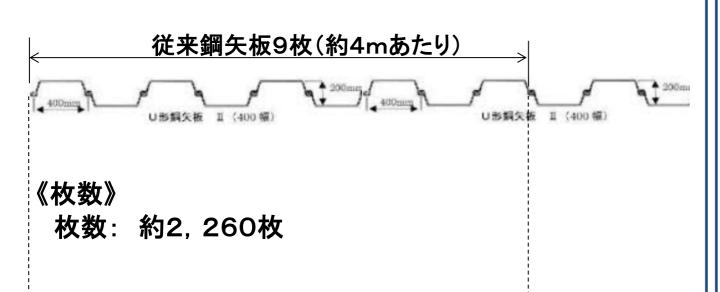

【従来:コンクリート現場打設】








《作業工程》①鉄筋組立て

- ②型枠組立て
- ③生コンクリートを注入
- 4 固まるまで養生
- ⑤型枠取外し



【今回:ハット型 鋼矢板】 幅90cm



《枚数》

枚数:約1,000枚

《メリット》

従来鋼矢板の2枚分が今回のハット型なら1枚で施工可能。

約4割程度、鋼矢板打設期間の短縮が図れます。

【今回:プレキャスト(工場製作製品)】





《作業工程》

《メリット》

- ①鋼矢板頭部に設置 工場製作製品であるため、従来現場打
- ②生コンクリートを注入ち笠コンクリートの工程を省略
- ③固まるまで養生 (従来工法の①②⑤工程を省略)

約7割程度、笠コンクリート設置期間の短縮が図れます。

■若宮戸築堤工事 築堤工事見学会の経路

