

## 記者発表資料

**R3烏川右岸根小屋第4排水樋管新設工事**において  
「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」、「余裕期間  
制度」、「週休2日制適用工事(発注者指定方式)」、「生産性向  
上チャレンジ」を試行します。

今回発注する「R3烏川右岸根小屋第4排水樋管新設工事」においては、  
資格要件を「河川における築堤工事又は護岸工事」とし、より多くの企業に  
参加いただくため、以下の取組を試行しておりますので、ご紹介します。

- ①「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」
- ②「余裕期間制度(フレックス)」
- ③「週休2日制適用工事(発注者指定方式)」
- ④「生産性向上チャレンジ」

### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、刀水クラブ・テレビ記者会、高崎記者クラブ

### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所

電話 027-345-6000(代表)

副所長 あらかわ 荒川 よしこ 佳子 工務第一課長 たなか 田中 よしたか 芳貴

## 《工事概要》

- (1) 工事名 : R3烏川右岸根小屋第4排水樋管新設工事
- (2) 工事場所 : 群馬県高崎市根小屋町地先
- (3) 全体工期 : 契約締結の翌日から令和5年3月24日まで  
余裕期間制度（フレックス方式）
- (4) 入札方式 : 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (5) 工事種別 : 一般土木工事
- (6) 工事内容 : 樋門・樋管

・盛土工	約3,800m <sup>3</sup>
・法覆護岸工	約230m <sup>2</sup>
・矢板工	約70枚
・コンクリート工	約160m <sup>3</sup>
・鉄筋工	約10t
・付帯道路工	1式
・ゲート設備工	1式

## 航空写真




## 《工事概要》


### (7) その他項目

- 本工事の資格要件は、「河川における築堤工事又は護岸工事」となります。
- 施工ヤードとして考えている川表高水敷及び、施工箇所の用地については取得済みです。
- 施工箇所と近隣の家屋等は近接していないため、家屋調査等は不要であり、直ちに着手出来ます。
- 工事着工にあたっての関係機関協議（高崎市）、地元説明（関係区長）は、発注者が主体となって実施します。
- 無堤部での樋管新設工事であるため、出水期間中も施工が可能です。また、仮締切が不要です。
- 主たる建設資材（フラップゲート等）は、歩掛見積参考資料にて歩掛公表とともに公表します。

### 樋管縦断図

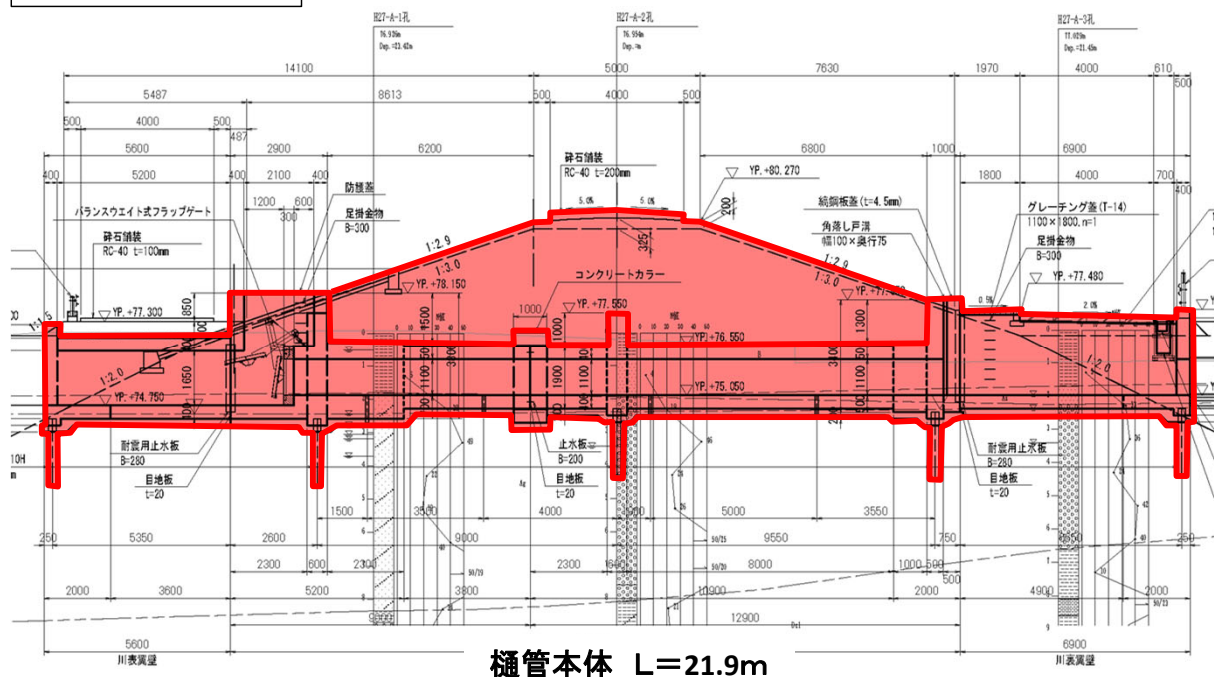

### 樋管標準断面図

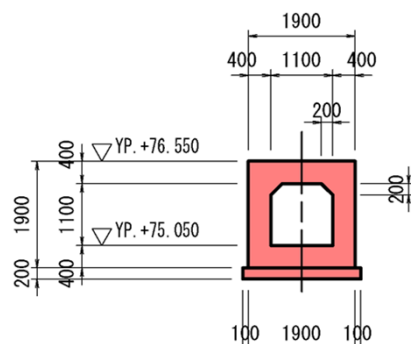

## 《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）の試行について》

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。

なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

## 《余裕期間制度（フレックス）の活用について》

本工事は、受注者の円滑な工事施行体制の確保を図るため、事前に建築資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）の中で、受注者は工事の始期と終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

※P.5に発注者が想定した概略工事工程表を参考に添付しますが、受注者はこの工程表にとらわれることなく、任意に工期を設定できます。

## 《週休2日制適用工事（発注者指定方式）について》

余裕期間制度（フレックス）の試行と併せることにより、より計画的な週休2日制が設定可能です。

週休2日を確保した工事及び週休2日の確保に向けた企業の取組が図られている工事については、工事成績評点の加点評価の対象となるとともに、基準を満たした場合には履行実績取組証が発行され、その後の発注工事の総合評価落札方式の評価項目であった場合加点評価されます。

## 《生産性向上チャレンジについて》

受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」を行う試行工事です。

施工計画書で位置づけた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認された場合は、工事成績評定において加点を行います。

## 《スケジュール》

○入札公示、入札説明書 交付	：	令和4年	1月21日（金）
○競争参加資格確認申請書等 提出期限	：	令和4年	2月 1日（火）
○入札書・工事費内訳書 提出期限	：	令和4年	3月 1日（火）
○開札日	：	令和4年	3月 4日（金）

概略工事工程表

工事名 : R3烏川右岸根小屋第4排水樋管新設工事

工種	単位	数量	R3	R4												備考	
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
			← 全体工期 →														
準備工	式	1				■											・40日間
河川土工	式	1									■	■	■				1pt
法覆護岸工	式	1											■	■			1pt
樋門・樋管本体工	式	1					■	■	■	■							1pt
付属物設置工	式	1											■	■			1pt
付帯道路工	式	1												■			1pt
構造物撤去工	式	1					■										1pt
仮設工	式	1					■										1pt
水門設備 製作工	式	1					■	■	■	■							
水門設備 据付工	式	1								■	■						
後片付け	式	1														■	・20日間
制約条件	関係機関協議	—		■													・高崎市
	地元説明	—		■													・関係区長
	年末年始、お盆	—															・12月下旬～1月上旬 ・8月中旬
	出水期間	—					■	■	■	■							・6月～10月
路上工事抑制	—																

《余裕期間制度（フレックス）の活用について》

本工事は、受注者の円滑な工事施行体制の確保を図るため、事前に建築資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）の内で、受注者は工事の始期と終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《関係機関協議》

工事着手にあたっての関係機関協議（高崎市）、地元説明（関係区長）は、発注者が主体となって実施します。

# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について

対象は  
一般土木  
C,B+C工事  
維持修繕等

- 【メリット】
- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
  - ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出  
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
  - ✓ 手続期間の短縮  
→指名通知から決定まで2週間程度
  - ✓ 指名競争・総合評価落札方式  
→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

