

令和5年3月3日
国土交通省関東地方整備局
下館河川事務所

工事発注手続きについて

～「R4 鬼怒川下流部周辺整備工事」の発注手続きを行います～

下館河川事務所発注の「R4 鬼怒川下流部周辺整備工事」において、「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」を試行し、競争参加資格を緩和します。併せて「材料単価の公表」、「歩掛見積参考資料の交付」を採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。

今回発注する「R4 鬼怒川下流部周辺整備工事」については、以下の不調・不落対策を試行します。

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
2. 競争参加資格の緩和
3. 材料単価の公表
4. 歩掛見積参考資料の交付

※詳細は次ページをご覧ください。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、
栃木県政記者クラブ、筑西市記者クラブ、宇都宮市政記者クラブ、筑波研究学園都市記者会

<問い合わせ先>

関東地方整備局 下館河川事務所


電話：0296-25-2161（代表） FAX：0296-25-2192

副所長 岡戸 昌利（おかど まさとし）（内線：204）

工務課 課長 村山 啓（むらやま はじめ）（内線：311）

《工事概要》

- 1) 工事名 : R 4 鬼怒川下流部周辺整備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県下妻市二本紀地先 他
- 3) 工期 : 契約締結の翌日から令和6年3月29日まで
- 4) 入札方式 : 公募型指名競争入札 (総合評価落札方式) 地域防災実績評価型
- 5) 工事種別 : 維持修繕工事
- 6) 工事内容 :
 - 河川維持 (下妻市二本紀地先)
 - ・根固ブロック工 約2,300個
 - ・袋詰玉石 約800袋
 - 河川維持 (下妻市鎌庭地先)
 - ・掘削工 約1,100m³
 - 河川維持 (筑西市伊佐山地先)
 - ・アスファルト舗装工 約9,700m²
 - 河川維持 (鬼怒川下流部)
 - ・付属物設置工 (車止め64基設置) 1式
 - ・維持工 1式

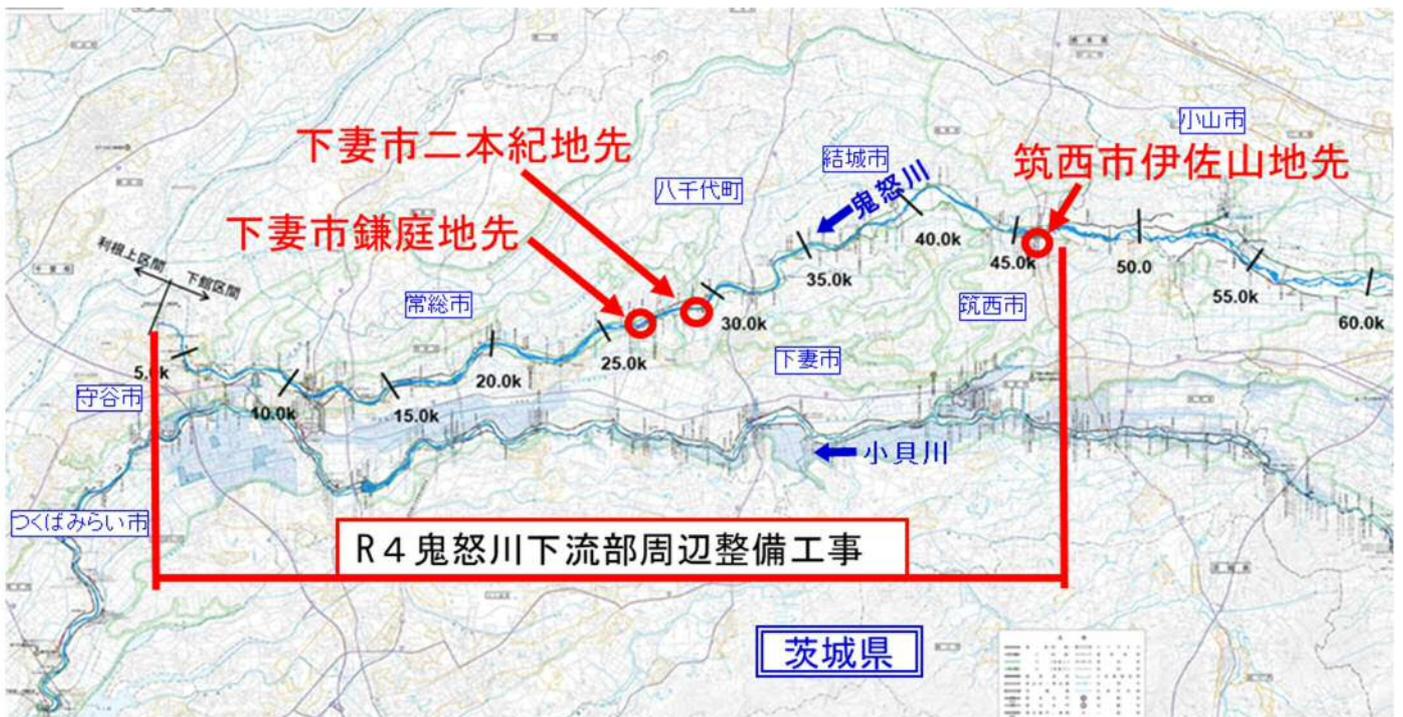

7) その他：

- 根固ブロック製作に当たっては、製作ヤードとして川表高水敷の使用を想定しています。
- 施工箇所及び根固ブロック製作ヤードの用地は、取得済みです。
- 施工箇所と近隣の家屋等は近接していないため、家屋調査等は不要であり、契約後直ちに着手出来ます。
- 本工事は、根固めブロック製作及び据付、袋詰玉石据付、アスファルト舗装、車止め設置については、出水期間中(6月1日～10月31日)の施工が可能です。



【根固ブロック工 据付イメージ】

概略工事工程表
工事名：R4鬼怒川下流部周辺整備工事

| | 単位 | 数量 | 令和4年度 | | | | | | | | | | | | 備考 (n→r(pt)数等) | | | |
|--------------|---------|----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------------------|---|--|------------------------------------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | |
| 準備工 | 式 | 1 | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | ・40日間 |
| 河川維持(二本紀地区) | 式 | 1 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ・根固めブロック製作・据付(1pt) ・袋詰玉石据付(1pt) |
| 河川維持(鎌庭地区) | 式 | 1 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | ・坂路撤去(1pt) |
| 河川維持(RS鬼怒緑地) | 式 | 1 | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | ・アスファルト舗装(1pt) |
| 河川維持(鬼怒川下流部) | 式 | 1 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ・車止め設置(1pt) |
| 後片付け | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | ■ | | ・20日間 |
| 制約条件 | 年末年始、お盆 | — | | | | | | | | | | | | | | | | ・12月下旬から1月上旬 ・8月中旬 |
| | 出水期間 | — | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ・6月1日～10月31日 |

《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）地域防災実績評価型》

競争参加者が少数と見込まれる対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。

なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施を加算点としています。

《競争参加資格の緩和》

企業に求める施工実績を「河川における維持修繕工事」に限定せず、「河川工事であること。」として緩和をします。

《材料単価の公表》

事業執行における円滑な発注及び施工体制の確保に向け特別調査（臨時調査）により設定した「主たる建設資材」の材料単価について公表を行います。

公表を行う材料は、次のとおりです。

- 車止めポスト（P型 H=1100 W=1500）
- 車止めポスト（I型 H=1100）

《歩掛見積参考資料の交付について》

交付を行う工種は、次のとおりです。

- 直接工事費の「袋詰玉石据付」のうち、袋詰玉石据付工
- 直接工事費の「袋詰玉石積込・運搬」のうち、袋詰玉石運搬工、及び袋詰玉石積込工
- 直接工事費の「車止めポスト（P型 H=1100 W=1500）」のうち、車止め設置工
- 直接工事費の「車止めポスト（I型 H=1100）」のうち、車止め設置工
- 直接工事費の「車止めポスト（門型 H=650 W=1500）」のうち、車止め設置工
- 直接工事費の「法肩ブロック撤去」のうち、法肩ブロック撤去工

《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書の交付 : 令和5年3月 3日（金）
- 参加表明書確認申請書等の提出期限 : 令和5年3月14日（火）
- 入札書、工事費内訳書の提出期限 : 令和5年4月17日（月）
- 開札日 : 令和5年4月20日（木）

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について


対象は
一般土木
C,B+C工事
維持修繕等

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **指名競争・総合評価落札方式**
→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

公示

(工事内容・入札時期・落札方式等)



工事参加希望の意思確認・技術資料の提出

(参加意思表明申請書+必要資料の提出)



参加要件は企業とし、
技術者要件は求めない

指名基準による選定



発注(指名通知)

以降は指名競争・総合評価
落札方式の手続き



指名競争・総合評価落札方式により落札決定

(標準点100点+加算点(11点)+施工体制
評価点(30点))÷入札価格=評価値
※加算点は災害活動実績+質上げの実施
に関する評価

公募による企業の参加

公募結果に基づく指名

災害協定の締結や活動に
係るインセンティブの向上
