

令和6年1月5日
国土交通省関東地方整備局
利根川ダム統合管理事務所

工事発注手続きについて

～「R5相俣ダム堤内(ていない)排水設備更新工事」の発注手続きを行います～

利根川ダム統合管理事務所が発注する「R5相俣ダム堤内(ていない)排水設備更新工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りやめや不調が予測される工事について不調・不落対策等を試行、採用しております。

今回発注する「R5相俣ダム堤内(ていない)排水設備更新工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 余裕期間制度（発注者指定方式）
4. 配置予定の主任（監理）技術者の専任不要

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、刀水クラブ・テレビ記者会

<問い合わせ先>

国土交通省関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所

電話：027-251-2021（代表） FAX：027-251-7229

副所長 黒岩 久一（くろいわ ひさかず）（内線：204）

保全対策官 中根 好久（なかね よしひさ）（内線：308）

《工事概要》

- (1) 工 事 名：R5 相俣ダム堤内(ていない)排水設備更新工事
- (2) 工事場所：群馬県利根郡みなかみ町相俣地先 相俣ダム
- (3) 工 期：令和6年4月1日から令和7年2月28日
(余裕期間：契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで)
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)企業実績評価型
- (5) 工事種別：機械設備工事
- (6) 工事内容(概要)：


排水ポンプ	製作・撤去・据付	一式
ポンプ制御盤	製作・撤去・据付	一式
配管	製作・撤去・据付	一式
付属設備	製作・撤去・据付	一式




施工場所(下部監査廊)



既設排水管

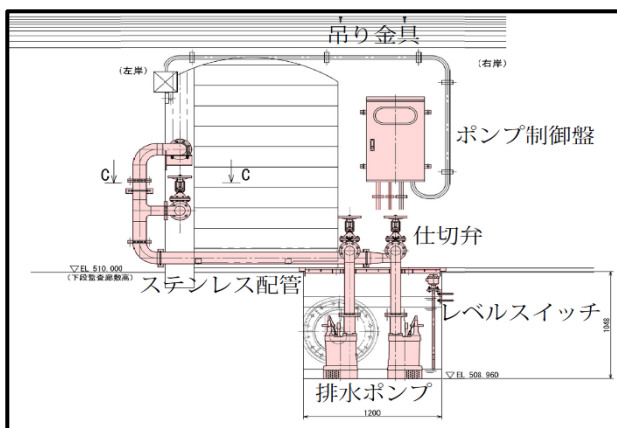

(下部監査廊) 完成イメージ図 (一部分)

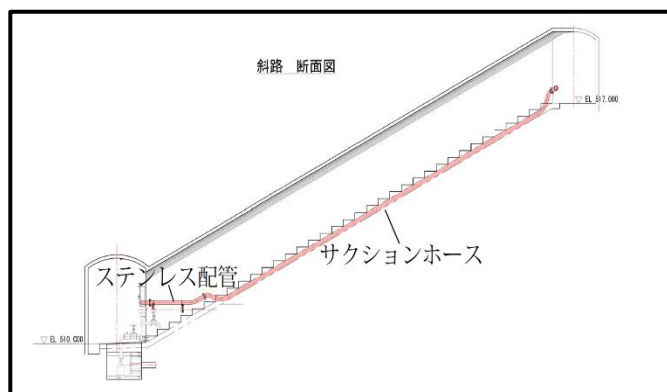

(階段部監査廊)

《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札 (総合評価落札方式) 企業実績評価型
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

- 1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。
(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)
- 2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢・活動実績、企業の同種工事の施工実績（民間工事を含む）と本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実施を加算点としています。
- 3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

1) 地域要件について

競争参加資格として企業の本店等の所在地の地域要件は求めません。

2) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績を「ポンプ設備の更新工事」に限定せず、「ポンプ設備の新設・更新・改造又は修繕工事」として緩和をします。

3. 余裕期間制度（発注者指定方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約の翌日から発注者が指定した工事の始期（令和6年3月31日）までが余裕期間となります。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

4. 配置予定の主任（監理）技術者の専任不要

本工事は、配置予定の主任（監理）技術者について専任の必要はありません。

《発注スケジュール》

○入札公示、入札説明書の交付	： 令和6年 1月 5日（金）
○技術資料等の提出期限	： 令和6年 1月17日（水）
○入札書、工事費内訳書の提出期限	： 令和6年 2月19日（月）
○開札日	： 令和6年 2月22日（木）

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

