

令和6年1月26日
国土交通省関東地方整備局
高崎河川国道事務所

工事発注手続きについて

～「R5国道17号名胡桃橋他橋梁補修工事」の発注手続きを行います～

高崎河川国道事務所が発注する「R5国道17号名胡桃橋他橋梁補修工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R5国道17号名胡桃橋他橋梁補修工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 難工事指定
4. 余裕期間制度（任意着手方式）
5. 施工箇所が点在する工事の積算

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 刀水クラブ・テレビ記者会 高崎記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 高崎河川国道事務所

電話：027-345-6000（代表） FAX：027-345-6085

副所長 洲永 美秋（すなが よしあき）（内線204）

道路管理第二課長 馬場 治男（ばば はるお）（内線441）

《工事概要》

- (1) 工事名：R5国道17号名胡桃橋他橋梁補修工事
- (2) 工事場所：自) 群馬県利根郡みなかみ町下津
至) 群馬県利根郡みなかみ町永井
- (3) 工期：工事の始期から270日間
(但し、令和6年4月1日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)企業実績評価型
- (5) 工事種別：橋梁補修
- (6) 工事内容(概要)
 - 1) 名胡桃橋(なぐるみばし)
 - ・舗装工 600㎡
 - ・鋼桁工 2箇所
 - ・排水施設工 174m
 - ・橋梁高欄工 195m
 - ・ひび割れ補修工 364m
 - ・断面修復工 10.3㎡
 - ・剥落防止対策工 248㎡
 - ・現場塗装工 144㎡
 - ・構造物撤去工 1式
 - ・仮設工 1式
 - 2) 大谷沢橋(おおたにさわはし)
 - ・洗堀対策工 38㎡
 - ・仮設工 1式
 - 3) 三丁橋(さんちょうはし)
 - ・舗装工 260㎡
 - ・伸縮継手工 33m
 - ・現場塗装工 100㎡
 - ・仮設工 1式

《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)

2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実施を加算点としています。

3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績を「道路橋における補修工事(塗装塗替工のみも含む)であること。」に限定せず、「道路橋における補修工事(塗装塗替工のみも含む)、補強工事、新設工事のいずれかを行った工事であること。」として緩和をします。

3. 難工事指定

本工事は、山間部急カーブ区間での、交通規制を行いながら仮設作業を施工することから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。

「難工事」指定された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間で評価対象となります。

4. 余裕期間制度（任意着手方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限日（令和6年4月1日）までの間において、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。


なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

5. 施工箇所が点在する工事の積算について

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

○点在する工事箇所

- 1) 名胡桃橋（群馬県利根郡みなかみ町下津地先）
- 2) 大谷沢橋（群馬県利根郡みなかみ町相俣地先）
- 3) 三丁橋（群馬県利根郡みなかみ町永井地先）

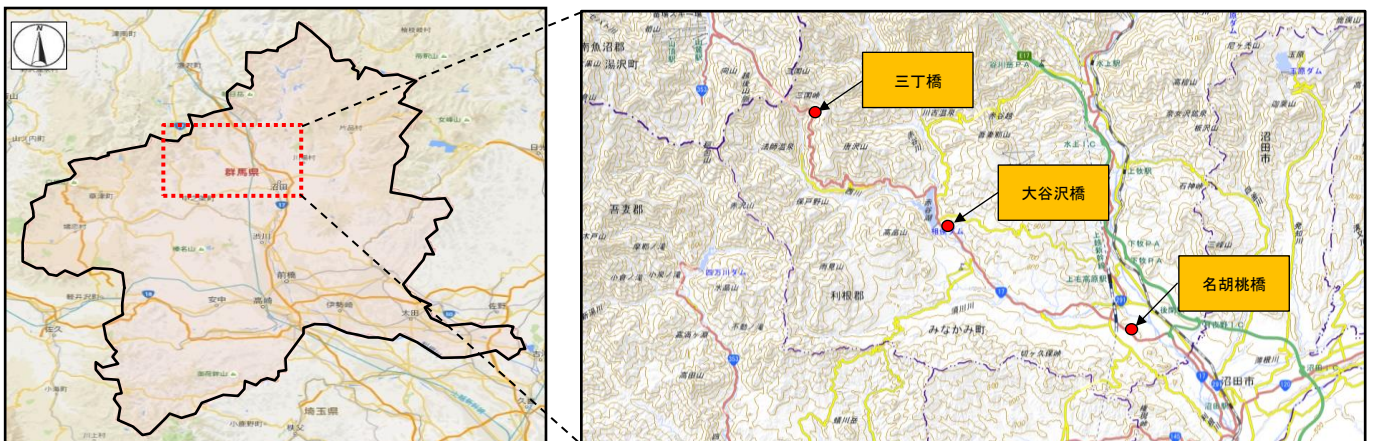

《スケジュール》

- | | |
|------------------|-----------------|
| ○入札公告、入札説明書交付 | ：令和 6年 1月26日（金） |
| ○技術資料等の提出期限 | ：令和 6年 2月 6日（火） |
| ○入札書・工事費内訳書の提出期限 | ：令和 6年 3月11日（月） |
| ○開札日 | ：令和 6年 3月14日（木） |

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

