

令和7年1月16日
国土交通省関東地方整備局
千葉国道事務所

工事発注手続きについて

～ 「R6国道127号川名・富浦地区改良その3工事」の発注手続きを行います ～

千葉国道事務所が発注する「R6国道127号川名・富浦地区改良その3工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りやめや不調が予測される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R6国道127号川名・富浦地区改良その3工事」において、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 余裕期間制度（任意着手方式）

※詳細は次頁をご覧ください

<発表記者クラブ>
竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会

<問い合わせ先>
関東地方整備局 千葉国道事務所
電話：043-287-0311（代表） メールアドレス：ktr-chiba-koho@mlit.go.jp
副所長 山本（やまもと）（内線：204）
工務課長 町田（まちだ）（内線：411）

《工事概要》



- (1) 工 事 名：R6国道127号川名・富浦地区改良その3工事
- (2) 工事場所：自) 千葉県館山市川名地先 至) 千葉県南房総市富浦町福澤地先
- (3) 工 期：工事の始期から311日間
(但し、令和7年4月1日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)

(4) 入札方式：公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)企業実績評価型

(5) 工事種別：一般土木工事 C等級

(6) 工事内容：道路土工	掘削	11,500m ³
	土砂等運搬	11,500m ³
法面工	法面整形	1,920m ²
	グラウンドアンカー	36本
	鉄筋挿入(D19 L=3.0m)	558本
	モルタル吹付	1,920m ²
排水構造物工	小段排水	240m
	現場打集水桝	4箇所
擁壁工	既製杭(φ267.4mm L=25m)	6本
	コンクリート	21m ³
	鉄筋	1.33t

■ 工事概要図

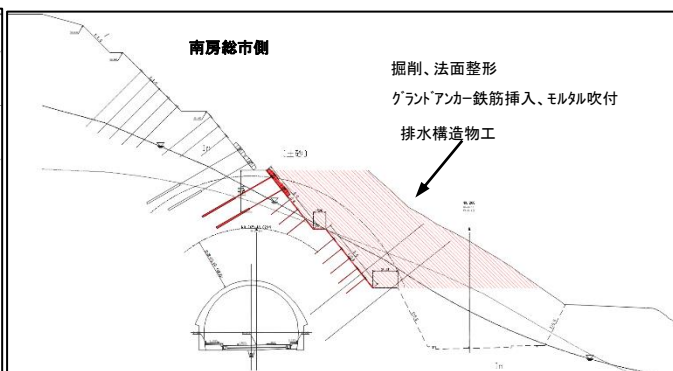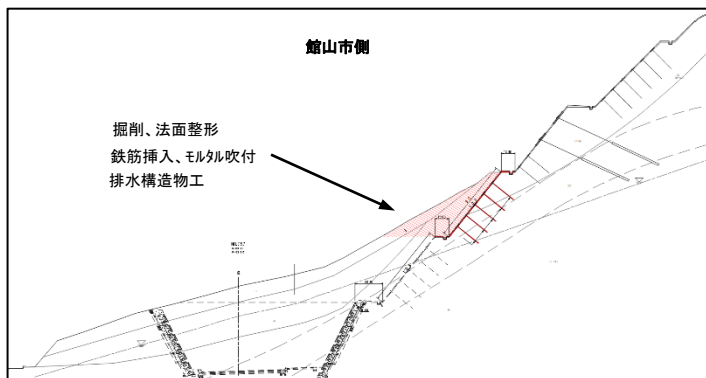

《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。）

2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施を加算点としています。

3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

企業に求める施工実績を「法面処理の方法がアンカー工を施工した工事」とせず、「法面工を施工した工事（法面工の種類は問わない）」として緩和します。

3. 余裕期間制度（任意着手方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限日（令和7年4月1日）までの期間において、受注者が工事の始期を任意に設定することができます。受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《スケジュール》

- 入札公示、入札説明書交付 : 令和7年 1月16日（木）
- 技術資料等の提出期限 : 令和7年 1月27日（月）
- 入札書・工事費内訳書の提出期限 : 令和7年 3月 4日（火）
- 開札日 : 令和7年 3月 7日（金）

千葉国道事務所ホームページ
X（旧 twitter）情報

<https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/>
https://x.com/mlit_chibakoku



ホームページ



X

公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式・企業実績評価型）の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化（個別発注時では不要）
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

