



令和7年10月17日
国土交通省関東地方整備局
宇都宮国道事務所

工事発注手続きについて

～「R7国分寺出張所交通安全対策工事」の発注手続きを行います～

宇都宮国道事務所が発注する「R7国分寺出張所交通安全対策工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R7国分寺出張所交通安全対策工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型
2. 難工事指定
3. 余裕期間制度（フレックス方式）
4. 施工箇所が点在する工事の積算
5. 競争参加資格の緩和

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 栃木県政記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 宇都宮国道事務所

電話：028-638-2181（代表） FAX：028-638-2871

E-mail：ktr-ukoku_hp@mlit.go.jp

副所長（管理） 町田（まちだ） （内線：205）

管理第二課長 末吉（すえよし） （内線：441）

《工事概要》

- (1) 工 事 名：R7国分寺出張所交通安全対策工事
- (2) 工事場所：栃木県宇都宮市平出町地区外3箇所
- (3) 工 期：全体工期 契約締結日の翌日から令和8年9月30日
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：アスファルト舗装工事 A等級又はB等級
- (6) 工事内容（概要）

【①宇都宮市平出町地区】

鋪装工

(車道部)	598m2
(歩道部)	45m2
(切削オーバーレイ)	2,240m2
(薄層カラー舗装)	299m2
排水構造物工	262m
縁石工	239m
区画線工（溶融式）	1,662m
構造物撤去工	1 式

【③結城市小田林地区】

舗装工(薄層カラー舗装) 198m2

【②下野市下坪山地区】


鋪装工

(歩道部)	14m2
(薄層カラー舗装)	114m2
縁石工	32m
区画線工(溶融式)	647m
構造物撤去工	1式

【④宇都宮市雀の宮地区】


鋪装工

（歩道部）	1,700m ²
縁石工	679m
構造物撤去工	1 式

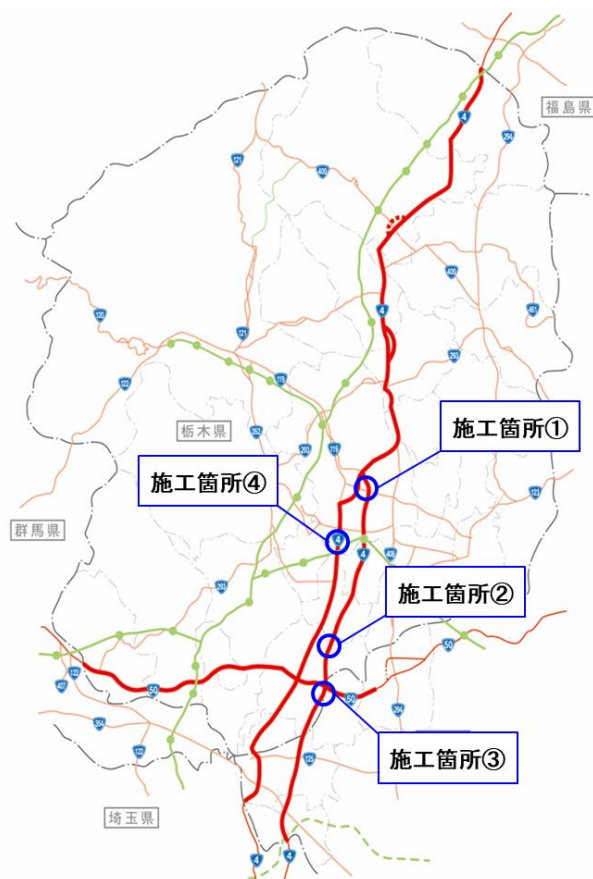


■工事概要図


【①宇都宮市平出町地区】

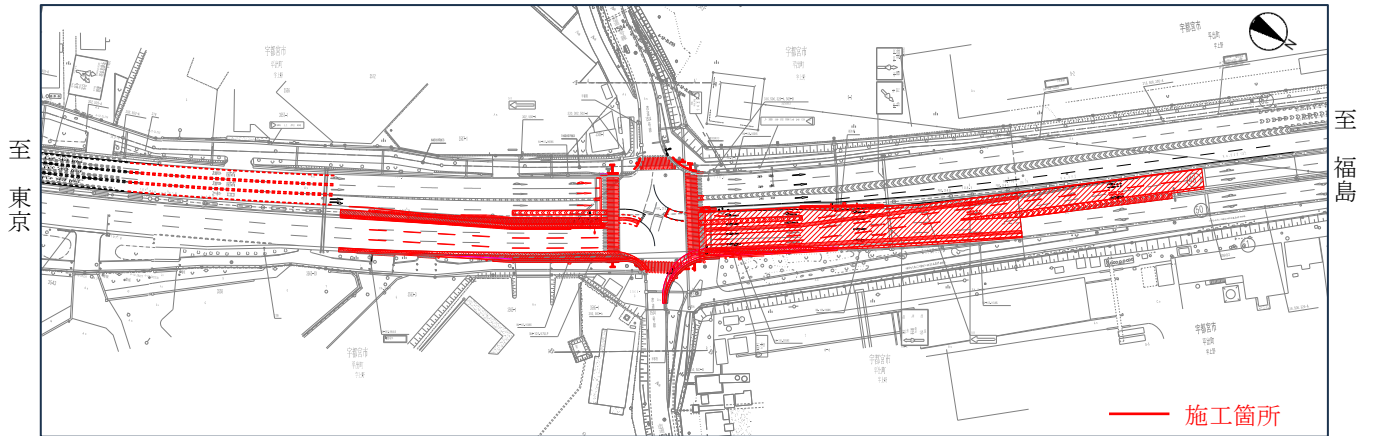


【②下野市下坪山地区】

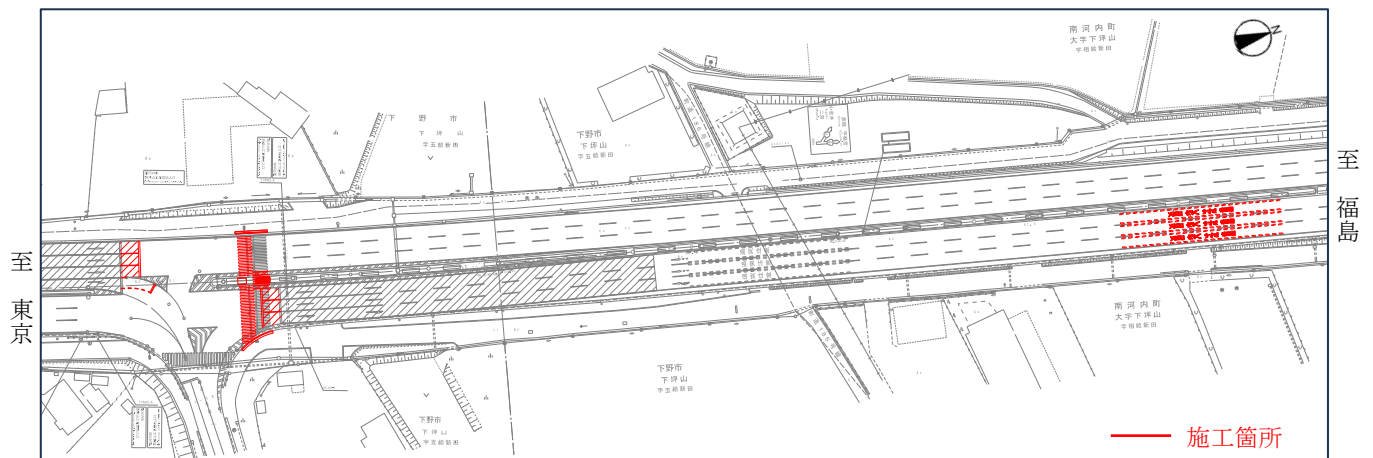

【③結城市小田林地区】

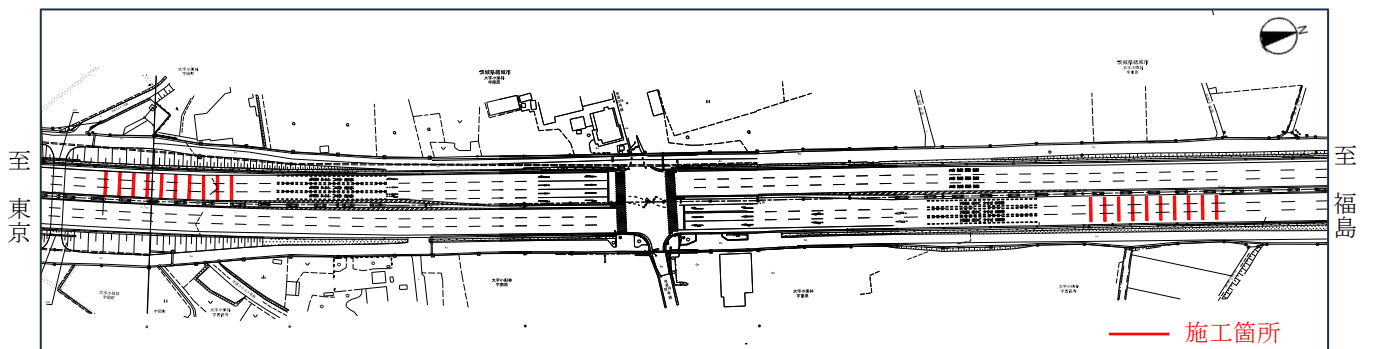

【④宇都宮市雀の宮地区】

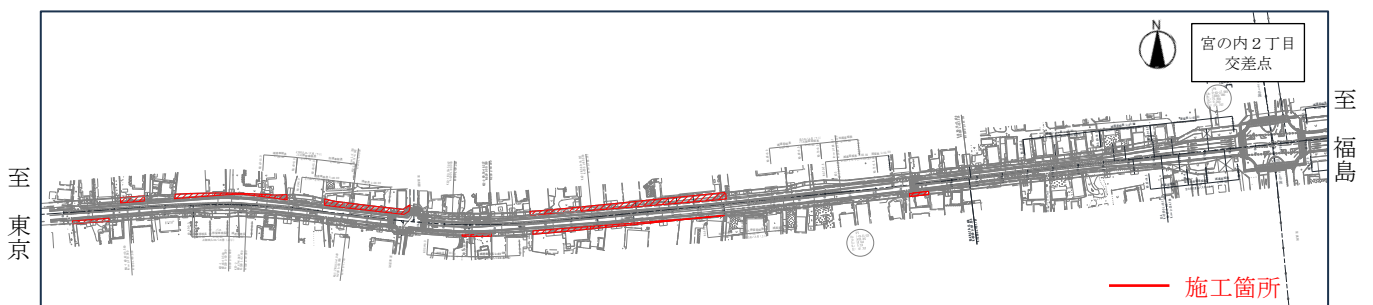

《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。）

2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。

3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 難工事指定

本工事は、交通量の多い国道4号及び新国道4号での作業となり、交通規制を行いながら車道舗装等を施工するため、厳しい施工管理が必要となることから、「難工事」の指定を実施します。

「難工事」指定された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間が評価対象となります。

3. 余裕期間制度（フレックス方式）


本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和8年9月30日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

4. 施工箇所が点在する工事の積算について

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

本工事の地区は、施工箇所①：宇都宮市平出町地区、施工箇所②：下野市下坪山地区、施工箇所③：結城市小田林地区、施工箇所④：宇都宮市雀の宮地区とし、詳細は次頁のとおりです。

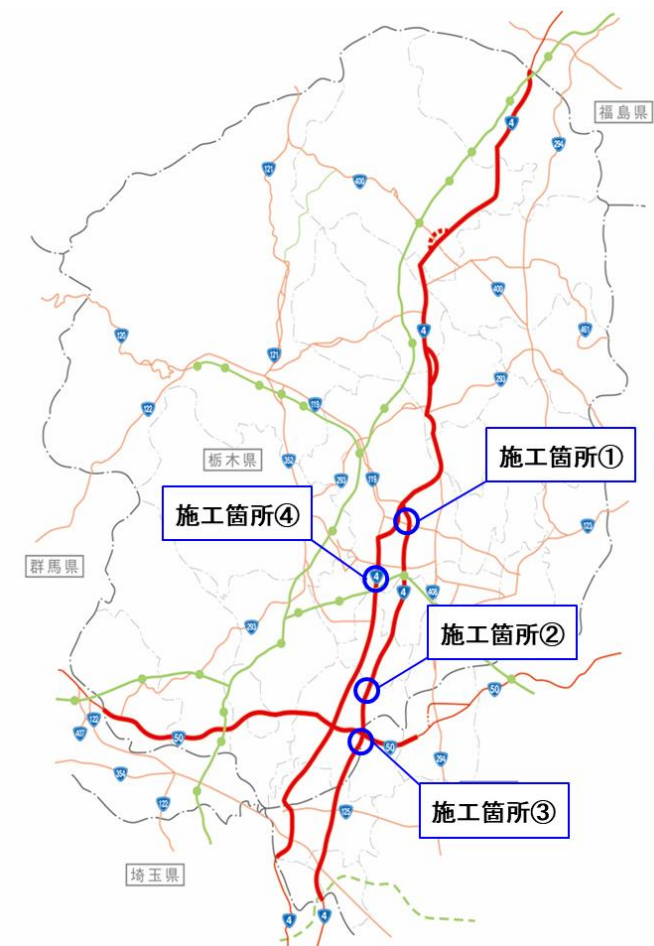

5. 競争参加資格の緩和 対象等級の拡大

競争参加者数が少数と見込まれることから、対象等級を「A 等級」から「A 等級又は B 等級」に拡大します。

《スケジュール》

○入札公示、入札説明書交付	： 令和 7 年 10 月 17 日（金）
○技術資料等の提出期限	： 令和 7 年 10 月 28 日（火）
○入札書・工事費内訳書の提出期限	： 令和 7 年 12 月 1 日（月）
○開札日	： 令和 7 年 12 月 4 日（木）

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

