

令和8年3月25日
国土交通省関東地方整備局
霞ヶ浦河川事務所

工事発注手続きについて

～「R7霞ヶ浦河川事務所管内光テレメータ設備他更新工事」の発注手続きを行います～

霞ヶ浦河川事務所が発注する「R7霞ヶ浦河川事務所管内光テレメータ設備他更新工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R7霞ヶ浦河川事務所管内光テレメータ設備他更新工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 余裕期間制度（フレックス方式）
4. 世界的な半導体不足による工期等
5. 機器単体費の提示

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、土浦記者クラブ、鹿島記者クラブ、千葉県政記者会

<問い合わせ先>

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所

電話：0299-63-2411（代表） FAX：0299-63-2498

副所長（技術） 甲田（こうだ）（内線：204）


管理課長 栗山（くりやま）（内線：331）

《工事概要》

- (1) 工事名：R7霞ヶ浦河川事務所管内光テレメータ設備他更新工事
- (2) 工事場所：霞ヶ浦河川事務所管内
- (3) 工期：全体工期 契約締結日の翌日から令和9年3月15日
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：通信設備工事
- (6) 工事内容（概要）：

光テレメータ設備	4台
IP伝送装置（インタフェース）	4枚
IP伝送装置（L2-SW）	7台
無線LANアクセスポイント	8台
機器据付・調整・撤去	1式

工事概要図

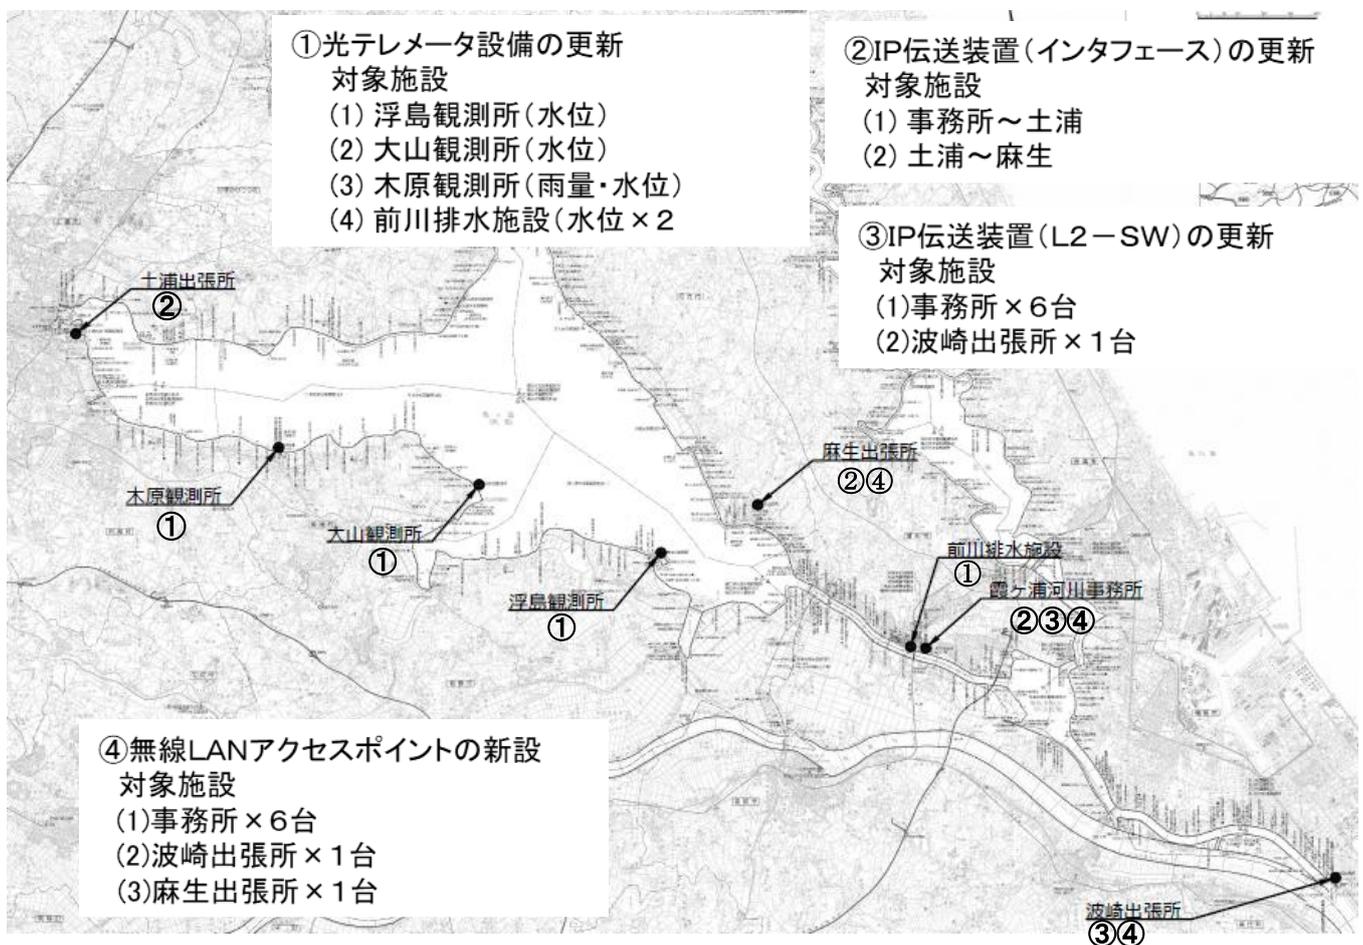

《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

- 1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)

2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。

3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「茨城県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から、地域要件を設定せずに建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

2) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績を「水位及び雨量データをセンサーから受信し外部装置に伝送する設備を設置した、工事又は製造」に限定せず、「地方整備局等競争参加資格の工事種別が通信設備工事であること。」として緩和をします。

3. 余裕期間制度（フレックス方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和9年3月15日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

4. 世界的な半導体不足による工期等

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない場合は、協議の対象にします。

5. 機器単体費の提示

本工事は、テレメータ設備及びIP伝送設備に係る機器単体費を歩掛見積参考資料に提示することを試行します。

《スケジュール》

○入札公示、入札説明書交付	：令和	8年	3月25日	(水)
○技術資料等の提出期限	：令和	8年	4月14日	(火)
○入札書・工事費内訳書の提出期限	：令和	8年	6月8日	(月)
○開札日	：令和	8年	6月11日	(木)

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

