

令和8年5月18日
国土交通省関東地方整備局
大宮国道事務所

工事発注手続きについて

～「R7小淵立体地下道照明設備他改修工事」の発注手続きを行います～

大宮国道事務所が発注する「R7小淵立体地下道照明設備他改修工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R7小淵立体地下道照明設備他改修工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 世界的な半導体不足による工期延期等
4. 材料（機器）単価の公表

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 埼玉県政記者クラブ さいたま市政記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 大宮国道事務所

電話：048-669-1200（代表） メールアドレス：ktr-oomiya-koho01@mlit.go.jp

副所長（技） 児玉（こだま） （内線：205）

交通対策課長 田子（たご） （内線：471）

《工事概要》

- (1) 工事名：R7小淵立体地下道照明設備他改修工事
- (2) 工事場所：大宮国道事務所管内
- (3) 工期：契約締結の翌日から令和9年2月26日まで
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：電気設備工事
- (6) 工事内容（概要）：

地下道照明設備設置	268台
道路照明灯設置	18基
照明器具設置	1式
配管・配線工	1式
地下道照明設備撤去	280台
道路照明灯撤去	18基
照明器具撤去	1式


■位置図



■改修対象設備



【小淵立体地下道内（地下道照明設備）】

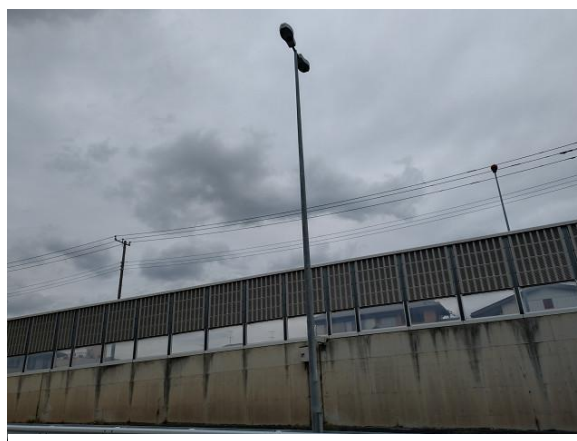

【小淵立体地下道坑口（道路照明設備）】

《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

- 1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。
(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)
- 2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。
- 3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「埼玉県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

2) 企業に求める施工実績の緩和

車道の交通規制を伴う地下道照明施設の設置工事ですが、交通規制の実績を求めず、「道路照明灯又はトンネル照明灯を設置した工事であること」として資格要件を緩和しております。

3. 世界的な半導体不足による工期延期等

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない等、工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期の延長を実施します。

4. 材料（機器）単価の公表

本工事は、地下道照明設備、道路照明設備に係る機器単体費を歩掛見積参考資料に提示することを試行します。

《スケジュール》

○入札公示、入札説明書 交付	: 令和8年 5月18日 (月)
○技術資料等の提出期限	: 令和8年 5月27日 (水)
○入札書・工事費内訳書 提出期限	: 令和8年 6月29日 (月)
○開札日	: 令和8年 7月 2日 (木)

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

