

あーるさん わみさわさがんほうかいちたいさくこうじ

「R3ワミ沢左岸崩壊地対策工事」において、「見積活用方式」、  
「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」の試行、  
「余裕期間制度の活用」を採用します。

近年の自然災害の多発に伴い技術者不足が想定されることから、今回発注する「R3ワミ沢左岸崩壊地対策工事」については、不調不落対策を試行しております。

#### ○見積活用方式

標準的な積算と乖離が予想される工種を選定し、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証のうえ、予定価格に反映する「見積活用方式」を試行します。

#### ○地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更

地域外からの労働者の確保が必要となる工事において、宿泊費や労働者の赴任手当など標準積算と実際にかかる費用に乖離が考えられるため、共通仮設費及び現場管理費の対象項目についてその妥当性を確認の上、実績変更する試行を行います。

#### ○余裕期間制度の活用(任意着手方式)

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労務者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約日から工事着手期限(令和4年4月1日)までの期間において、受注者が任意に工事着手日を選定できます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者の配置が不要となります。

## ○地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について

「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用について、設計変更の対象とします。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

構成費目		率分に含まれる主な項目
営繕費	借上費	建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用
	宿泊費	労働者が、旅館・ホテル等に宿泊した場合に要した費用
	労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送するために要した費用
現場管理費	労務管理費	募集・解散費、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

## ■「R3ワミ沢左岸崩壊地対策工事」スケジュール

入札公告、入札説明書交付 : 令和 4年 2月 4日 (金)

競争参加確認申請書、見積書提出期限 : 令和 4年 2月21日 (月)

入札書・工事費内訳書提出期限 : 令和 4年 3月11日 (金)

開札 : 令和 4年 3月16日 (水)

## 《工事概要》

(1) 工 事 名：R3ワミ沢左岸崩壊地対策工事

(2) 工事場所：栃木県日光市上栗山地先

(3) 工 期：工事の始期から272日間

(但し、令和4年4月1日（工事着手期限）までに工事を開始すること）

(4) 入札方式：一般競争入札方式

総合評価方式：「施工能力評価型Ⅱ型」「地域密着型」

(5) 工事種別：法面処理工事

(6) 工事内容（概要）：	斜面对策工	1式
	砂防土工	1式
	法面工	1式
	密着型厚ネット	約2,500m <sup>2</sup>
	仮設工	1式


## 《見積活用方式》

### 見積の提出を求める工程

直接工事費の「砂防土工」「法面工」「仮設工」のうち、対象とする細別に係わるもの。

見積書は、公告資料にある見積依頼書に従い提出を求めるものとします。

## ■平面図

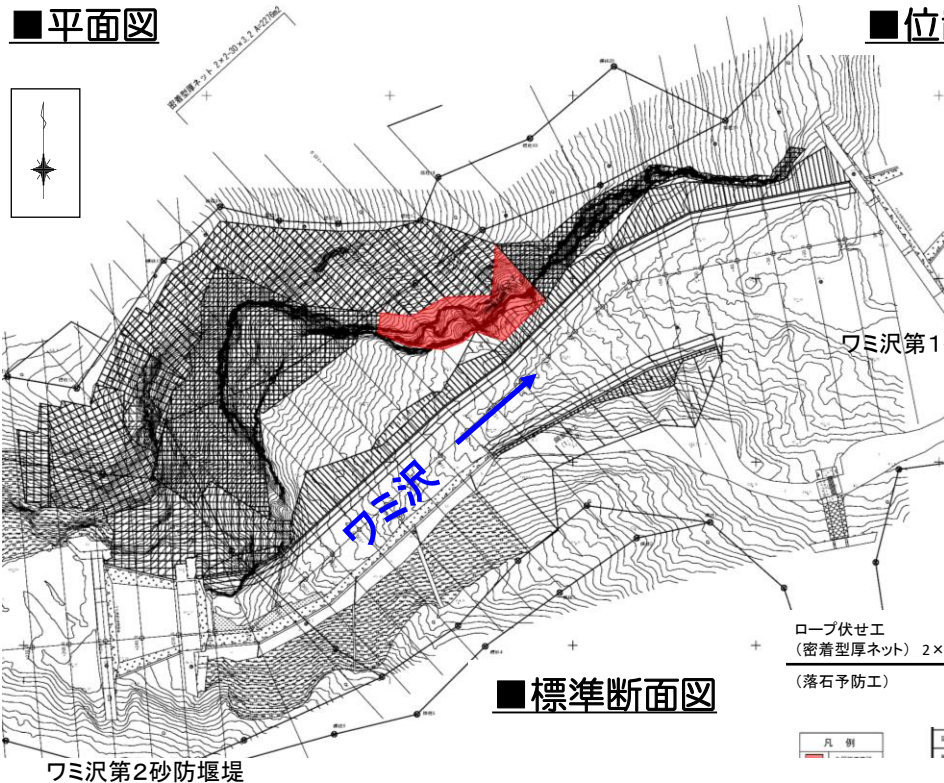

## ■位置図



## ■標準断面図

