

記者発表資料

でがわ とこがためぐん こうじ
R3出川床固群工事

まつきがわ じょうりゅうこうじょう どうろ こうじ
R3松木川上流工事用道路工事

において、以下の取り組みを試行します。

- 見積活用方式
- 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更
- 遠隔地からの建設資材調達に係わる設計変更
- 余裕期間制度（フレックス方式）

今回発注する「R3出川床固群工事」、「R3松木川上流工事用道路工事」（令和4年3月4日公告）では、より多くの企業に参加いただきたく、以下の取り組みを試行しておりますので、ご紹介します。

- ① 「見積活用方式」の試行
- ② 「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」の試行
- ③ 「遠隔地からの建設資材調達に係わる設計変更」の試行
- ④ 「余裕期間制度（フレックス方式）」の試行

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会
栃木県政記者クラブ 刀水クラブ・テレビ記者会（群馬県）

お問合せ先

国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所

住所：栃木県足利市田中町661-3

電話：0284-73-5551（代）

副所長（砂防）：ねづ あきら 根津 昭 内線：205

建設専門官：すどう としお 須藤 利夫 内線：206

①「見積活用方式」の試行

個別の現場条件が反映しきれない、実勢価格の変化が著しいなど標準積算との乖離が生じると考えられる項目について見積もりを求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反映します。

主な見積もり活用工種

- R3出川床固群工事
 - コンクリート擁壁工（コンクリート）
 - 帯工（コンクリート）
- R3松木川上流工事用道路工事
 - コンクリート舗装工（コンクリート）
 - 流路護岸工（コンクリート）

②「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」の試行

「共有仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用について、妥当性を検証の上、設計変更の対象とします。

営繕費：借上費、宿泊費、労働者送迎費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

構成費目		率分に含まれる主な項目
営繕費	借上費	建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用等
	宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用
	労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送するために要した費用
現場管理費	労務管理費	募集・解散費、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

③「遠隔地からの建設資材調達に係わる設計変更」の試行

工事現場が所在する地区において建設資材の需要ひっ迫が生じ、遠隔地から調達せざるを得ない場合には、購入費用、輸送費について妥当性を検証の上、設計変更の対象とします。

④「余裕期間制度（フレックス方式）」の試行

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

R3出川床固群工事


《工事概要》

- (1) 工事場所：栃木県日光市足尾地先
- (2) 全体工期：契約締結の翌日から令和5年3月31日まで
 < 余裕期間制度（フレックス方式） >
- (3) 入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）
- (4) 工事種別：一般土木工事C
- (5) 工事内容（概要）：

流路工	1式	
砂防土工	1式	
法面整形工	1式	
残土処理工	1式	
流路護岸工	1式	
作業土工	1式	
コンクリート擁壁工	約890m ³	※見積活用工種
第7帯工	約90m ³	※見積活用工種
第8帯工	約80m ³	※見積活用工種
仮設工	1式	
工事用道路工	1式	
土留・仮締切工	1式	
水替工	1式	
仮水路工	1式	

《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書交付：令和4年3月 4日（金）
- 技術資料等の提出期限：令和4年3月18日（金）
- 入札書・工事費内訳書提出期限：令和4年4月15日（金）
- 開札日：令和4年4月20日（水）

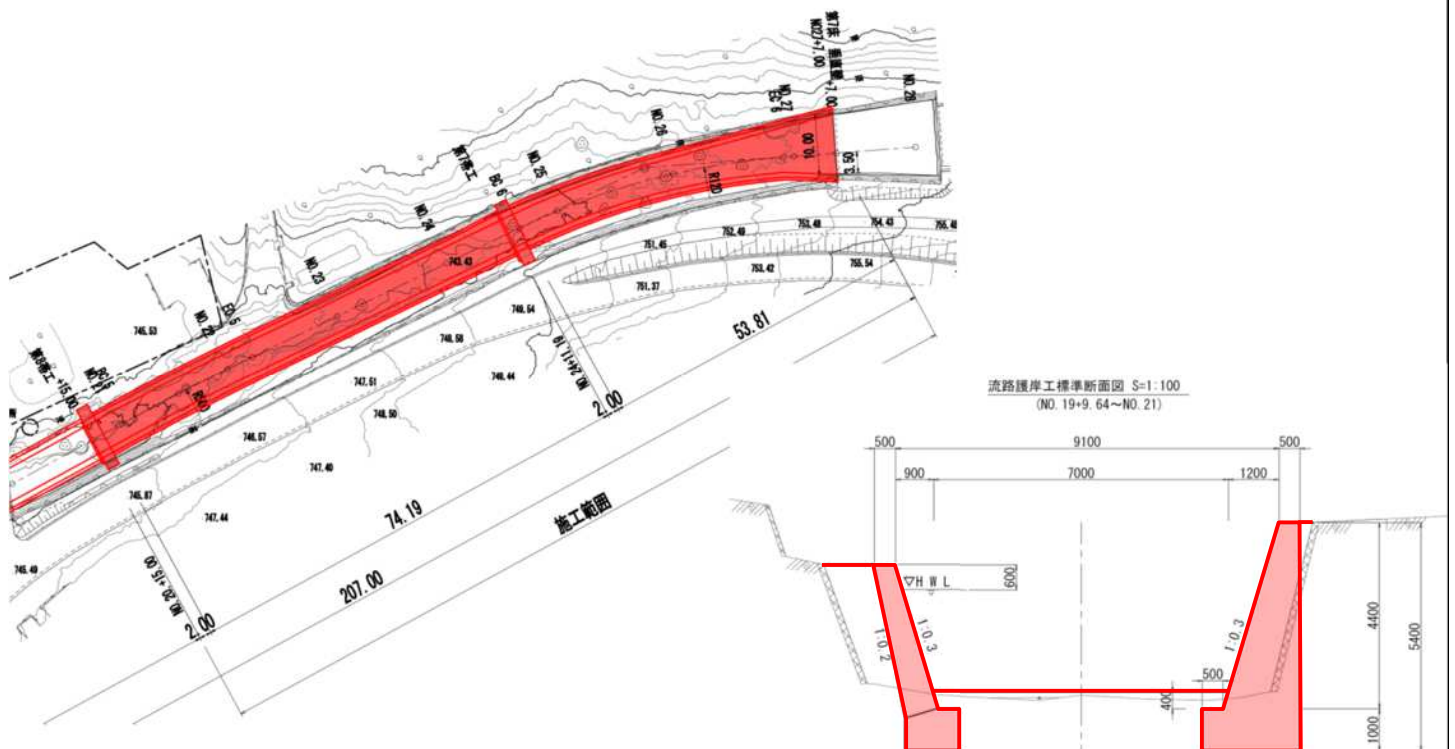

R3松木川上流工事用道路工事


《工事概要》

- (1) 工事場所：栃木県日光市足尾地先
- (2) 全体工期：契約締結の翌日から令和5年3月31日まで
 < 余裕期間制度（フレックス方式） >
- (3) 入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）
- (4) 工事種別：一般土木工事C
- (5) 工事内容（概要）：

流路工	1式	
砂防土工	1式	
法面工	1式	
コンクリート舗装	約400m ²	※見積活用工種
流路護岸工	約100m	※見積活用工種
擦付道路工	1式	
仮設工	1式	
水替工	1式	
防護施設工	1式	

《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書交付：令和4年3月 4日（金）
- 技術資料等の提出期限：令和4年3月18日（金）
- 入札書・工事費内訳書提出期限：令和4年4月15日（金）
- 開札日：令和4年4月20日（水）

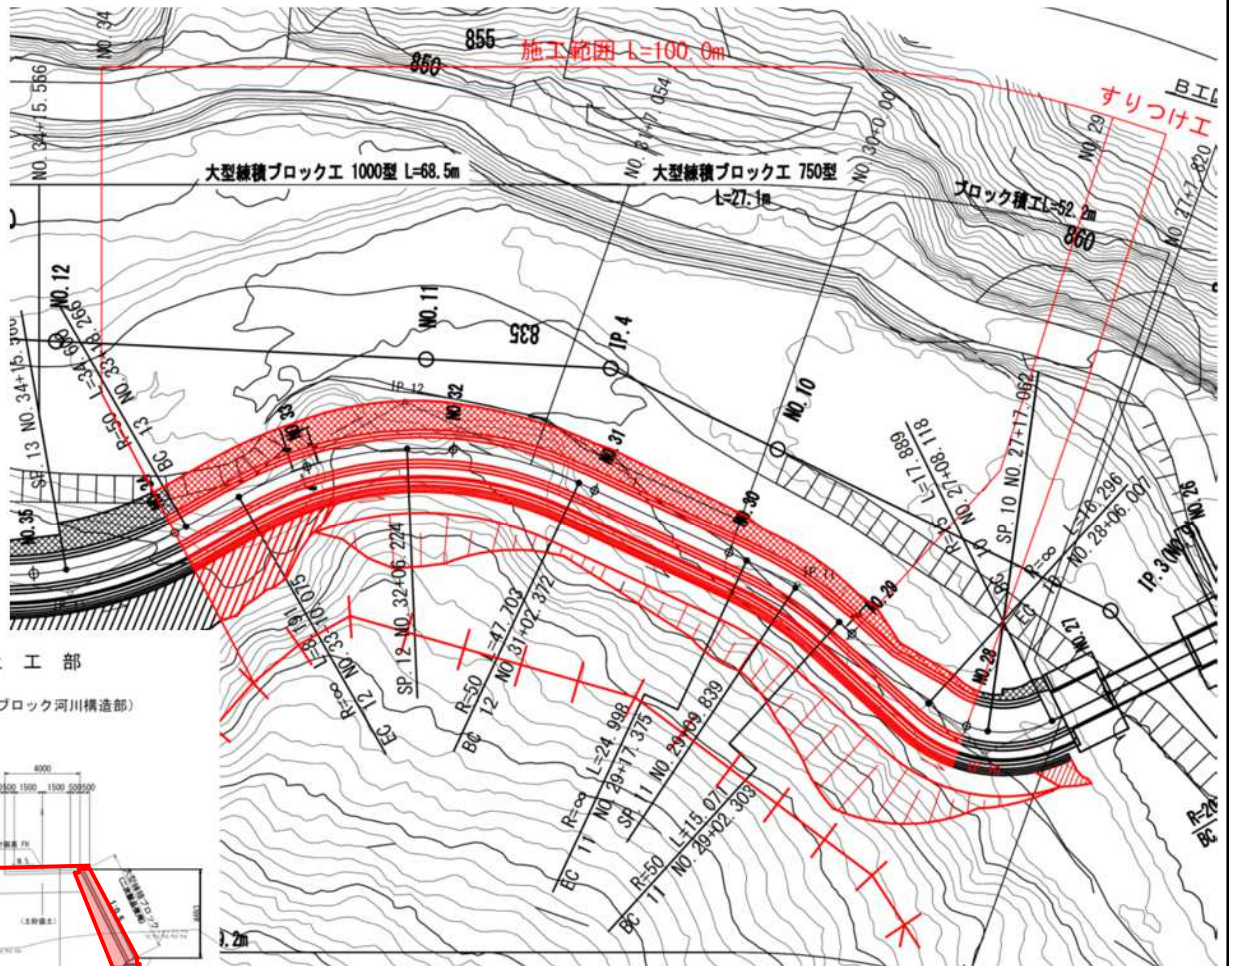

概略工事工程表

OR3出川床固群工事

【見積参考資料】概略工事工程表

工事名：R3出川床固群工事

【令和4年度】

費目・工種	数量	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			備考
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30				
流路	1式																																					
準備工	1式																																					30日間
流路護岸工	1式																																					1pt
第3帯工	1式																																					1pt
第4帯工	1式																																					1pt
仮設工	1式																																					1pt
後片付け	1式																																					20日間
共通仮設費	1式																																					
制約条件	夏期休暇 年末年始	-																																		8月中旬 12月下旬～1月上旬		
	出水期間	-																																		6月1日～10月31日		

<関係機関協議>

工事着手にあたっての関係機関協議、地元説明は、発注者が主体となって実施してあります。

OR3松木川上流工事用道路工事

【見積参考資料】概略工事工程表

工事名：R3松木川上流工事用道路工事

【令和4年度】

費目・工種	数量	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			備考
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30				
準備工	1式																																					30日間
砂防土工	1式																																					1パーティー
法面工	1式																																					1パーティー
流路護岸工	1式																																					1パーティー
舗装工	1式																																					1パーティー
仮設工	1式																																					1パーティー
後片付け	1式																																					20日間
共通仮設費	1式																																					
制約条件	年末年始	-																																		12月下旬～1月上旬		
	出水期間	-																																		6月1日～10月31日		

<関係機関協議>

工事着手にあたっての関係機関協議、地元説明は、発注者が主体となって実施してあります。
