

令和4年5月12日（木）
国土交通省関東地方整備局
下館河川事務所

記者発表資料

R4小貝川左岸道畑樋管撤去工事

において「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」、「余裕期間制度」、「生産性向上チャレンジ工事」を試行します。

今回発注する「R4小貝川左岸道畑樋管撤去工事」においては、より多くの企業に参加いただくため、次の①、②、③の取り組みを試行しておりますので、ご紹介します。

- ①「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」
【参加申請時に技術者要件を求めない】
- ②「余裕期間制度」 【フレキシブルな施工体制の確保】
- ③「生産性向上チャレンジ工事」 【生産性向上】

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ
筑西市記者クラブ、宇都宮市政記者クラブ、筑波研究学園都市記者会

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所

電話0296-25-2161（代表）

副所長 おかど まさとし 工務課長 むらやま はじめ
岡戸 昌利 村山 啓

《工事概要》

(1) R4小貝川左岸道畑樋管撤去工事

- 1) 工事種別：一般土木工事 C等級
- 2) 工事場所：茨城県つくばみらい市鬼長地先
- 3) 工期：契約の翌日から令和6年3月20日まで
- 4) 工事内容：

・盛土工	約4,600m ³
・連節ブロック張	約1,050m ²
・矢板工	約40枚
・根固めブロック工	約230個
・コンクリート構造物取り壊し	約260m ³




《工事概要》

(2) その他項目

- 本工事の資格要件は、河川工事となります。
- 根固め製作に当たっては、製作ヤードとして川表高水敷の使用を想定しています。
- 施工箇所及び根固め製作ヤードの用地は、取得済みです。
- 施工箇所と近隣の家屋等は近接していないため、家屋調査等は不要であり、契約後直ちに着手出来ます。
- 本工事は、根固めブロックの製作については、出水期間中(6月1日～10月31日)の施工が可能です。

施工範囲イメージ

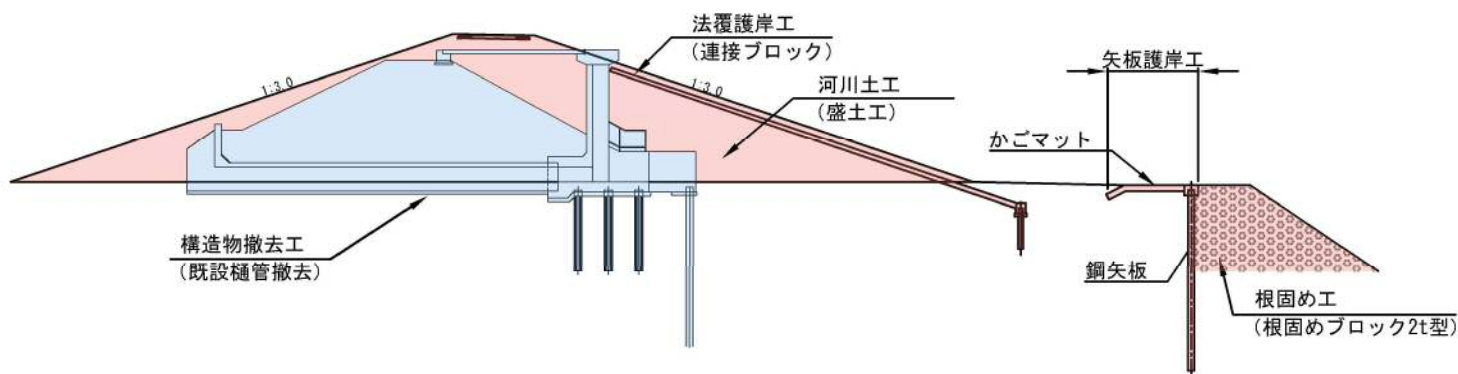

概略工事工程表																	
工事名：R4小貝川左岸道畑樋管撤去工事																	
工 種		単位	数量										令和5年度			備 考	
				7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
準備工		式	1	余裕期間 ※任意で 設定可能												・40日間	
河川土工		式	1														掘削工(1pt) 盛土工(1pt)
矢板護岸工		式	1														(1pt)
法覆護岸工		式	1														・コンクリートブロック工(1pt) ・養生工(1pt)
根固め工		式	1														(1pt)
付帯道路工		式	1														・側溝工(1pt) ・舗装工(1pt) ・縁石工(1pt)
構造物撤去工		式	1														(1pt)
仮設工		式	1														(1pt)
後片付け		式	1													・20日間	
制 約 条 件	関係機関協議																
	地元合意																
	年末年始・GW															・8月上旬～8月中旬 ・12月下旬～1月上旬	
	出水期間															・6月1日～10月31日	
《余裕期間制度（フレックス）の活用について》 本工事は、受注者の円滑な工事施行体制の確保を図るため、事前に建築資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）の中で、受注者は工事の始期と終期を任意に設定することができます。 なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者等の配置が不要となります。																	

《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）の試行について》

競争参加者が少数と見込まれる対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。

なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

《余裕期間制度について》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《生産性向上チャレンジ工事について》

本取組を実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、取組の内容、期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとします。また、期待される効果等については、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとします。

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行います。

《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書の交付 ：令和4年5月12日（木）
- 参加表明書確認申請書等の提出期限 ：令和4年5月23日（月）
- 入札書、工事費内訳書の提出期限 ：令和4年6月17日（金）
- 開札日 ：令和4年6月22日（水）

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について

