令和4年6月9日(木) 国土交通省関東地方整備局 道

# 記者発表資料

# 「R4千葉国道道路情報表示板設備改修工事」

「R4千葉国道管内CCTV設備設置工事」において 「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」等を 試行します。

工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札・契約 手続きのとりやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を試行して います。

今回発注する「R4千葉国道道路情報表示設備改修工事」、「R4千葉国道 管内CCTV設備設置工事」については、以下のとおり試行、採用します。

- ①「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」
- ②「施工箇所が点在する工事の積算」
- ③「余裕期間制度(フレックス方式)」
- 4 「配置予定技術者の専任を要しない期間」
- ⑤「機器単体費の提示」
- ⑥「難工事指定について」
- ⑦「世界的な半導体不足による工期延期等について」
- ※詳細は、次ページをご覧ください。

■公式ツイッター情報

■千葉国道事務所ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/ https://twitter.com/mlit\_chibakoku





### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、千葉県政記者会

#### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所

> 043-287-0311(代表) 電話

はらだ かつとし 防災情報課長 副所長 茅根

# 《公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について》

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料(参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。)を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

# 《施工箇所が点在する工事の積算について》

施工箇所が点在する工事について、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を適用します。

### 《余裕期間制度(フレックス方式)について》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和5年3月24日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

#### 《配置予定技術者の専任を要しない期間について》

本工事は、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資器材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、競争参加資格確認申請書の配置予定主任(監理)技術者の専任を要しないものです。

# 《機器単体費の提示について》

道路情報表示設備(表示制御装置及び表示板)に係わる機器単体費を歩掛見積参考資料に掲示します。

# 《難工事指定について》

「難工事」指定された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事(試行)」の総合評価の評価項目において加点対象となります。また、加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の1年間に元請けとして、完成・引き渡しが完了した施工実績が加点対象となります。

また、主任(監理)技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の 月以前の4年間を評価対象となります。

# 《世界的な半導体不足による工期延期等について》

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない等、工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期延期を実施します。

#### 《その他》

本工事で求める企業への施工実績は、関東地方整備局管内と限定せず、地域要件を緩和しております。

### 《工事概要》

(1) 工事名 :R4千葉国道道路情報表示設備改修工事

(1) エ 尹 ロ : 1.1.1.2 (2) 工事場所 : 千葉県富津市金谷地先 外 1 箇所 (3) エ 期 : 契約締結の翌日から令和5年3月31日まで


余裕期間制度(フレックス方式)

: 公募型指名競争入札方式 (総合評価落札方式) (4)入札方式


(5)工事種別 :通信設備工事

(6) 工事内容(概要): • 表示制御装置 2台

2台 • 表示板

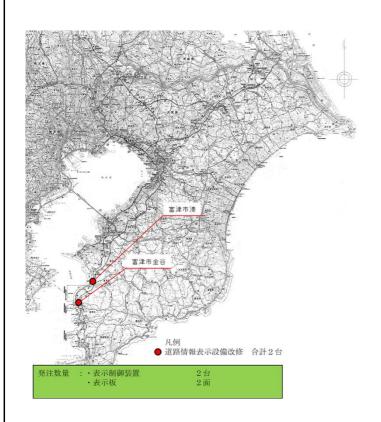





《スケジュール》

〇入札公示、入札説明書 交付 :令和4年6月 9日(木)

〇競争参加資格確認申請書 提出期限 : 令和4年6月20日(月)

: 令和4年7月25日(月) 〇入札書・工事費内訳書 提出期限

: 令和4年7月28日(木) 〇開札日

### 《工事概要》

(1) 工事名: R4千葉国道管内CCTV設備設置工事(2) 工事場所: 千葉県千葉市美浜区若葉地先 外3箇所(3) 工期: 契約締結の翌日から令和5年3月31日まで

余裕期間制度(フレックス方式)


(4)入札方式 (5)工事種別 : 公募型指名競争入札方式 (総合評価落札方式)

:通信設備工事


(6) 工事内容(概要): • CCTV制御装置 1台

> • CCTVカメラ装置 5台 • 伝送装置 5台

> • 無停電電源装置 5台

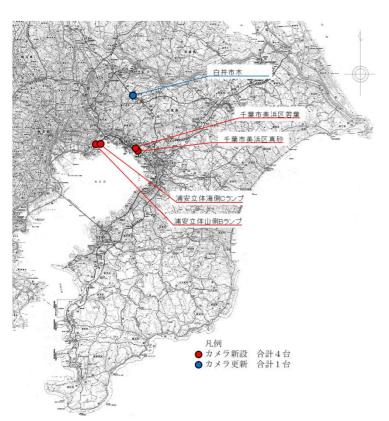





CCTV設備新設箇所一覧表

路線	上下	距離標 (kp)	カメラ名称	所在地	カメラ種別	監視項目	備考
16	下	142.6	柏·白井市境	白井市木地先	HD簡易型 IP	路面凍結	
357	上	1.7	真砂(上り)	千葉市美浜区真砂地先	HD簡易型 IP	緊急輸送道路	
357	Ŀ	2.2	若葉(上り)	千葉市美浜区若葉地先	HD簡易型 IP	緊急輸送道路	
357	下	18.5	浦安海側Cランブ入口	浦安市美浜地先	HD簡易型 IP	緊急輸送道路	
357	上	18.7	浦安山側8ランプ入口	浦安市美浜地先	HD簡易型 IP	緊急輸送道路	

《スケジュール》

〇入札公示、入札説明書 交付

〇競争参加資格確認申請書 提出期限

○入札書・工事費内訳書 提出期限

○開札日

: 令和4年6月 9日(木)

: 令和4年6月20日(月)


: 令和4年7月25日(月)

: 令和4年7月28日(木)

# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について

対象は 一般土木 C,B+C工事 維持修繕等

公示(工事内容·入札時期·落札方式等



【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- / 資料は参加希望の意思確認時のみの提出 →資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
  - →指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ 指名競争・総合評価落札方式

→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

落札方式の手続き以降は指名競争・総合評価

指名基準による選定

 $\Rightarrow$ 

発注(指名通知)

指名競争・総合評価落札方式により落札決定

(標準点100点+加算点(11点)+施工体制評価点(30点))÷入札価格=評価値 ※加算点は災害活動実績+賃上げの実施 」に関する評価

公募による企業の参加

公募結果に基づく指名

災害協定の締結や活動に 係るインセンティブの向上
