

令和4年6月15日（水）  
国土交通省 関東地方整備局  
鬼怒川ダム統合管理事務所

## 記 者 発 表 資 料

「R3五十里ダム下流護床工補修工事」において、  
『公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）』  
『余裕期間制度（フレックス方式）』 『難工事指定』を試行します。

工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札・契約手続きの取りやめや不調が予測される工事について、不調・不落対策を試行しております。

今回発注する「R3五十里ダム下流護床工補修工事」では、以下の①、②、③を試行します。

### ① 『公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）』

競争参加者が少数と見込まれるとともに技術的難易度が比較的低い工事において試行するもので、特徴は次のとおりです。

- 1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。  
(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません)
- 2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業の同種工事の施工実績と災害活動実績のみです。
- 3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

### ② 『余裕期間制度（フレックス方式）』

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約締結の翌日から令和5年3月10日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できます。なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しません。

### ③ 『難工事指定』



本工事は、工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事(試行)」を加算対象とする「難工事指定」を採用します。「難工事指定」された工事は、完成時に70点以上の工事成績を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事(試行)」の総合評価の評価項目において加算対象となります。また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間の評価対象となります。

発表記者クラブ
竹芝記者クラブ／神奈川建設記者会／栃木県政記者クラブ 宇都宮市役所記者クラブ／日光記者クラブ
問い合わせ先
国土交通省 関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所 副所長 たての さとる 管理課長 なかざわ たかひろ 館野 悟                                中澤 高廣 住 所 栃木県宇都宮市平出工業団地14-3 電 話：028-661-1341（代表）


《工事概要》

- (1) 工 事 名 : R3五十里ダム下流護床工補修工事
- (2) 工事場所 : 栃木県日光市川治温泉川治地先
- (3) 全体工期 : 契約締結の翌日から令和5年3月10日まで(予定)
- (4) 競争参加資格
  - 1) 対象業者 : R3・4関東地方整備局一般競争参加資格認定(工事種別 : 維持修繕)
  - 2) 同種工事の施工実績 : ダム又は河川における維持修繕工事の施工実績を有すること。
- (5) 工事内容 (概要)
 

根固め工	1式
構造物撤去工	1式
仮設工	1式

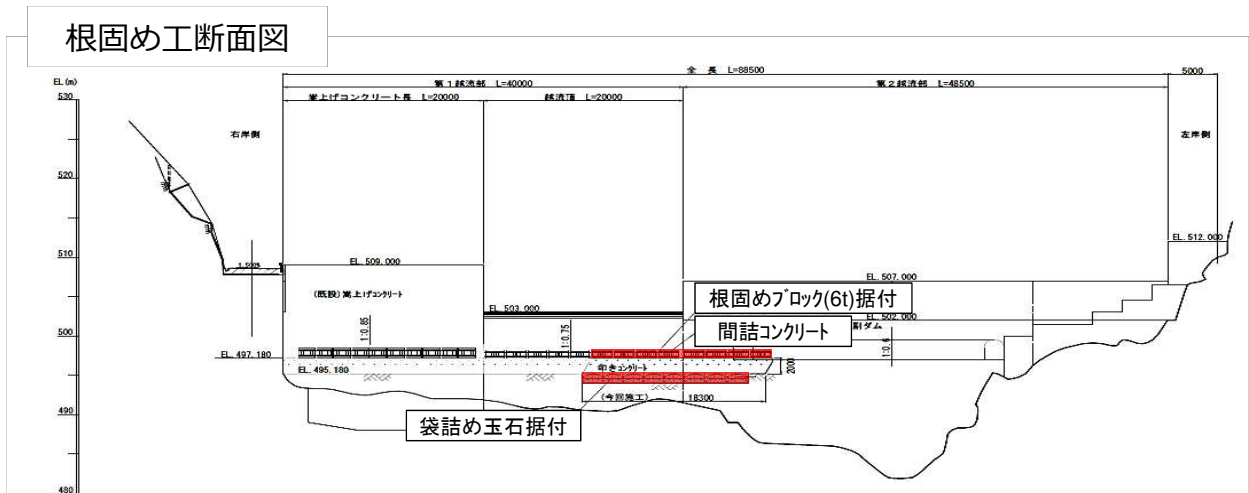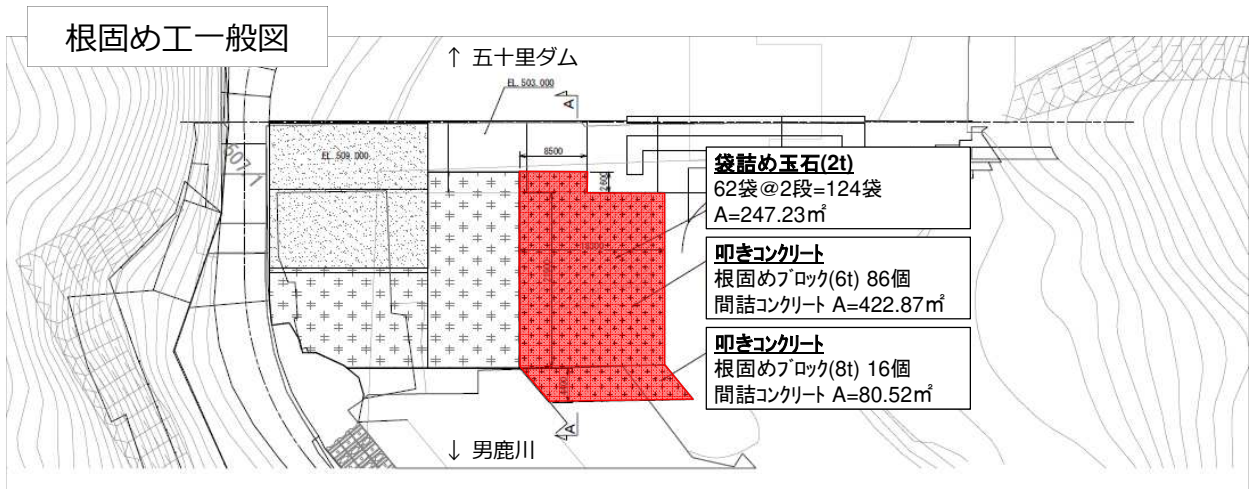

《工事概要》

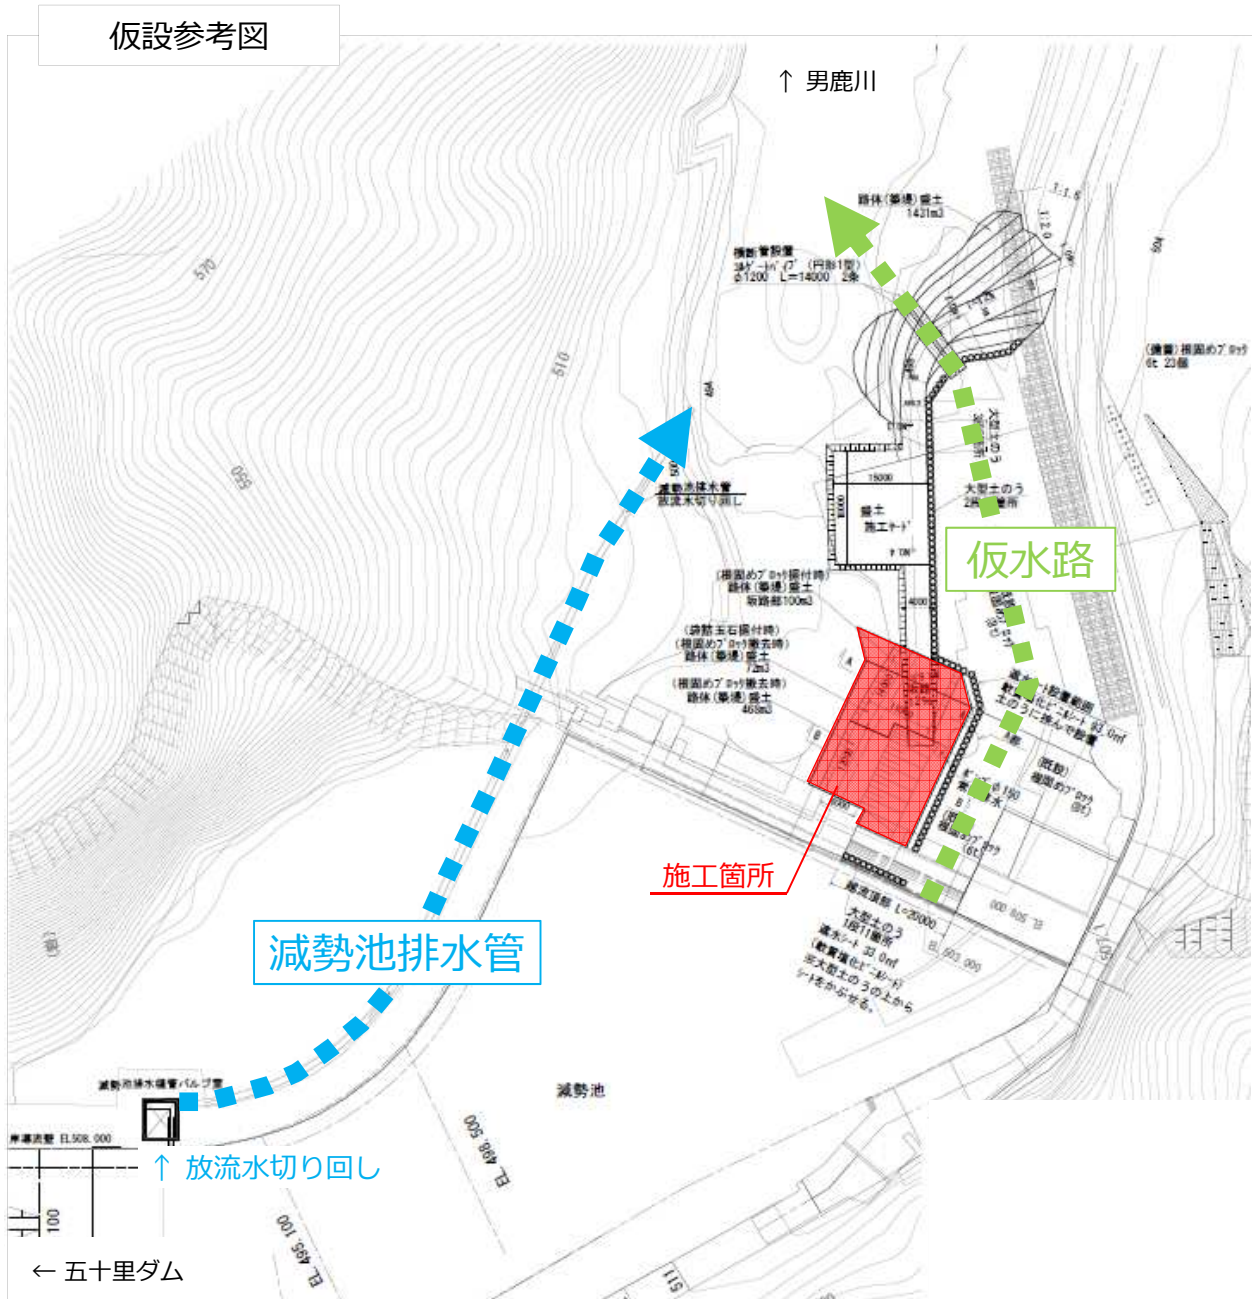

工事期間中（12～3月）のダム放流水は、「減勢池排水管」により施工箇所下流へ切り回しが可能です。ただし、季節外れの出水対応や用水補給など不測の事態の備えとして、仮水路の設置を計画しています。なお、公告資料（特記仕様書等）の条件が変更になった場合は、設計変更の対象とし、監督職員と協議してください。

《スケジュール》

入札公告、入札説明書交付	令和4年6月15日（水）
技術資料等の提出期限	令和4年6月27日（月）
入札書・工事費内訳書提出期限	令和4年7月22日（金）
開札日	令和4年7月27日（水）

# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について


対象は  
一般土木  
C,B+C工事  
維持修繕等

## 【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出  
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮  
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **指名競争・総合評価落札方式**  
→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上


**公示**

(工事内容・入札時期・落札方式等)



工事参加希望の意思確認・技術資料の提出

(参加意思表明申請書+必要資料の提出)



参加要件は企業とし、  
技術者要件は求めない

指名基準による選定



**発注(指名通知)**

以降は指名競争・総合評価  
落札方式の手続き



指名競争・総合評価落札方式により落札決定

(標準点100点+加算点(11点)+施工体制  
評価点(30点))÷入札価格=評価値  
※加算点は災害活動実績+賃上げの実施  
に関する評価

公募による企業の参加

公募結果に基づく指名  
(4/5)

災害協定の締結や活動に  
係るインセンティブの向上



# 概略工事工程表

## R3五十里ダム下流護床工補修工事

工種	単位	数量	令和 4年					令和 5年			備考			
			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月	
準備工	式	1												・40日間
仮設工	式	1												工事用道路設置・撤去等(1PT) ・50日間
構造物撤去工	式	1												根固めブロック・かごマット撤去(1PT) ・10日間
根固め工	式	1												床掘・叩きコン・ブロック据付・間詰コン(1PT) ・55日間
後片付け	式	1												・20日間
制 約 条 件	お盆、年末年始	—												お盆:8月中旬 年末年始:12月下旬~1月上旬
	出水期間	6.1-10.31												
	五十里ダム環境放流	—			●	●	●	●					●	放流日:8月26日・9月16日・10月21日・11月4日・3月10日
	夏季制限水位	6.15-9.30												

### 《余裕期間制度(フレックス方式)の活用について》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者があらかじめ設定した全体工期(余裕期間と工期を合わせた期間)の内で、受注者は工事の始期と終期を任意に設定することができます。  
なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者等を設置することを要しません。
