



令和4年8月19日（金）
国土交通省関東地方整備局
利根川ダム統合管理事務所

記者発表資料

R4藤原ダム管理用通路他整備工事において、「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」を試行します。併せて「余裕期間制度（フレックス）」 「難工事指定」を採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。

今回発注する「R4藤原ダム管理用通路他整備工事」においては、「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」、「余裕期間制度（フレックス）」、「難工事指定」を試行・採用します。

①「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」の試行

競争参加者が少数と見込まれる工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件は求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。

なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施を加算点としています。

②「余裕期間制度（フレックス）」

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定する制度です。

③「難工事指定」

工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事（試行）」を加算対象とする「難工事指定」を採用します。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、刀水クラブ・テレビ記者会



問い合わせ先

所属	国土交通省 関東地方整備局	利根川ダム統合管理事務所
氏名	副所長（技） 管理課長	<small>くろいわ ひさかず</small> 黒岩 久一 （内線741-204） <small>ふしみ かずのり</small> 伏見 一徳 （内線741-331）
電話	027-251-2021（代表） FAX 027-251-7229	

《工事概要》

- (1) 工事名 : R4藤原ダム管理用通路他整備工事
- (2) 工事場所 : 群馬県利根郡みなかみ町夜後^{よこ}地先
- (3) 全体工期 : 契約締結の翌日から令和5年6月30日まで
余裕期間制度（フレックス方式）
- (4) 入札方式 : 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (5) 工事種別 : 維持修繕工事
- (6) 工事内容 :

・道路土工	1式
・石・ブロック積（張）工	約400m ²
・舗装工	約1,300m ²
・排水構造物工	約180m
・落石雪害防止工	約60m
・防護柵工	約350m

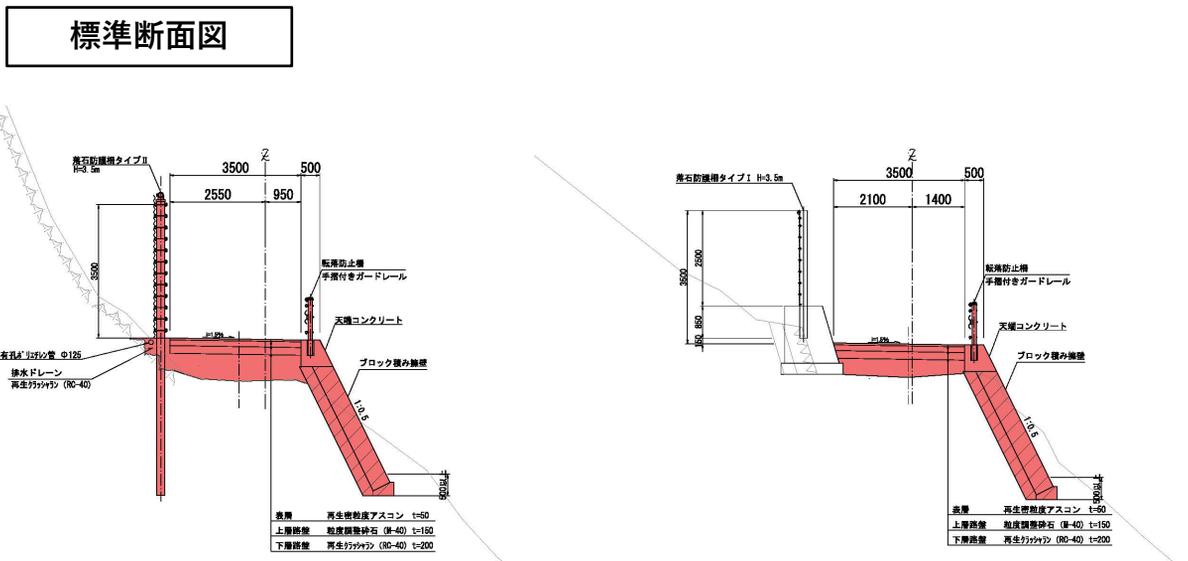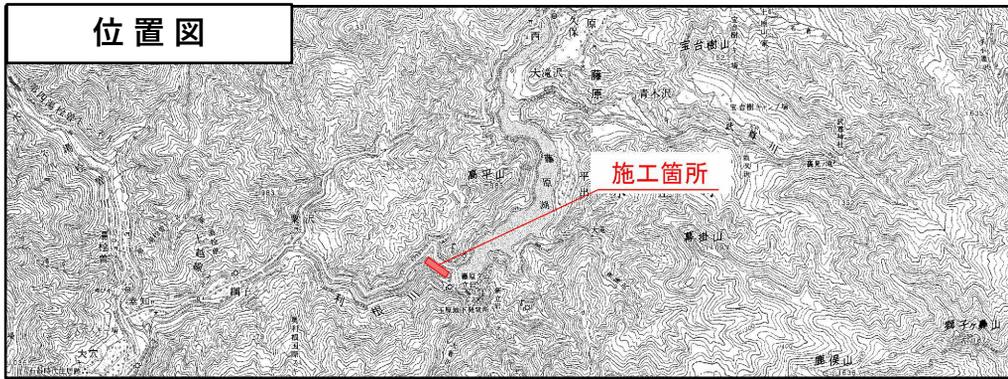

《余裕期間制度（フレックス）の試行について》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、令和5年6月30日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工期の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《難工事指定について》

本工事は、山間部の急峻な箇所での作業であり、厳しい施工条件となるため、「難工事」指定を採用します。

「難工事」指定された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。また、加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の1年間に元請けとして、完成・引き渡し完了した施工実績が加点対象となります。

また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間を評価対象となります。

《スケジュール》

- 入札公示、入札説明書 交付 : 令和4年 8月19日（金）
- 技術資料等 提出期限 : 令和4年 8月30日（火）
- 入札書・工事費内訳書 提出期限 : 令和4年 9月27日（火）
- 開札日 : 令和4年 9月30日（金）

概略工事工程表

工事名 : R4藤原ダム管理用通路他整備工事

工種	単位	数量	令和4年度					令和5年度			備考	
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		6月
準備工	式	1										・40日間
道路土工	式	1										・1パーティ
石・ブロック積(張)工	式	1										・1パーティ
舗装工	式	1										・1パーティ
排水構造物工	式	1										・1パーティ
落石雪害防止工	式	1										・1パーティ
防護削工	式	1										・1パーティ
後片付け	式	1										・20日間
制約条件	年末年始	-										・12月下旬～1月上旬(6日間) ・8月中旬(3日間)

＜余裕期間制度（フレックス）の活用について＞

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建築資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）の内で、受注者は工事の始期と終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者等の配置が不要となります。

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ 指名競争・総合評価落札方式
→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

公示(工事内容・入札時期・落札方式等)

工事参加希望の意思確認・技術資料の提出
(参加意思表明申請書+必要資料の提出)

参加要件は企業とし、
技術者要件は求めない

指名基準による選定

発注(指名通知)
以降は指名競争・総合評価
落札方式の手続き

指名競争・総合評価落札方式により落札決定

(標準点100点+加算点(11点)+施工体制
評価点(30点))÷入札価格=評価値
※加算点は災害活動実績+賃上げの実施
に関する評価

公募による企業の参加

公募結果に基づく指名

災害協定の締結や活動に
係るインセンティブの向上
