



令和4年9月8日（木）  
国土交通省関東地方整備局  
江戸川河川事務所

## お知らせ

R4・5玉葉橋取付道路鍋小路地先道路改良工事において、「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」「余裕期間制度（フレックス）」を試行します。

本工事は、道路改良、河川土工及び地盤改良等、多種の工事实績を得られる工事です。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。

今回発注する「R4・5玉葉橋取付道路鍋小路地先道路改良工事」においては、「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」及び「余裕期間制度（フレックス）」を試行します。

### ①「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」

競争参加者が少数と見込まれる工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。

なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施を加算点としています。

### ②「余裕期間制度（フレックス）」

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、令和6年2月29日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所

副 所 長 こんどう まこと 近藤 誠


工務第一課長 おざわ たろう 小澤 太郎

電 話 04-7125-7315

F A X 04-7125-7339

《工事概要》

- (1) 工事名：R4・5玉葉橋取付道路鍋小路地先道路改良工事
- (2) 工事場所：埼玉県吉川市鍋小路地先
- (3) 工期：契約締結日の翌日から令和6年2月29日まで
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (5) 工事種別：一般土木工事 B+C
- (6) 工事内容：

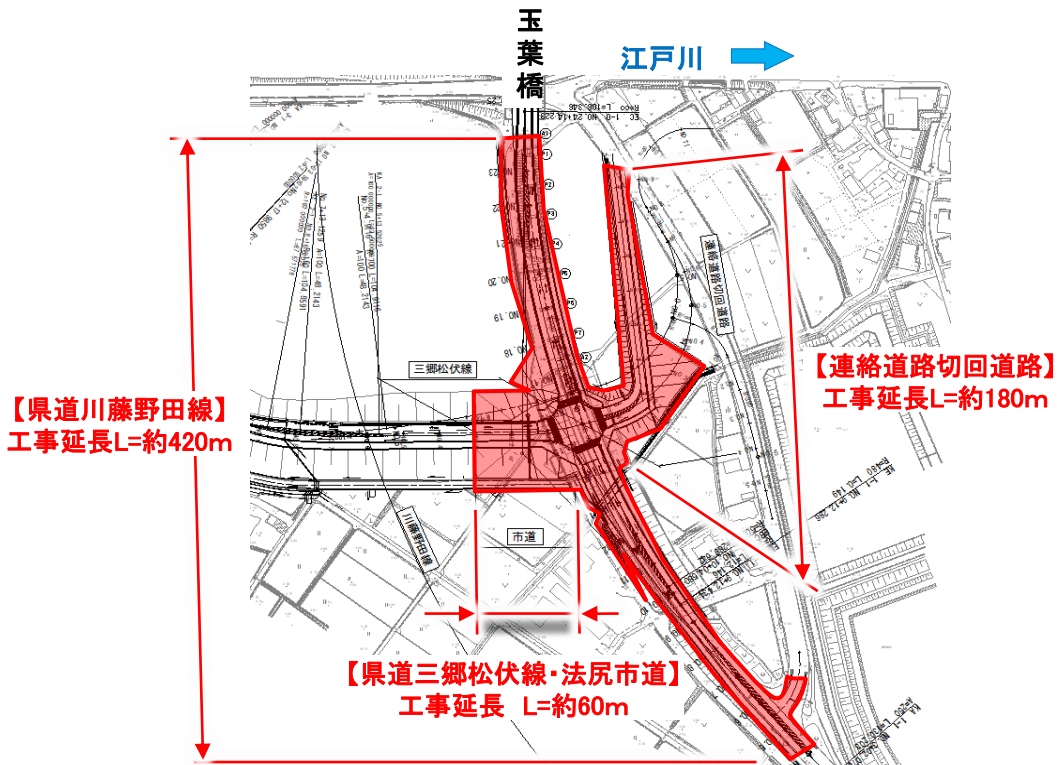



- 県道川藤野田線の道路改良、連絡道路切回道路及び県道三郷松伏線の整備を行います。
- 道路設計・施工方法について、  
道路管理者（埼玉県・吉川市）、交通管理者、ガス会社と事前協議済みです。  
耕作者、水道管理者との調整は令和4年9月末に完了予定です。  
電柱については、令和5年3月末までに撤去完了予定です。
- 想定される施工費用や仮設費用については当初設計に見込んでおりますが、現地照査の結果当初設計により難しい場合や整備に必要な費用が生じた場合は、設計審査会にて協議したうえで設計変更の対象とします。
- 工期については、必要な期間を見込んでいますが、施工状況等により延長が必要な場合は、関係機関と協議したうえで適切に対応します。

《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書 交付 : 令和4年 9月 8日 (木)
- 競争参加資格確認申請書・資料 提出期限 : 令和4年 9月20日 (火)
- 入札書・工事費内訳書 提出期限 : 令和4年10月20日 (木)
- 開札日 : 令和4年10月25日 (火)

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について

